


【3号機原子炉建屋上部除染・遮へい工事】

■ 6月25日（木）～7月29日（水）主な作業実績

- ・ S F P 内瓦礫撤去
- ・ R / B 上部除染 (ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削)
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ 作業ヤード整備

□ 作業進捗イメージ図

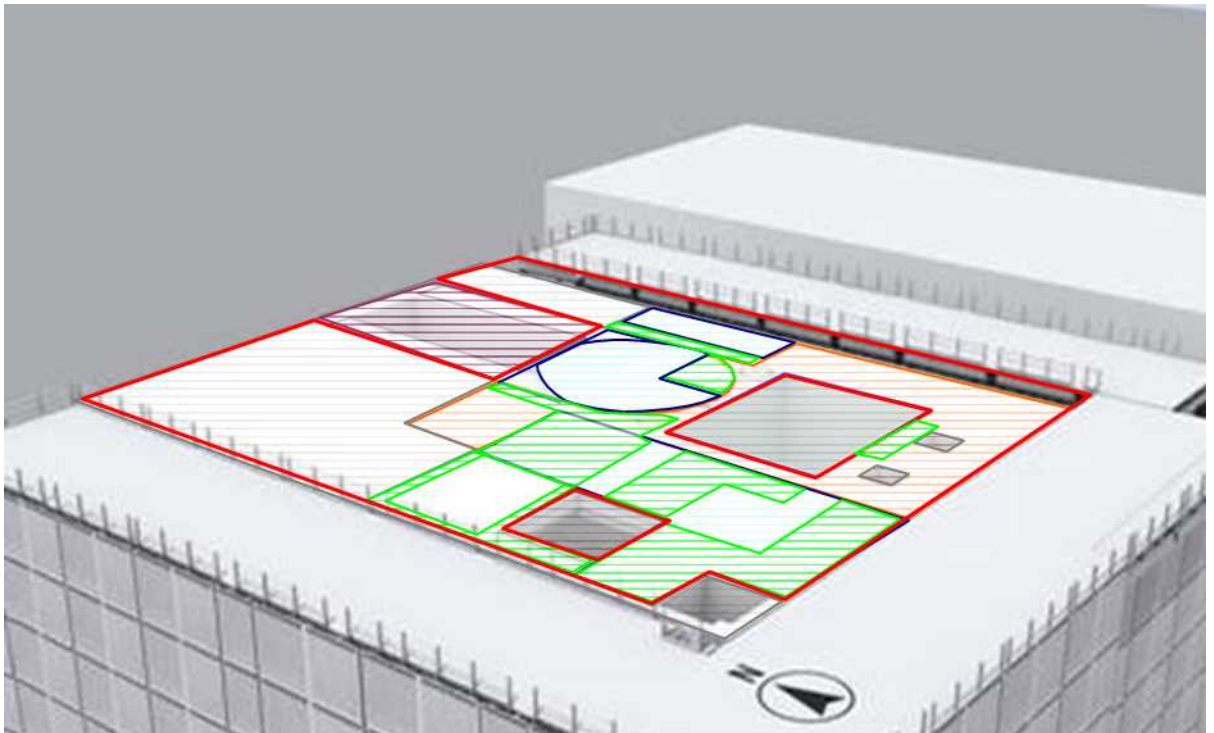

【凡例】

- 除染対象外 ガレキ集積 ガレキ吸引 床表層切削 遮へい材設置
SFP内ガレキ撤去 追加飛散防止剤散布

※除染・遮へい対策手順：ガレキ集積→ガレキ吸引→床表層切削→遮へい材設置

■ 7月30日（木）～8月26日（水）主な作業予定

- ・ S F P 内瓦礫撤去
- ・ R / B 上部除染 (ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削)
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ 作業ヤード整備

■ 備考

- ・ R / B : 原子炉建屋
- ・ S F P : 使用済燃料貯蔵プール
- ・ 飛散防止剤散布 : 当該月の作業進捗に合わせた追加散布 (作業前、作業後) 及び定期散布のエリアのみを記載

以 上
