


労働環境改善スケジュール

対象名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定												備考	
			7月		8月				9月				10月			11月
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 全面マスク着用を不要とするエリア拡大に向けた連続ダストモニタの設置 地下水バイパス・G/Hタンクエリア周辺の全面マスク着用を不要とするエリア設定(5/28公表、5/29運用開始) 一般作業服エリア拡大の検討 使い捨て式防じんマスクの使用に係る意見交換会開催(各企業個別) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 使い捨て式防じんマスクの使用に係る意見交換会開催(各企業個別) 一般作業服エリア拡大の検討 <p>※ダストフィルタ化：空気中より素131濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業できるエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。</p> <p>※全面マスク着用不要化：空気中放射性物質濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、全面マスク着用を不要とするエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。</p> <p>※一般作業服化：シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗り降る場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負担軽減を図る。</p>	<p>26</p> <p>2</p> <p>9</p> <p>16</p> <p>23</p> <p>30</p>	<p>6</p> <p>13</p> <p>下</p> <p>上</p> <p>中</p> <p>下</p> <p>部</p> <p>集</p>											
			<p>検討・設計</p> <p>使い捨て式防じんマスクの使用に係る意見交換会開催</p> <p>一般作業服エリア拡大の検討</p> <p>ダストフィルタ化</p> <p>(実施済みエリア)2012.3.1:1~4号機及びその周辺建屋内を除く全域、2012.12.19:1~4号機及びその周辺建屋内</p> <p>全面マスク着用不要化</p> <p>(実施済みエリア)2011.11.8:正門・免震重要棟前・5.6号サービス建屋前、2012.6.1:企業センター厚生棟前、2012.8.9:車両汚染検査場・降車しない見学者、2012.11.19:入退域管理施設建設地、2013.1.28:構内企業棟の一部エリア(東電環境企業棟周辺)、2013.4.8:多核種除去設備、キャスク保管設備、2013.4.15:構内企業棟の一部エリア(登録センター周辺)、2013.5.30:1~4号機周辺・タンクエリア・瓦礫保管エリアを除くエリア、2013.10.7:5.6号機建屋内、2013.11.11:がれき保管エリア、2014.3.10:共用プール建屋内の一部エリア、2014.5.30:Jタンクエリア、2015.5.29:地下水バイパス・G/Hタンクエリア周辺</p> <p>一般作業服化</p> <p>(実施済みエリア)2012.3.1:正門・免震重要棟前・5.6号サービス建屋前、2012.8.9:降車しない見学者、2013.6.30:入退域管理施設周辺、企業センター厚生棟周辺、運転手用汚染測定小屋周辺、2013.8.5:研修棟休憩所周辺、2014.3.17:構内駐車場及び構内企業棟一部エリア(関電工業棟周辺)、2014.12.1:免震重要棟前駐車場及び搬出入口周辺、【エリア解除】構内駐車場一部エリア</p>	<p>現場作業</p>												
			<p>2</p> <p>重傷災害撲滅、全災害発生数の推移</p> <p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 協力企業との情報共有 8/10安全推進協議会開催：災害事例等の再発防止対策の周知等 作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 8/27安全推進協議会の開催 作業毎の安全施策の実施(継続実施) 	<p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p>	<p>【熱中症予防対策の実施】</p> <p>重大な災害を踏まえたマネジメントの改善に向けた取り組み【6月までの実績報告】</p> <p>▼(7月30日公表)</p> <p>情報共有、安全施策の検討・評価</p>	<p>現場作業</p>										
健康管理	3	長期健康管理の実施	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2014年度対象者(協力企業作業員)への「がん検査」「甲状腺超音波検査」案内に対する、対象者・医療機関等からの問い合わせ対応、及び検査費用の精算手続き(継続) 2015年度対象者(協力企業作業員)への「がん検査」「甲状腺超音波検査」案内に向けた準備及び案内状送付 <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き 2015年度対象者(社員)の「白内障検査」(福島)実施 	<p>2015年度検査案内準備(協力企業作業員)</p> <p>実績反映</p> <p>案内状送付</p> <p>【検査受診期間】</p> <p>問い合わせ対応及び検査費用清算手続き</p> <p>新規追加</p> <p>社員・白内障検査(福島)</p>	<p>健康相談受付</p>	<p>2015年度検査案内準備(協力企業作業員)</p> <p>案内状送付</p> <p>【検査受診期間】</p> <p>問い合わせ対応及び検査費用清算手続き</p> <p>新規追加</p> <p>社員・白内障検査(福島)</p>	<p>検討・設計</p>									
			<p>4</p> <p>継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化</p> <p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1F救急医療室の2015年9月末までの医師確保完了(固定医師1名+0-7ヶ月支援医師) <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1F救急医療室の10月~1月中旬の勤務医師調整 	<p>各医療拠点の体制検討</p> <p>1F救急医療室の10月~1月中旬の勤務医師調整</p> <p>1F救急医療室の9月末までの医師確保完了</p>	<p>検討・設計</p>											
			<p>現場作業</p>													



分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		7月		8月				9月		10月		11月		備考	
			26	31	2	9	16	23	30	6	13	下	上	中	下	上		中
労働環境改善	5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) ・作業員の確保状況(6月実績/8月の予定)と地元雇用率(6月実績)についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況(7月実績/9月の予定)と地元雇用率(7月実績)についての調査・集計	検討・設計	▼作業員の確保状況集約	▼作業員の確保状況調査依頼	▼作業員の確保状況集約	▼作業員の確保状況調査依頼	▼作業員の確保状況集約	▼作業員の確保状況調査依頼	▼作業員の確保状況集約	▼作業員の確保状況調査依頼	▼作業員の確保状況集約	▼作業員の確保状況調査依頼	▼作業員の確保状況集約	▼作業員の確保状況調査依頼		
	6	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 (予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施) ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施) ・作業員へのアンケートによる実態把握 ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施	▼協力企業との意見交換会(労働環境)7/31		▼協力企業との意見交換会(労働環境)8/28						協力企業との意見交換会(労働環境)				
	7	大型休憩所の設置	(実績) ・運用開始(5/31) ・食堂(3F)の運用開始(6/1) ・食堂の運用中断(6/9~6/23)⇒新事務棟食堂の利用時間を拡大し対応 ・食堂(3F)の運用一時再開(6/24~6/27) ・食堂天井改修(3F)工事(6/28完了) ・食堂の運用中断(6/29~8/1)⇒新事務棟食堂の利用時間を拡大し対応 ・搬入口設置工事 ・搬入口設置工事の設計 ・食堂化改修(2F)本工事の設計 ・搬入口設置本工事の設計 ・食堂(3F)の運用再開(8/3) (予定) ・搬入口設置工事 ・食堂化改修(2F)本工事の設計 ・食堂化改修(2F)本工事 ・搬入口設置本工事の設計 ・搬入口設置本工事	検討・設計	設計期間の見直しによる工期変更	食堂化改修本工事の設計	搬入口設置本工事の設計	食堂の運用	食堂化改修本工事	設計期間の見直しによる工期変更	搬入口設置本工事	設計変更による工期延長					2015年5月15日 建物完了	
	8	新事務本館の建設	(実績) ・設計、準備工事 ・本体工事 ・杭工事 ・掘削工事 ・基礎工事 (予定) ・本体工事 ・杭工事 ・掘削工事 ・基礎工事 ・鉄骨工事 ・床PC工事	現場作業	杭工事	掘削工事	基礎工事	重機総点検による工程見直し	鉄骨工事	重機総点検による工程見直し	床PC工事						2016年8月 完了目標	
9	道路整備の実施	(実績) ・4m盤周辺道路は、フェンシング工事にて整備完了 ①ふれあい交差点~五差路間の舗装工事(側溝・歩道整備含む) ②旧野鳥の森南側道路周辺の舗装工事(側溝・歩道整備含む) ③プロセス建屋周辺道路、④5、6号機周辺道路、 ⑥H5、H6、Cエリア付近道路、⑦中央通りの舗装工事 ⑧5、6号機~土捨場南道路 ⑨Cエリア周辺道路、⑩旧展望台周辺道路は、フェンシング工事の進捗と併せ整備 ・⑪車両整備場周辺道路工事(道路基礎部・路盤工・舗装) (予定) ・⑪車両整備場周辺道路工事(道路基礎部・路盤工・舗装) ・⑨土捨場周辺道路工事(路盤工・舗装) ・⑩Jエリア周辺道路工事	検討・設計	⑪車両整備場周辺道路工事(道路基礎部・路盤工・舗装)の検討・設計	⑨土捨場周辺道路工事・⑩Jエリア周辺道路工事の検討・設計	⑪車両整備場周辺道路工事(道路基礎部・路盤工・舗装)	⑨土捨場周辺道路工事(路盤工・舗装)	⑩Jエリア周辺道路工事										

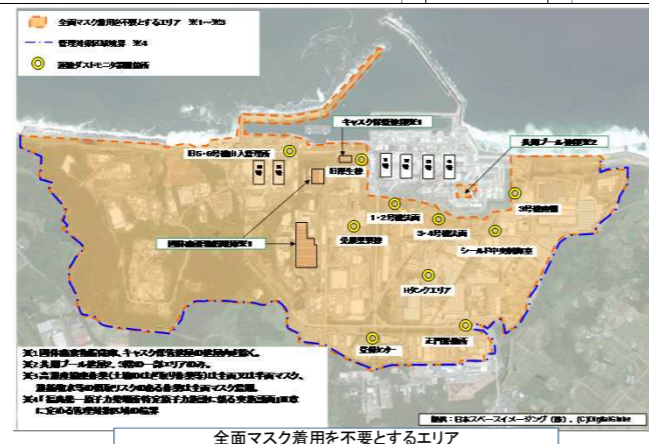
