


# タンク建設進捗状況



## 1. タンクエリア図

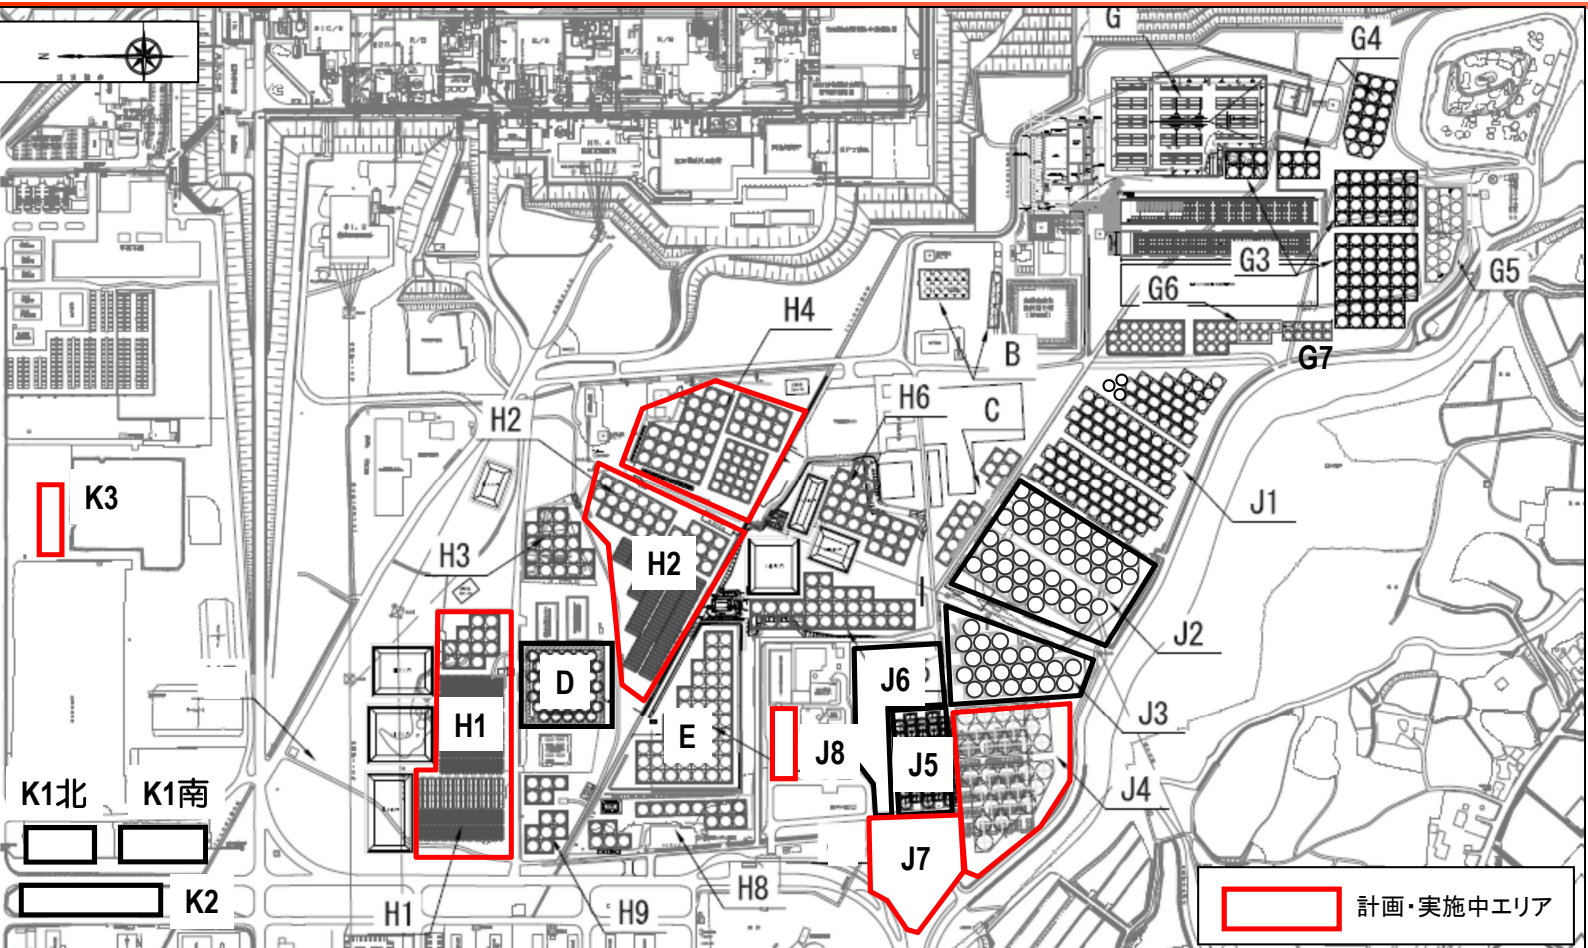

# 2-1. タンク工程(新設分)

		2015年度												2016年度							15.12の見込 /計画基数		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月以降			
新設 タンク	J4 現地溶接	11月25日進捗・見込	6.2											太数字:タンク容量(単位:千m3)							完成型		
		基数	5																		5基/5基		
		11月進捗見込	6.2																		現地溶接型		
		基数	5																		30基/30基		
新設 タンク	J7 現地溶接型	11月25日進捗・見込	4.8 6.0 4.8 14.4 8.4 7.2 4.8																				
		基数	4 5 4 12 7 6 4																				
		12月進捗見込	4.8 6.0 4.8 13.2 8.4 8.4 4.8																				
		基数	4 5 4 11 7 7 4																		24基/42基		
新設 タンク	J8エリア 現地溶接型	11月25日見直	地盤改良・基礎設置											タンク									
		基数												4 4									
		12月17日見直												2.8 2.8									
		基数												4 4									
新設 タンク	K3 完成型	11月25日見直	地盤改良・基礎設置											タンク									
		基数												6 6									
		12月17日見直												4.2 4.2									
		基数												6 6									

# 2-2. タンク工程(リプレース分)

		2015年度												2016年度							15.12の見込 /計画基数		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月以降			
リプレース タンク	H1ブルータンクエリア 完成型	11月25日進捗・見込	6.3 17.5 10.0											タンク撤去・地盤改良・基礎設置									
		基数	5 14 8											8 8 8									
		12月17日見直	6.3 17.5 10.0											10.0 10.0 10.0									
		基数	5 14 8											8 8 8							63基/87基		
リプレース タンク	H1東フランジタンクエリア 完成型	11月25日見直	残水・撤去											地盤改良・基礎設置									
		既設除却	▲ 12											フランジタンクエリアのタンク開発量は、 上記ブルータンクエリアに計上									
		12月17日見直	▲ 12																				
		既設除却	▲ 12																				
リプレース タンク	H2ブルータンクエリア 現地溶接型	11月25日見直	残水・撤去											地盤改良・基礎設置		タンク							
		基数														9.6 9.6 57.6							
		既設除却	▲ 10													4 4 24							
		12月17日見直	▲ 10													9.6 9.6 57.6							
リプレース タンク	H2フランジタンクエリア 現地溶接型	11月25日見直	残水・撤去											地盤改良・基礎設置									
		既設除却	▲ 28																				
		12月17日見直	▲ 28																				
		既設除却	▲ 28																				
リプレース タンク	H4エリア 完成型	11月25日見直												地盤改良・基礎設置									
		基数												残水・撤去							60.0		
		既設除却	▲ 22 ▲ 26																		60		
		12月17日見直	▲ 22 ▲ 26																		60		


## 2-3. タンク建設進捗状況

エリア	11月実績	12月見込	全体状況	対策
J4	－	5基	現地溶接タンクは完了。11月21日完成型タンク5基を設置完了。使用前検査12月受験予定。	
J7	4基	11基 (1減)	J7内で組み立てているタンクに加えて、構内の他のヤードで組み立てているタンクを基礎が完成したため搬入中。	
J8	－	－	環境管理棟の北側エリアに700m <sup>3</sup> 級、8基の現地溶接型タンクを設置する計画。現在は地盤改良実施中	
K3	－	－	高性能多核種除去装置の北側エリアに700m <sup>3</sup> 級、12基の工場完成型タンクを設置する計画。現在は試掘実施中	
H1	－	－	ブルータンクエリアの63基は設置完了。10月28日フランジタンク解体完了。現在、既設タンク基礎の撤去、地盤改良実施中。	フランジタンク解体については実績を積みながら、解体作業サイクルタイムの短縮を検討
H2	－	－	5月27日フランジタンク解体着手。10月1日ブルータンク撤去認可。現在、タンク撤去中	
H4	－	－	12月14日フランジタンク解体認可	

## 2-4. 実施計画申請関係

- H2エリア（ブルータンク・撤去→多核種除去設備処理水貯留用・現地溶接型タンク（リプレイス））
  - ・9/18 J7エリアタンク、雨水処理設備増設の認可に伴い、実施計画補正申請（最新認可版反映）
  - ・10/1 実施計画認可
  - ・10/12 ブルータンク撤去開始
- H4エリア（フランジタンク・撤去→多核種除去設備処理水貯留用・工場完成型タンク（リプレイス））
  - ・11/30 実施計画補正申請（最新認可版反映）
  - ・12/14 実施計画認可
- H1東エリア（フランジタンク・撤去→多核種除去設備処理水貯留用・工場完成型タンク（リプレイス））
  - ・9/28 実施計画変更申請
  - ・11/17 面談実施（現在審査中（コメント無し））
  - ・補正申請準備中
- J4エリア（多核種除去設備処理水貯留用・工場完成型タンク）
  - ・9/28 実施計画変更申請
  - ・11/17 面談実施（現在審査中（コメント無し））
  - ・補正申請準備中

## 2-5. タンク建設状況 (Jエリア現況写真)

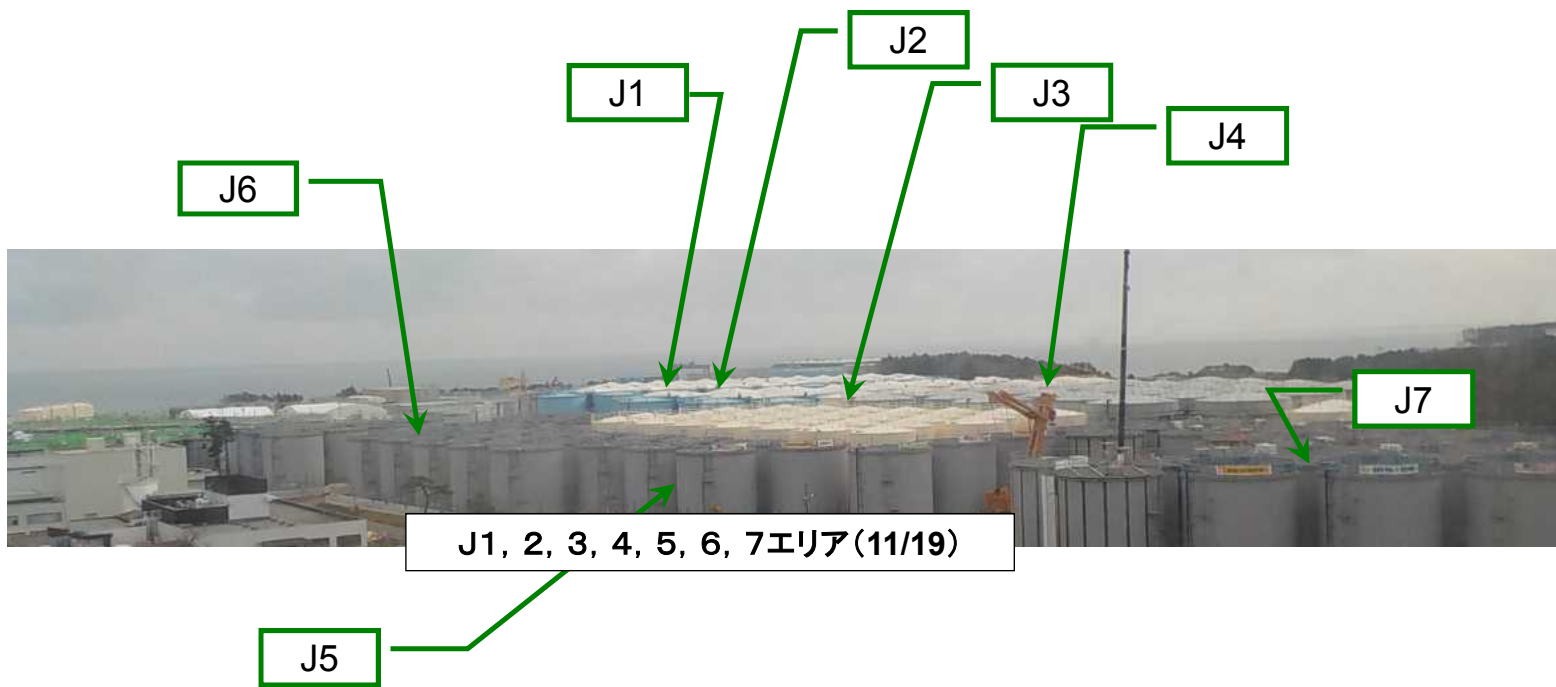


## 3-1. H2エリアのフランジタンク解体進捗

2015.12.14現在の進捗

着手済み : 19 / 28基

解体準備中 (歩廊・集塵機設置 他)	0基	
残水処理中	1基	B6
先行塗装	1基	B4
天板・側板・底板解体	1基	A1
解体完了	12基	A2~12 C1~5

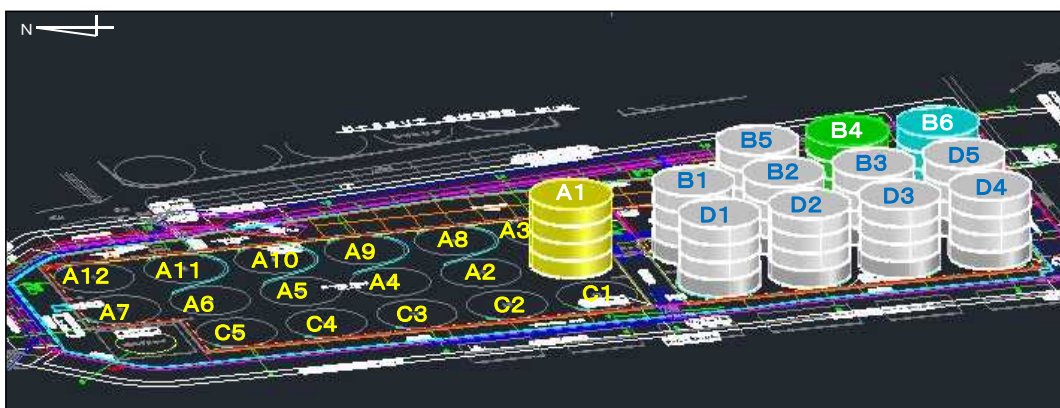

【凡例】





<span style="background-color: yellow;">■</span>	: 解体準備
<span style="background-color: lightblue;">■</span>	: 残水処理
<span style="background-color: lightgreen;">■</span>	: 先行塗装
<span style="background-color: yellow;">■</span>	: 天板・側板・底板解体

# タンク解体中のダスト測定結果

## 【11月から12月に解体したタンク(4基)における作業中のダスト測定結果】

○ : 検出限界値未満

- 全てのタンクにおいて作業管理基準値を超過する状況は無かった。
- 作業管理基準はマスク(全面、反面マスク)着用基準の1/2の値であり、十分低い値。

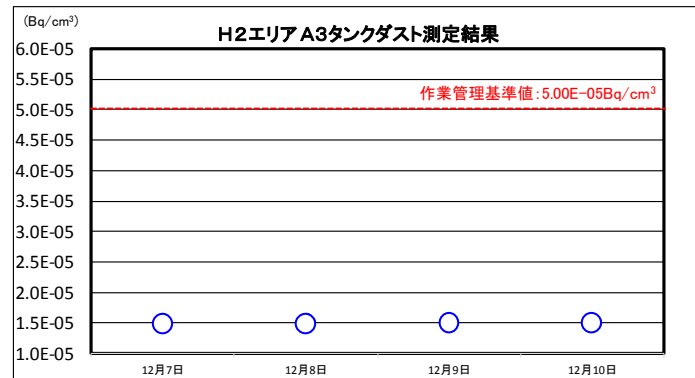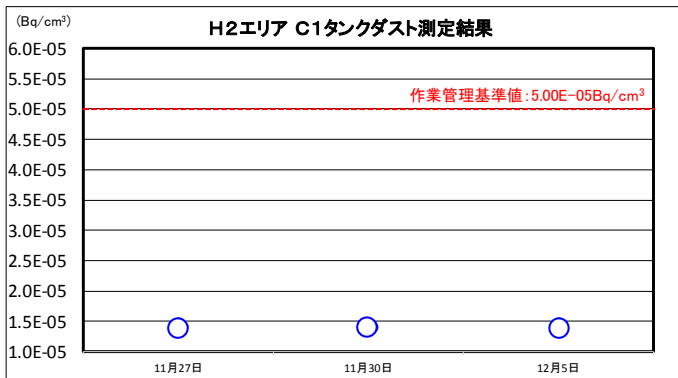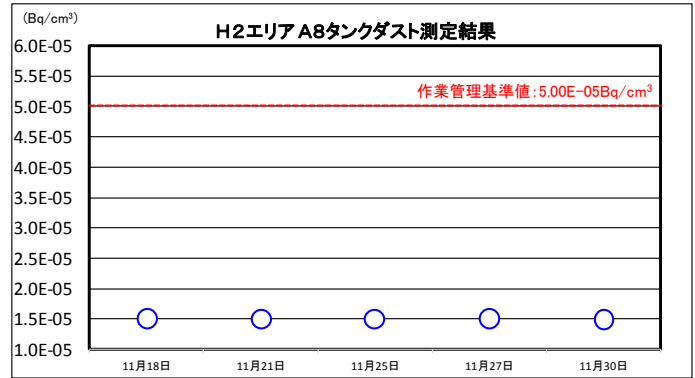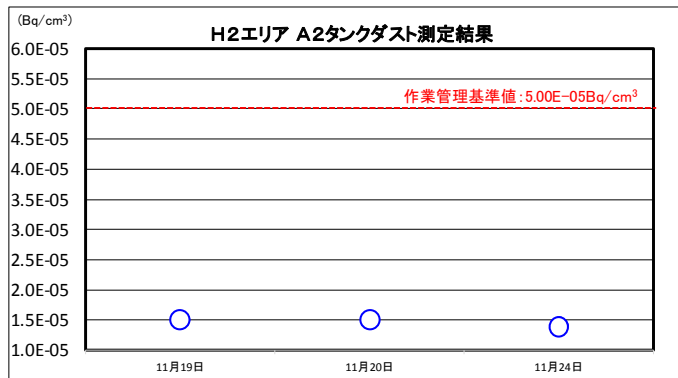

## 4-1. タンク建設状況

