



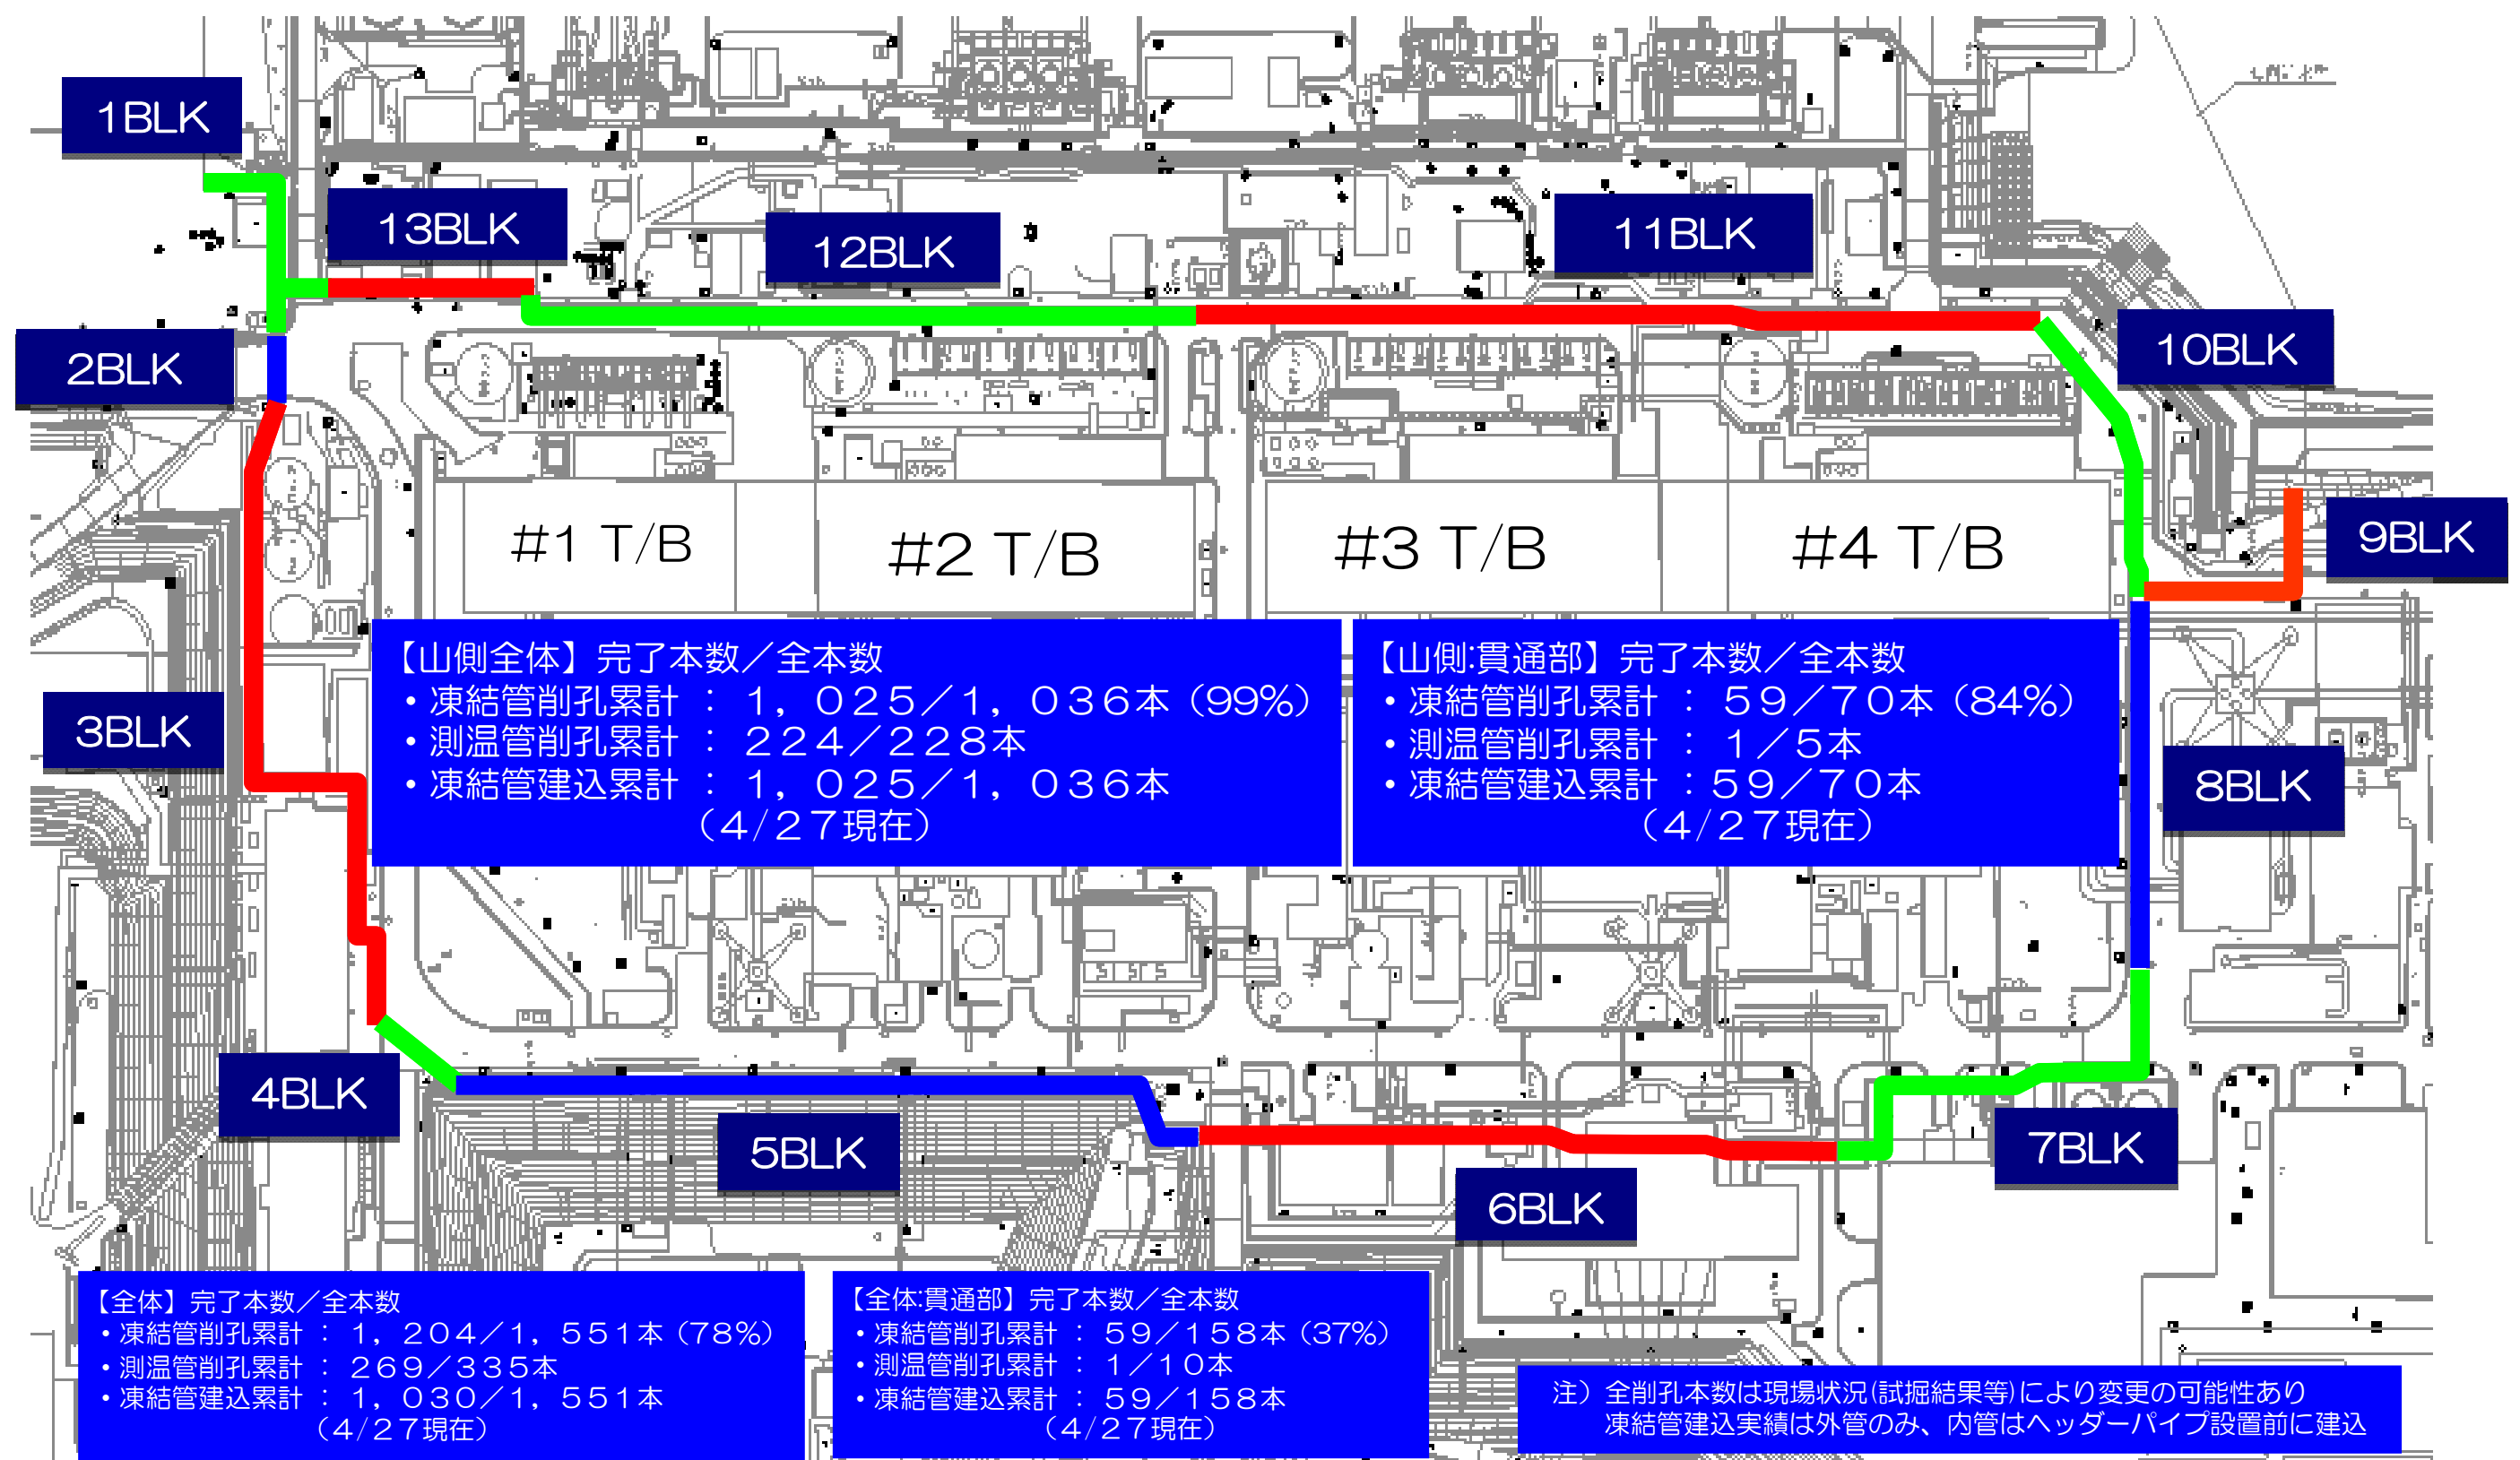

陸側遮水壁 凍結管・測温管削孔ならびに凍結管建込実績



【山側全体】完了本数/全本数  
 ・凍結管削孔累計 : 1,025/1,036本 (99%)  
 ・測温管削孔累計 : 224/228本  
 ・凍結管建込累計 : 1,025/1,036本  
 (4/27現在)

【山側貫通部】完了本数/全本数  
 ・凍結管削孔累計 : 59/70本 (84%)  
 ・測温管削孔累計 : 1/5本  
 ・凍結管建込累計 : 59/70本  
 (4/27現在)

【全体】完了本数/全本数  
 ・凍結管削孔累計 : 1,204/1,551本 (78%)  
 ・測温管削孔累計 : 269/335本  
 ・凍結管建込累計 : 1,030/1,551本  
 (4/27現在)

【全体貫通部】完了本数/全本数  
 ・凍結管削孔累計 : 59/158本 (37%)  
 ・測温管削孔累計 : 1/10本  
 ・凍結管建込累計 : 59/158本  
 (4/27現在)

注) 全削孔本数は現場状況(試掘結果等)により変更の可能性あり  
 凍結管建込実績は外管のみ、内管はヘッダーパイプ設置前に建込
