


労働環境改善スケジュール

分野	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		3月		4月			5月			6月	7月	備考		
			22	29	5	12	19	26	3	10	17	下	上	中		下	
健康管理	1	防護装備の適正化検討 (実績) ・全面マスク着用を不要とするエリアの拡大計画の検討(1/29公表) ・全面マスク着用を不要とするエリア拡大に向けた連続ダストモニタの設置検討 (予定) ・「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえた敷地南側エリアの全面マスク着用不要化の検討(2013~2015年度) ・全面マスク着用を不要とするエリア拡大に向けた連続ダストモニタの設置検討(2015年4月末設置予定) ・エリアⅡ及びⅢへのダストモニタ設置及びダスト確認(2015年5月全面マスク着用を不要とするエリア設定予定) ※ダストフィルタ化: 空気中よう素131濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業できるエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。 ※全面マスク着用不要化: 空気中放射性物質濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、全面マスクの着用を不要とするエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。 ※一般作業服化: シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗り降る場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負担軽減を図る。	検討・設計	「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用不要化の検討													
			現場作業	全面マスク着用を不要とするエリア拡大に向けた連続ダストモニタの設置検討													
			現場作業	ダストフィルタ化 (実施済みエリア)2012.3.1:1~4号機及びその周辺建屋内を除く全域、2012.12.19:1~4号機及びその周辺建屋内 全面マスク着用不要化 (実施済みエリア)2011.11.8:正門・免震重要棟前・5.6号サービス建屋前、2012.6.1:企業センター厚生棟前、2012.8.9:車両汚染検査場・降車しない見学者、2012.11.19:入退域管理施設建設地、2013.1.28:構内企業棟の一部エリア(東電環境企業棟周辺)、2013.4.8:多核種除去設備、キャスク仮保管設備、2013.4.15:構内企業棟の一部エリア(登録センター周辺)、2013.5.30:1~4号機周辺・タンクエリア・瓦礫保管エリアを除くエリア、2013.10.7:5、6号機建屋内、2013.11.11:がれき保管エリア、2014.3.10:共用プール建屋内の一部エリア、2014.5.30:Jタンクエリア エリアⅡ及びⅢへの連続ダストモニタ設置工事													
			現場作業	エリアⅡ及びⅢのダスト確認													
2	重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施	(実績) ・協力企業との情報共有 ・4/23安全推進協議会開催:作業工程、規制情報の連絡等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) (予定) ・4/30安全推進協議会の開催 ・作業毎の安全施策の実施(継続実施)	検討・設計	新規追加 2014年度災害発生状況、2015年度安全活動計画、及び重大な災害を踏まえた安全性向上対策(3月実績)(4/30公表)													
			現場作業	情報共有、安全施策の検討・評価													
3	長期健康管理の実施	(実績) ・2014年度対象者(協力企業作業員)への「がん検査」「甲状腺超音波検査」案内に対する、対象者・医療機関等からの問い合わせ対応、及び検査費用の精算手続き(継続) ・インフルエンザ・ノロウイルス感染予防・拡大防止対策(〜2014年度末) ・2014年度対象者(社員)への「甲状腺超音波検査」案内及び検査実施(本店:3/10~12) ・2015年度対象者(社員)への「がん検査」案内(3/20) (予定) ・2015年度対象者(協力企業作業員)への「がん検査」「甲状腺超音波検査」案内に向けた準備	検討・設計	健康相談受付													
			現場作業	2014年度検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き、2015年度検査案内(社員)及び検査案内準備(協力企業作業員)													
4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の2015年6月末までの医師確保完了(固定医師1名+0-テ-ヨ)支援医師 (予定) ・1F救急医療室の恒常的な医師の確保に向けた調整	検討・設計	各医療拠点の体制検討													
			現場作業	常勤医師の雇用に向けた関係者との調整													

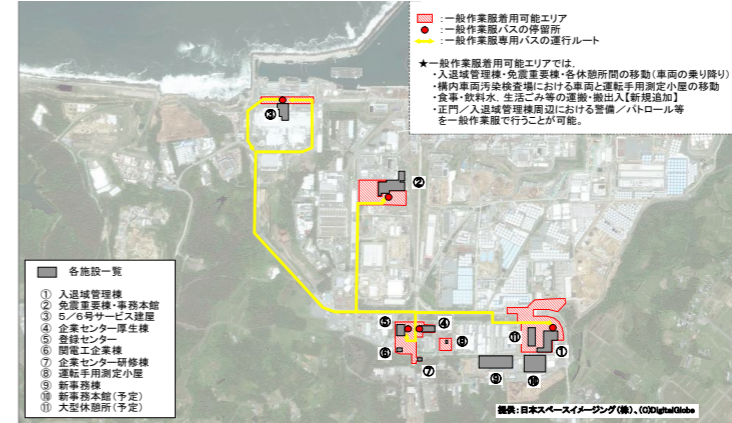

労働環境改善スケジュール

分類名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		3月		4月				5月			6月	7月	備考		
			22	29	5	12	19	26	3	10	17	下	上	中	下			
労働環境改善	5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握 (実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) ・作業員の確保状況(3月実績/5月の予定)と地元雇用率(3月実績)についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況(4月実績/6月の予定)と地元雇用率(4月実績)についての調査・集計	検討・設計	▼作業員の確保状況集約 ▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握														▼作業員の確保状況集約 ▼作業員の確保状況調査依頼 ▼作業員の確保状況調査依頼
	6	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み (実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・作業員へのアンケートによる実態把握(実施中) ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 (予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施) ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施) ・作業員へのアンケートによる実態把握(実施中) ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施														協力企業との意見交換会(労働環境)
	7	大型休憩所の設置 (実績) ・内装工事・設備工事・外構工事・各種検査等 (予定) ・外構工事・各種検査等	現場作業	内装工事 設備工事 各種検査等 外構工事														2015年5月15日 建物完工予定
	8	新事務本館の建設 (実績) ・設計、準備工事 (予定) ・設計、準備工事・本体工事	検討・設計	設計														2016年8月 完了目標
	現場作業	準備工事																
9	福島給食センターの設置 (実績) ・内装工事・設備工事他	現場作業	内装工事・設備工事他 新事務棟食堂スペースを利用し 食事の提供を開始(4/20) ▽ 大型休憩所運用開始に合わせて食事の提供を開始予定 ▽															
10	道路整備の実施 (実績) ・4m盤周辺道路は、フェリックス工にて整備完了 ・①ふれあい交差点～五差路間の舗装工事(側溝・歩道整備含む) ・②旧野鳥の森南側道路周辺の舗装工事(側溝・歩道整備含む) ・③プロセス建屋周辺道路、④5、6号機周辺道路、⑥H5、H6、Cエリア付近道路、⑦中央通りの舗装工事 ・⑧5、6号機～土捨場南道路 ・Gエリア周辺道路、⑤旧展望台周辺道路は、フェリックス工の進捗と併せ整備 (予定) ・①ふれあい交差点～五差路間の舗装工事(側溝・歩道整備含む) ・②旧野鳥の森南側道路周辺の舗装工事(側溝・歩道整備含む) ・③プロセス建屋周辺道路、④5、6号機周辺道路、⑥H5、H6、Cエリア付近道路、⑦中央通りの舗装工事 ・⑧5、6号機～土捨場南道路、⑨土捨場周辺道路、⑩Jエリア周辺道路 ・Gエリア周辺道路、⑤旧展望台周辺道路は、フェリックス工の進捗と併せ整備	検討・設計	舗装工事① 舗装工事②③④⑥⑦ 舗装工事⑧ 新規追加															
現場作業	4m盤周辺工事 Gエリア周辺工事・舗装工事⑤ フェーシング工事の遅延による工程延長																	

