


### 【3号機原子炉建屋上部除染・遮へい工事】

- 3月26日（木）～4月28日（火）主な作業実績
  - ・ R/B上部除染（ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削）
  - ・ SFP内瓦礫撤去
  - ・ 飛散防止剤散布
  - ・ 作業ヤード整備

□ 作業進捗イメージ図

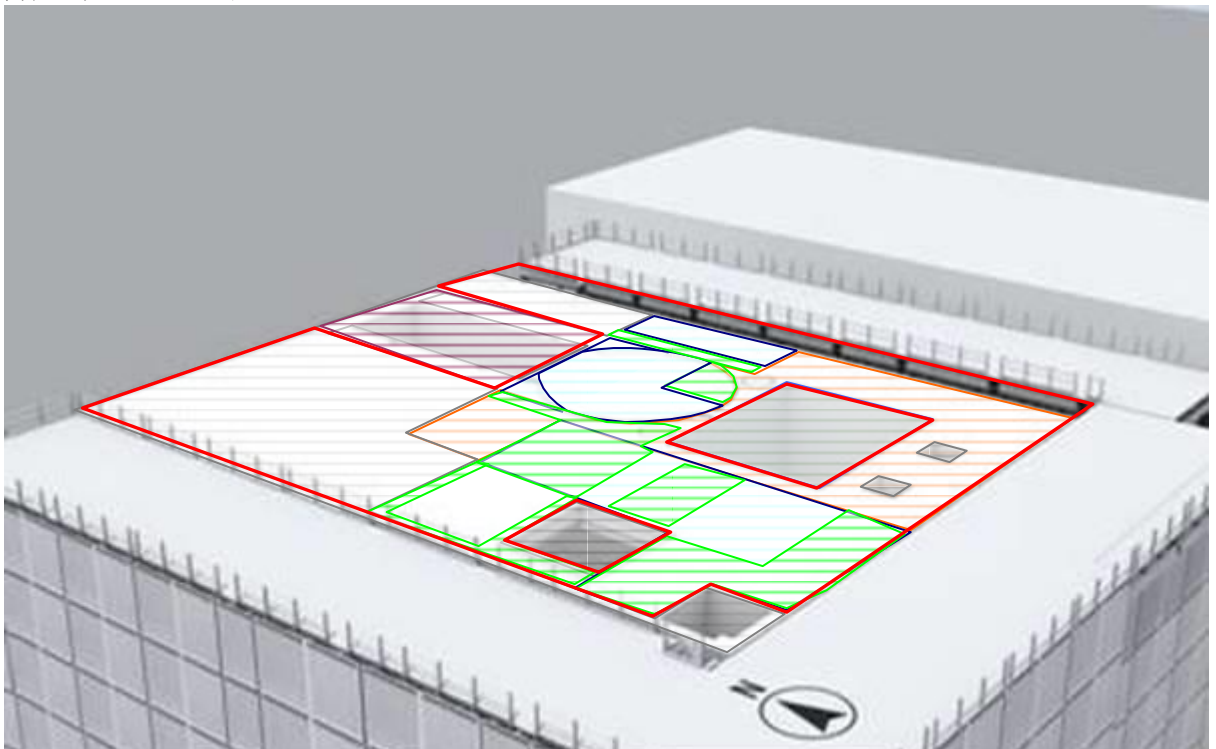

#### 【凡例】

- 除染対象外    ▨ ガレキ集積    ▨ ガレキ吸引    ▨ 床表層切削    ▨ 遮へい材設置  
▨ SFP内ガレキ撤去    ▨ 追加飛散防止剤散布

※除染・遮へい対策手順：ガレキ集積→ガレキ吸引→床表層切削→遮へい材設置

- 4月29日（水）～5月27日（水）主な作業予定
  - ・ R/B上部除染（ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削）
  - ・ SFP内瓦礫撤去
  - ・ 飛散防止剤散布
  - ・ 作業ヤード整備

#### ■ 備考

- ・ R/B：原子炉建屋
- ・ SFP：使用済燃料貯蔵プール
- ・ 飛散防止剤散布：当該月の作業進捗に合わせた追加散布（作業前、作業後）及び定期散布のエリアのみを記載

以上
