


3号機原子炉建屋オペフロ遮へい体設置工事

■ 8月の主な作業実績

- C工区遮へい体設置 : 2016年7月11日～同年8月4日
- D工区遮へい体設置 : 2016年7月27日～同年8月11日
- A工区第Ⅱ期遮へい体設置 : 2016年7月29日～同年8月25日(予定)
- 補完および構台間遮へい体等設置 : 2016年8月24日～

■ 9月の主な作業予定

- G工区遮へい体設置
- 補完および構台間遮へい体等設置

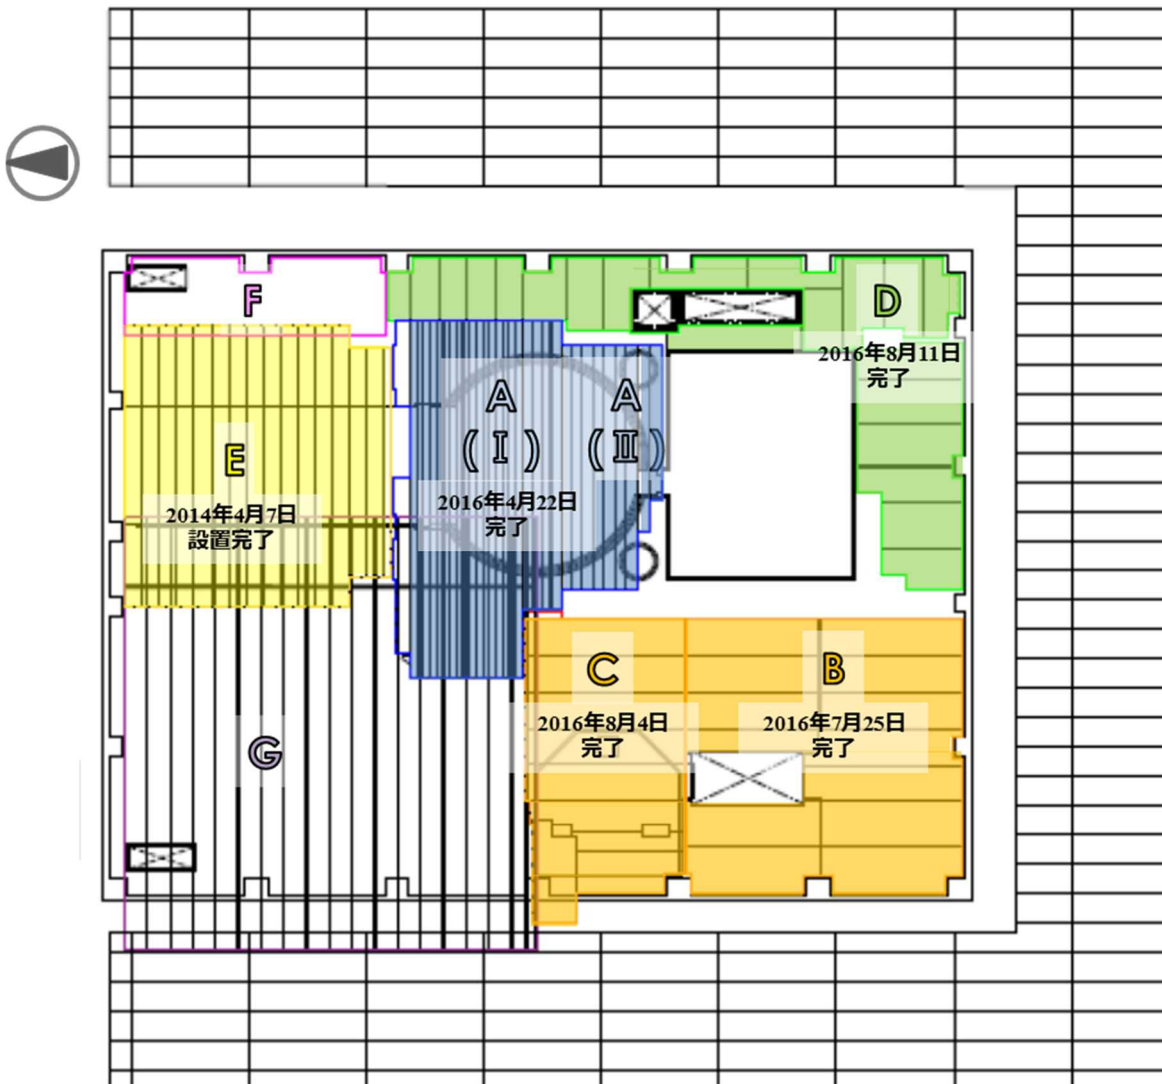

3号機原子炉建屋オペフロ遮へい体設置状況

(2016年8月25日時点)

以上
