


3号機原子炉建屋オペフロ遮へい体設置工事

■ 9月の主な作業実績

- 補完遮へい体等設置：2016年9月6日～
- G工区遮へい体設置：2016年9月9日～同年9月20日

■ 10月の主な作業予定

- 補完遮へい体および構台間遮へい体等設置

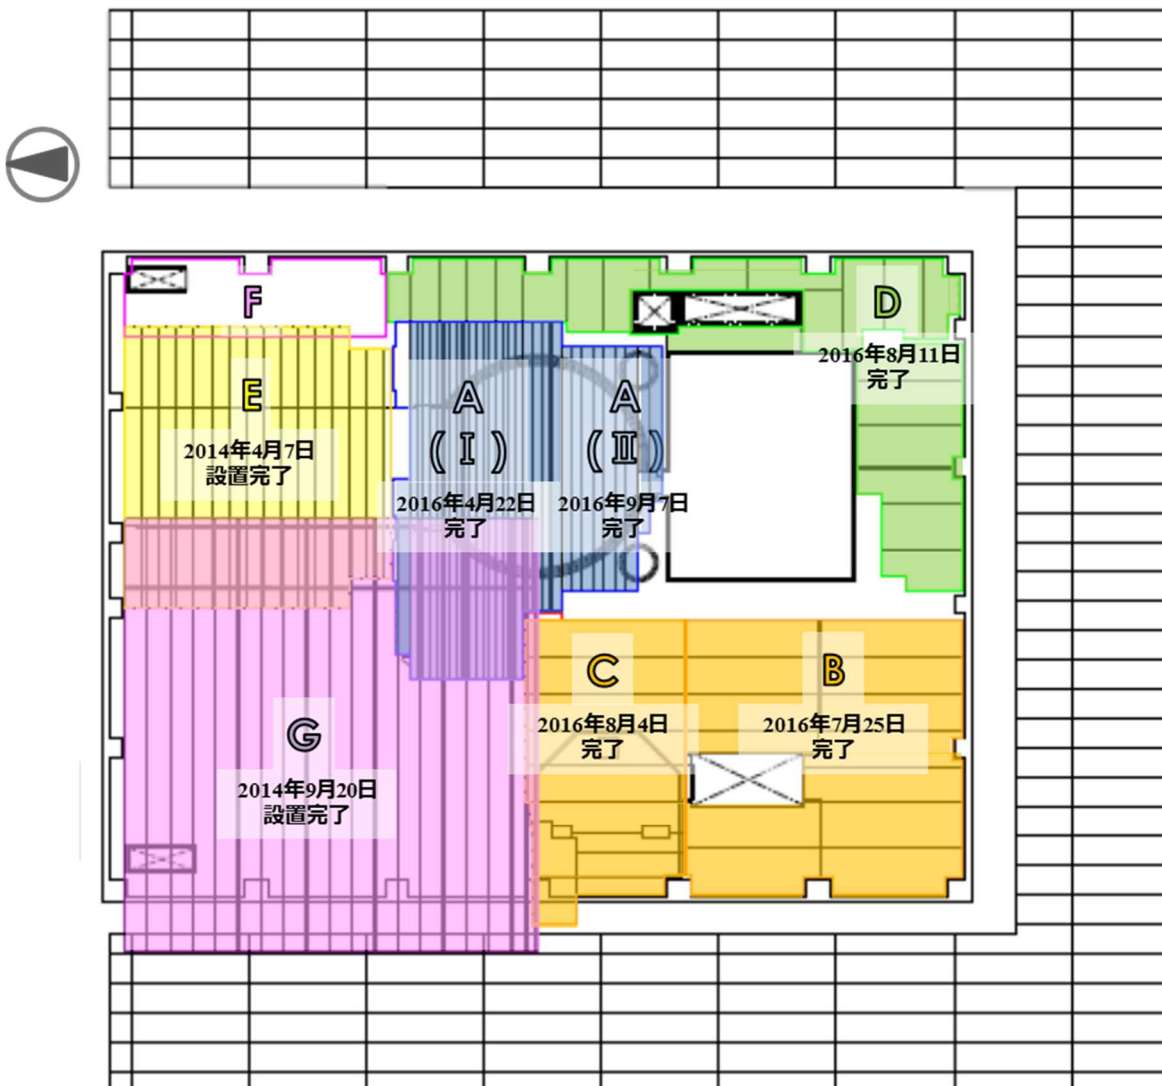

3号機原子炉建屋オペフロ遮へい体設置状況

(2016年9月29日時点)

以 上
