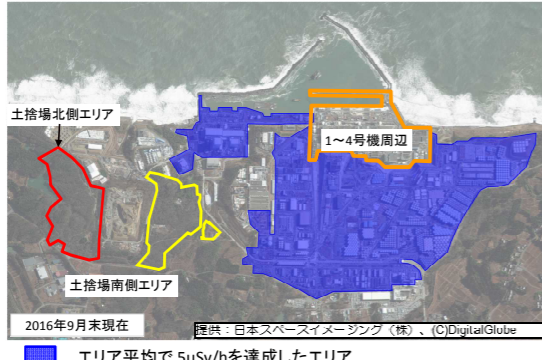


環境線量低減対策 スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		7月		8月				9月			10月		11月	備考				
			23	30	6	13	20	27	3	10	17	下	上	中	下						
放射線量低減	敷地内線量低減 ・段階的な線量低減	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>線量率測定               <ul style="list-style-type: none"> <li>構内全域の状況把握サーベイ (30mメッシュの全測定箇所を年度内にデータ更新)</li> <li>構内全域の走行サーベイ(1回/3ヶ月)</li> </ul> </li> <li>線量低減対策               <ul style="list-style-type: none"> <li>土捨場南側エリア (伐採・造成工・路盤舗装 等)</li> <li>土捨場北側エリア (伐採・盛土工 等)</li> <li>10m盤 (3・4号機海側等) エリア (建物除去・路盤舗装 等)</li> </ul> </li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>線量率測定               <ul style="list-style-type: none"> <li>構内全域の状況把握サーベイ (30mメッシュの全測定箇所を年度内にデータ更新)</li> <li>構内全域の走行サーベイ(1回/3ヶ月)</li> </ul> </li> <li>線量低減対策               <ul style="list-style-type: none"> <li>土捨場南側エリア (伐採・造成工・路盤舗装 等)</li> <li>土捨場北側エリア (伐採・盛土工 等)</li> <li>10m盤 (3・4号機海側等) エリア (建物除去・路盤舗装 等)</li> </ul> </li> </ul> 	検討・設計																		
			現場作業	<p>■線量率測定 構内全域の状況把握サーベイ (30mメッシュサーベイ)</p> <p>■線量低減対策</p> <p>①1~4号機周辺 ※ 10m盤 (3・4号機海側等) エリア (建物除去・路盤舗装 等)</p> <p>②その他エリア</p> <p>土捨場南側エリア (伐採・造成工・路盤舗装 等)</p> <p>土捨場北側エリア (伐採・盛土工 等)</p>																▽10月下旬上期報告予定	<p>~2018年3月予定</p> <p>※1~4号機周辺の線量低減は、原子炉建屋上部の線量低減対策及び周辺ヤードの整備等を実施中。(使用済燃料プール対策分野 参照)</p> <p>~2018年1月予定</p> <p>~2019年11月予定</p>
環境線量低減対策	海洋汚染拡大防止 ・モニタリング ・排水路整備	<p>(実績)</p> <p>【4m盤地下水対策】 港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング</p> <p>【排水路付替】 排水路モニタリング K排水路上流部調査 (枝管サンプリング) A系排水路付替え工事 (本体工事・ヤード造成地) 排水路清掃等 (道路・排水路清掃)</p> <p>(予定)</p> <p>【4m盤地下水対策】 港湾内外海水モニタリング 地下水モニタリング</p> <p>【排水路付替】 排水路モニタリング K排水路上流部調査 (排水路本体調査) A系排水路付替え工事 (本体工事・ヤード造成地) 排水路清掃等 (道路・排水路清掃)</p>	検討・設計																		
			現場作業	<p>港湾内外海水モニタリング</p> <p>地下水モニタリング</p> <p>排水路モニタリング</p> <p>K排水路上流部調査</p> <p>A系排水路付替え工事 (本体工事・ヤード造成地)</p> <p>排水路清掃等</p>															~2018年3月通水予定		
評価	環境影響評価 ・モニタリング ・傾向把握、効果評価	<p>(実績)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価</li> <li>敷地内におけるダスト濃度測定 (毎週~8/30)</li> <li>降下物測定 (月1回)</li> <li>発電所周辺、沿岸海域モニタリング (毎日~月1回)</li> <li>20km圏内 魚介類モニタリング (月1回 11点)</li> <li>茨城県沖における海水採取 (毎月)</li> <li>宮城県沖における海水採取 (隔週)</li> </ul> <p>(予定)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1~4号機原子炉建屋上部ダスト濃度測定、放出量評価</li> <li>降下物測定 (月1回)</li> <li>発電所周辺、沿岸海域モニタリング (毎日~月1回)</li> <li>20km圏内 魚介類モニタリング (月1回 11点)</li> <li>茨城県沖における海水採取 (毎月)</li> <li>宮城県沖における海水採取 (隔週)</li> </ul>	検討・設計																		
			現場作業	<p>1,2,3,4u放出量評価</p> <p>3uR/B 4uR/B 1uR/B</p> <p>2uR/B</p> <p>敷地内ダスト測定</p> <p>降下物測定</p> <p>海水・海底土測定 (発電所周辺、茨城県沖、宮城県沖)</p> <p>20km圏内 魚介類モニタリング</p>															<p>敷地内ダスト測定については、敷地内のダストモニタの整備が進んだため、8/30をもって廃止。今後はダストモニタにて傾向を監視していく。</p>		
