

## 【3号機原子炉建屋燃料取り出し用カバー設置工事】


### ■ 12月の主な作業

- ・ ドーム屋根設置
- ・ 燃料取扱機・クレーン設置
- ・ 資機材整備

### ■ 作業状況写真



3号機原子炉建屋オペフロ全景  
(11月20日時点)

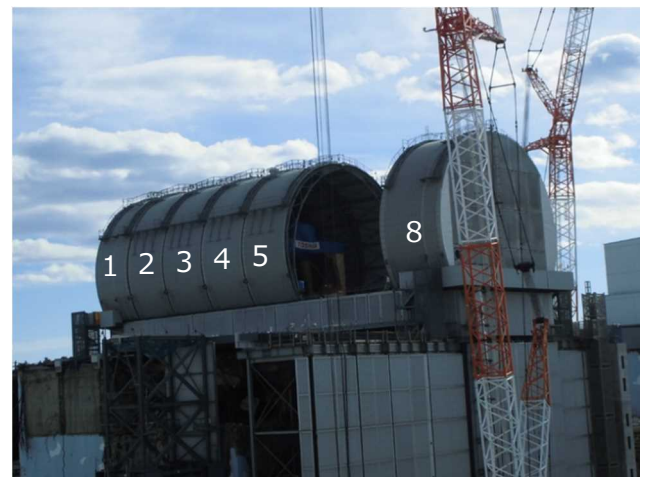

3号機原子炉建屋オペフロ全景  
(12月19日時点)

### ■ 1月の主な作業予定

- ・ ドーム屋根設置
- ・ 燃料取扱機・クレーン設置
- ・ 資機材整備

### ■ 備考

- ・ なし

以 上
