
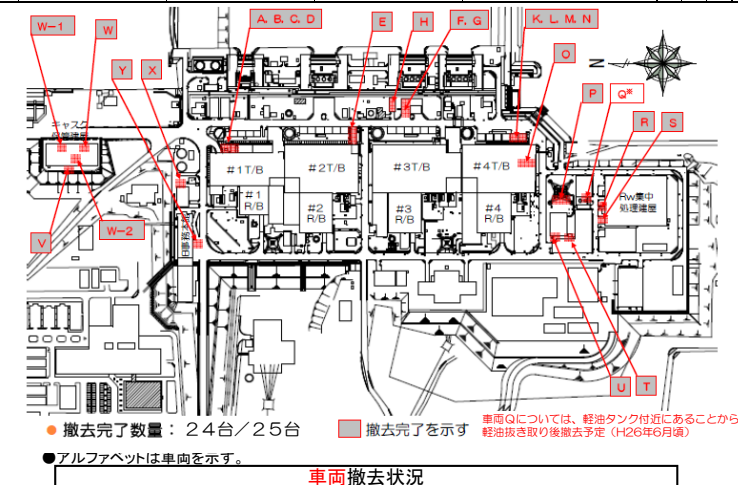


労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定		4月				5月				6月				7月				8月				備考
			20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	
被ばく・安全管理	1	<p>防護装備の適正化検討</p> <p>(実績) ・Jタンクエリアの全面マスク着用省略化の検討 ・「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえた敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討</p> <p>(予定) ・Jタンクエリアの全面マスク着用省略化の運用開始(5/30) ・「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえた敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討(平成25~27年度)</p> <p>※ダストフィルタ化: 空気中よう素131濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業できるエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。 ※全面マスク着用省略化: 空気中放射性物質濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、全面マスクを着用省略できるエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。 ※一般作業服化: シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗車する場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負担軽減を図る。</p>	検討・設計	Jタンクエリアの全面マスク着用省略化の検討				夕見坂周辺の全面マスク着用省略化の検討				「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討								追加	【Jタンクエリア】5月10日に除染(伐採・表土除去)が終了し、ダスト等の放射能濃度が基準を満たしていることを確認したため、全面マスク着用省略エリアを設定する。				
			現場作業	ダストフィルタ化 (実施済みエリア)H24.3.1:1~4号機及びその周辺建屋内を除く全域、H24.12.19:1~4号機及びその周辺建屋内				H26.5.30:Jタンクエリアの全面マスク着用省略化の運用開始予定				全面マスク着用省略化 (実施済みエリア)H23.11.8:正門・免震重要棟前・5.6号サービス建屋前、H24.6.1:企業センター厚生棟前、H24.8.9:車両汚染検査場・降車しない見学者、H24.11.19:入退域管理施設建設地、H25.1.28:構内企業棟の一部エリア(東電環境企業棟周辺)、H25.4.8:多核種除去設備、キャスク仮保管設備、H25.4.15:構内企業棟の一部エリア(登録センター周辺)、H25.5.30:1~4号機周辺・タンクエリア・瓦礫保管エリアを除くエリア、H25.10.7:5.6号機建屋内、H25.11.11:がれき保管エリア、H26.3.10:共用プール建屋内の一部エリア				一般作業服化 (実施済みエリア)H24.3.1:正門・免震重要棟前・5.6号サービス建屋前、H24.8.9:降車しない見学者、H25.6.30:入退域管理施設周辺、企業センター厚生棟周辺、運転手用汚染測定小屋周辺、H25.8.5:研修棟休憩所周辺、H26.3.17:構内駐車場及び構内企業棟一部エリア(関電工企業棟周辺)								追加	【夕見坂】6月上旬から1号カバ解体工事開始するため、連続ダストモニターで原子炉建屋上部の飛散防止剤の抑制効果を確認次第、全面マスク着用省略エリアを設定する。
			現場作業	車両Q				工程調整中												追加	【車両Q】重油タンク及び軽油タンク付近にあることから、重油ならびに軽油抜き取り後車両撤去実施予定。				
健康管理	3	<p>重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施</p> <p>(実績) ・協力企業との情報共有 ・5/22安全推進協議会開催:災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策:WBG T値の活用、クールベストの着用促進等</p> <p>(予定) ・5/29安全推進協議会の開催 ・作業毎の安全施策の実施(継続実施) ・熱中症予防対策実施:WBG T値の活用、クールベストの着用促進、炎天下作業の制限:7~8月(9月まで延長予定)等</p>	検討・設計	作業災害発生状況(H25実績、H26活動計画)検討等 ▼4/24																追加					
			現場作業	準備期間				【熱中症予防対策の実施】				情報共有、安全施策の検討・評価													:9月末まで
健康管理	4	<p>長期健康管理の実施</p> <p>(実績) ・H25年度対象者への「がん検査」(社員・協力企業作業員)、「白内障検査」(社員)の案内状送付実施。「甲状腺超音波検査」(社員・協力企業作業員)の案内状送付実施。 ・「がん検査」の受診希望に基づく、紹介状・検査依頼状・費用申請書の送付、検査費用の精算手続き ・インフルエンザの予防接種の実施(10/28~1/31:Jゲルツ、近隣医療機関) ※Jゲルツは12/4で終了、近隣医療機関も1/31で終了。 ・H25年度感染予防・拡大防止対策期間の終了の周知(5/23)</p> <p>(予定) ・H25年度検査費用の精算手続き(継続) ・H26年度実施に向けた準備(対象者の確定、案内状の見直し等)</p>	検討・設計	健康相談受付																					
			現場作業	H25年度検査費用の精算手続き(継続)、及びH26年度実施に向けた準備(対象者の確定、案内状の見直し等)																					【予防接種実績】5902人(H24:5467人)
健康管理	5	<p>継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化</p> <p>(実績) ・1F救急医療室のH26年6月末までの医師確保完了(固定医師1名+0-テック支援医師)</p> <p>(予定) ・1F救急医療室の恒常的な医師の確保に向けた調整 ・1F救急医療室の勤務医師についてH26年7月以降調整中</p>	検討・設計	各医療拠点の体制検討																					
			現場作業	常勤医師の雇用に向けた関係者との調整																					

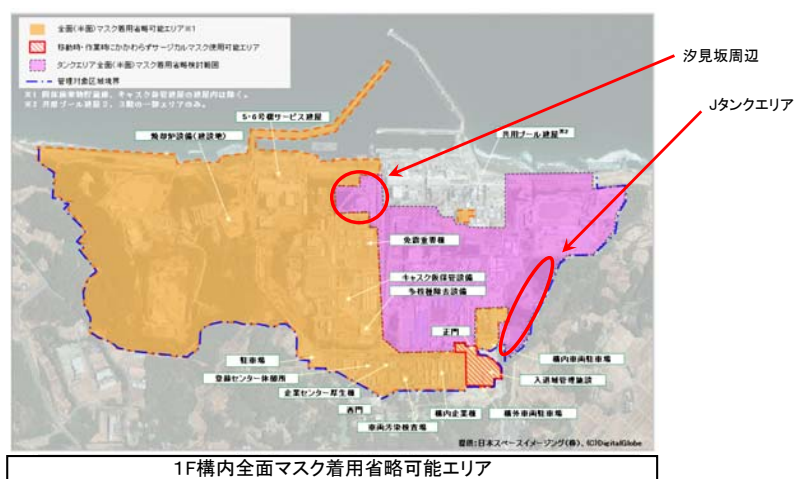

労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで一ヶ月の動きと今後一ヶ月の予定	4月		5月				6月				7月				8月				備考
				20	27	4	11	18	25	1	8	15	↓	上	中	下	前	後				
要員管理 労働環境改善	6	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) ・作業員の確保状況(4月実績/6月の予定)と地元雇用率(4月実績)についての調査・集計	▼作業員の確保状況調査依頼		作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握				▼作業員の確保状況集約				▼作業員の確保状況集約								
			(予定) ・作業員の確保状況(5月実績/7月の予定)と地元雇用率(5月実績)についての調査・集計																			
	7	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施										協力企業との意見交換会(労働環境)								
			(予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施) ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施) ・作業員へのアンケートによる実態把握(定期的に実施) ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応(継続的に実施)	▼協力企業との意見交換会(労働環境)4/25			▼協力企業との意見交換会(労働環境)5/30								▼		▼		時期調整中 作業員へのアンケート(第5回)			
	8	大型休憩所の設置	(実績) ・アスファルト撤去(継続) ・基礎工事(継続)	基礎工事										鉄骨工事				入退域管理施設の構外仮設休憩所を4/7より運用開始				
			(予定) ・基礎工事(継続)															H26年度末完了目標				
	9	新事務棟の建設	①暫定事務棟 (実績) ・基礎工事 ・鉄骨建方 ・内装工事	官庁手続き、設計														I期：H26年6月末完了目標 II期：H26年9月末完了目標				
			(予定) ・鉄骨建方(継続) ・内装工事(継続)	敷地造成、基礎工事		実績工程反映(6/7→5/24)				鉄骨・内装工事他												
			②本設事務棟 (実績) ・諸条件の検討	諸条件把握、基本計画検討						設計								H27年度末完了目標				
			(予定) ・諸条件の検討(継続)																			
	10	福島給食センターの設置	(実績) ・設計(継続) ・確認申請他事前協議 ・準備工事(整地工事など)(継続)	諸条件の把握、官庁手続き						給食センターの設計								H26年度末完了目標				
(予定) ・設計 ・準備工事(整地工事など)			準備工事(整地工事など)		追加 5/29起工式				本体工事													
11	車両整備場の建設	(実績) ・敷地造成完了 ・杭打ち完了 ・基礎工事継続中 ・躯体工事(鉄筋)実施中	基礎工事		躯体工事(鉄筋)				▽営業開始								H26年6月1日営業開始予定					
		(予定) ・外壁、屋根工事 ・付帯設備工事(電気、消防、換気設備)	外壁、屋根工事		付帯設備工事(電気、消防、換気設備)																	
