

福島第一原子力発電所第4号機 燃料取り出しに向けた作業の進捗状況について

東京電力株式会社

平成25年9月26日



1

燃料取り出し設備に係わる作業実績及び予定

【作業実績】

- ・ 2013年5月29日 燃料取り出し用カバー鉄骨建方完了
- ・ 2013年6月7日～14日 天井クレーン部材の上架作業完了
- ・ 2013年7月10日～13日 燃料取扱機部材の上架作業完了
(現在、各部の動作確認を実施中)
- ・ 2013年9月25日 天井クレーン設置工事完了
(労基落成検査受験済)

【今後の予定】

- ・ 2013年10月中旬 天井クレーンの使用前検査受験予定
- ・ 2013年10月中旬 燃料取扱機の設置工事完了予定
(完了後、使用前検査受験予定)
- ・ 2013年11月中旬 燃料取り出し作業開始予定

状況写真①

①天井クレーン全体（オペレーティングフロア北側より撮影）



②天井クレーン全体（オペレーティングフロアより見上げたもの）



状況写真②

③燃料取扱機全体（オペレーティングフロア北側より撮影）



④燃料取扱機，天井クレーン設置状況（オペレーティングフロア北側より撮影）



瓦礫撤去作業に係わる作業実績及び予定

【作業実績】

- ・2013年8月27日 原子炉ウェル内瓦礫撤去作業開始
- ・2013年9月17日 使用済燃料プール内瓦礫撤去作業開始※
(瓦礫撤去作業を継続中)

【今後の予定】

- ・2013年10月上旬 キャスクピット内炉内機器移動作業開始予定
- ・2013年11月中旬 燃料取り出し作業開始予定

※使用済燃料プール内瓦礫撤去は、燃料取り出し作業中も並行して実施する予定。

撤去した瓦礫写真（一例）


①原子炉ウェル内瓦礫（デッキプレート）



②使用済燃料プール内瓦礫（足場板）



瓦礫撤去の進捗状況（使用済燃料プールの瓦礫マップ）

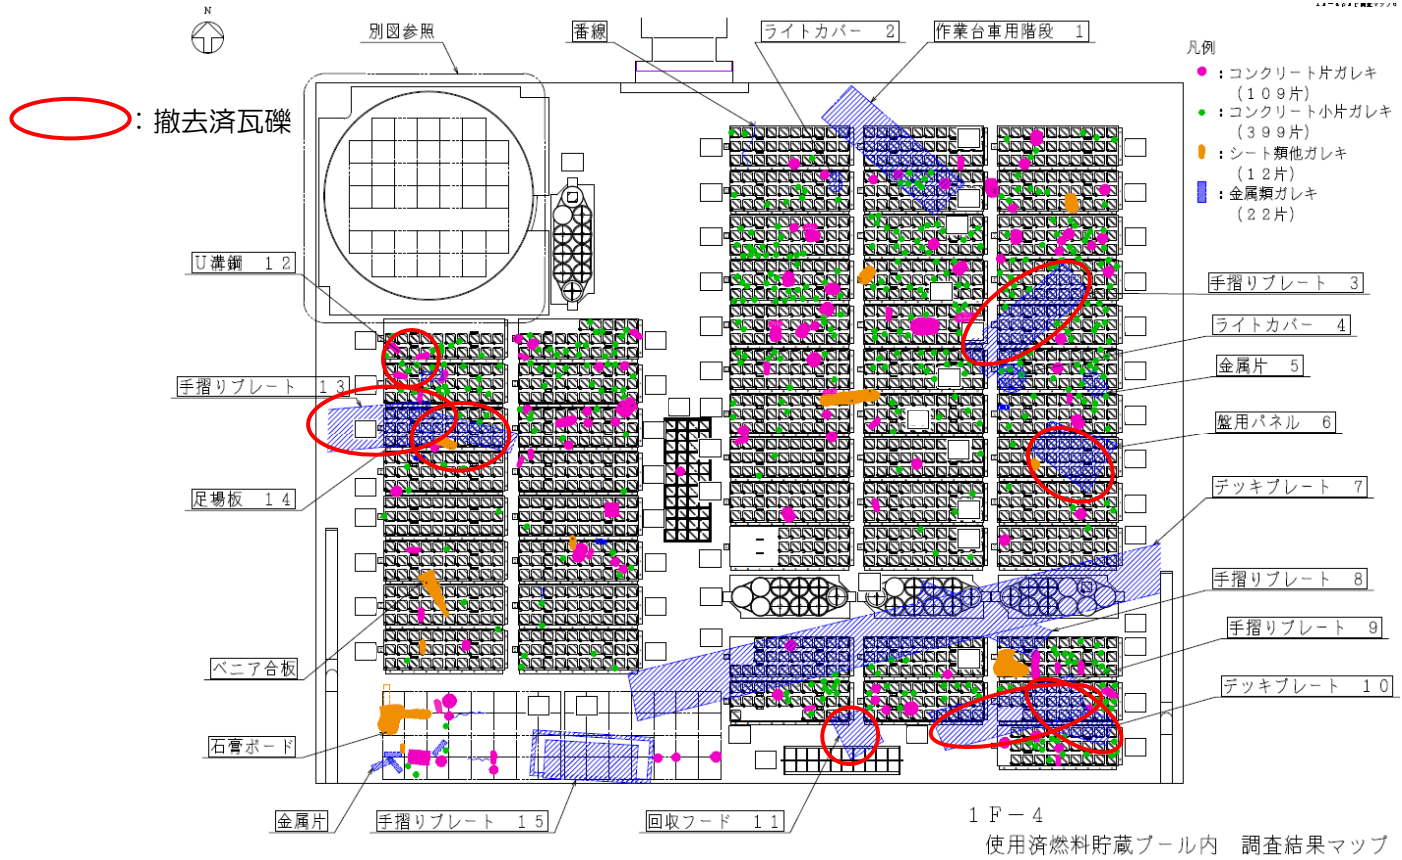

瓦礫撤去の進捗状況（原子炉ウェルの瓦礫マップ）

