


【3号機原子炉建屋上部除染・遮へい工事】

- 11月28日（木）～12月25日（水）主な作業実績
 - ・ R/B上部除染・遮へい準備工事
 - ・ R/B上部除染(がれき集積)
 - ・ SFP内瓦礫撤去準備、瓦礫撤去
 - ・ 作業ヤード整備

□作業進捗イメージ図

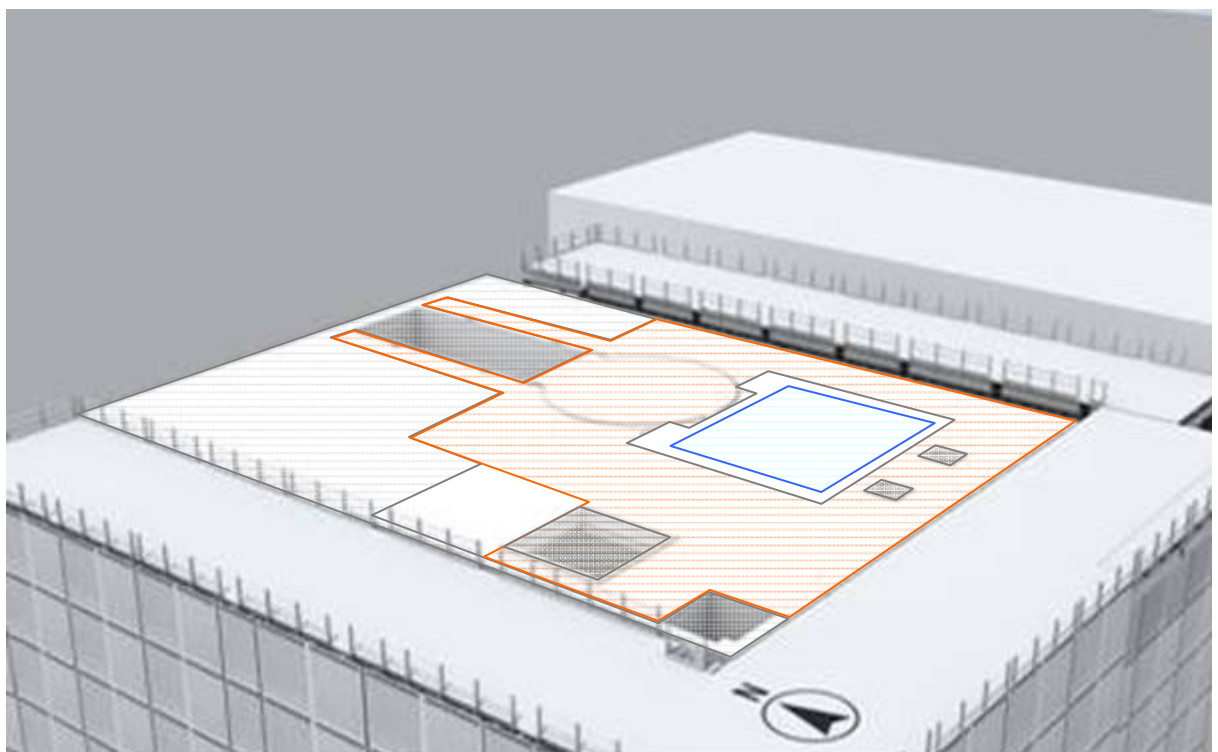

【凡例】

除染対象外 がれき集積 がれき吸引 床表層切削 遮へい材設置
SFP内瓦礫撤去

※除染・遮へい対策手順：がれき集積→がれき吸引→床表層切削→遮へい材設置

- 12月26日（木）～1月29日（水）主な作業予定
 - ・ R/B上部除染(がれき集積、がれき吸引、床表層切削)
 - ・ 作業ヤード整備
 - ・ SFP内瓦礫撤去

■備考

- ・ R/B：原子炉建屋
- ・ SFP：使用済燃料貯蔵プール

以 上
