


労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		12月		1月				2月			3月		4月	備考		
			22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20		27	
被ばく・安全管理	1	<p>防護装備の適正化検討</p> <p>(実績) ・共用プール建屋内の全面マスク着用省略化の検討 ・「敷地内線量低減の中長期実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討</p> <p>(予定) ・共用プール建屋内の全面マスク着用省略化の検討 ・汐見坂周辺の全面マスク着用省略化の検討 ・「敷地内線量低減の中長期実施方針」を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用省略化の検討(平成25~27年度)</p> <p>※ダストフィルタ化: 空気中よう素131濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※全面マスク着用省略化: 空気中放射性物質濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、全面マスクを着用省略できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※一般作業服化: シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗車する場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減を図る。</p>	検討・設計																
			現場作業																
労働環境改善	2	<p>重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施</p> <p>(実績) ・協力企業との情報共有 1/23安全推進協議会開催: 作業工程、規制情報の連絡等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等) ・熱中症予防対策: 次年度計画の検討等</p> <p>(予定) ・1/30安全推進協議会の開催 ・作業毎の安全施策の実施(継続実施) ・熱中症予防対策: 次年度計画の検討等</p>	検討・設計																
			現場作業																
健康管理	3	<p>長期健康管理の実施</p> <p>(実績) ・H25年度対象者への「がん検査」(社員・協力企業作業員)、「白内障検査」(社員)の案内状送付実施。「甲状腺超音波検査」(協力企業作業員)の案内状送付開始。 ・「がん検査」の受診希望に基づく、紹介状・検査依頼状・費用申請書の送付、検査費用の精算手続き ・インフルエンザの予防接種の実施(10/28~1/31: Jグレッツ、近隣医療機関) ※Jグレッツは12/4で終了、12/5~1/31は近隣医療機関で接種可能</p> <p>(予定) ・H25年度甲状腺超音波検査の案内状の送付準備(社員)</p>	検討・設計																
			現場作業																
健康管理	4	<p>継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化</p> <p>(実績) ・1F救急医療室のH26年4月上旬までの医師確保完了(固定医師1名+0-7ヶ月支援医師)</p> <p>(予定) ・1F救急医療室の恒常的な医師の確保に向けた調整</p>	検討・設計																
			現場作業																

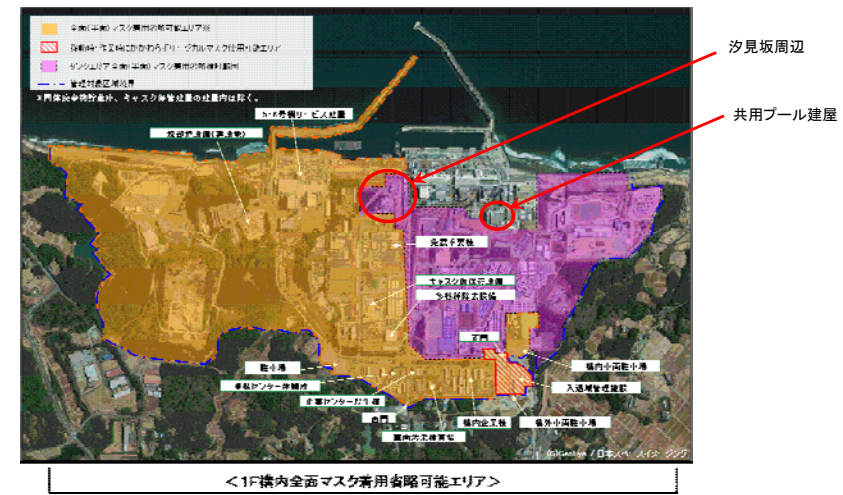

労働環境改善スケジュール

分野名	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定	12月		1月				2月			3月			4月	備考
				22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	
労働環境改善	5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) ・作業員の確保状況(2月の予定)と地元雇用率(12月実績)について調査・集計	検討・設計	▽作業員の確保状況調査依頼				作業員の確保状況集約 ▽作業員の確保状況調査依頼			作業員の確保状況集約					
			(予定) ・作業員の確保状況(3月の予定)と地元雇用率(1月実績)について調査・集計	現場作業	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握												
	6	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施							協力企業との意見交換会(労働環境)					
			(予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施) ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施) ・作業員へのアンケートによる実態把握(定期的実施) ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応(継続的に実施)	現場作業	▽協力企業との意見交換会(労働環境)12/26	▽アンケート結果の公表 作業員へのアンケート(第4回)			▽協力企業との意見交換会(労働環境)2/7			▽「適切な労働条件確保」に関する講習会(2/4, 18, 25)					
	7	休憩所の設置・拡大	(実績) ・大型休憩所の詳細設計	検討・設計	大型休憩所の設計												
(予定) ・大型休憩所の着工 ・移動式休憩所等の運用開始			現場作業	更なる前倒しに向けた計画検討				▽移動式休憩所の運用開始			大型休憩所の着工			H26年12月末完成目標			
8	新事務棟の建設	①暫定事務棟 (実績) ・ボーリング調査 (予定) ・官庁手続き ・設計 ・敷地造成	検討・設計	①関係法令抽出、インフラ整備上の課題抽出				①官庁手続き、設計									
		②本設事務棟 (実績) ・企画検討(概略規模、概略工程) (予定) ・諸条件の把握 ・基本計画の検討	現場作業	②諸条件把握、基本計画検討				①敷地造成、地盤改良、基礎工事			①鉄骨工事他			①暫定事務棟 I期：H26年6月末完了目標 II期：H26年9月末完了目標 ②本設事務棟 H27年度末完了目標			
9	給食センターの設置	(実績) ・食事の提供方式の検討(セントラルキッチン方式) ・企画検討(概略規模、概略工程) ・候補地選定	検討・設計	敷地の選定				諸条件の把握、官庁手続き			給食センターの設計						
		(予定) ・諸条件の把握 ・関係法令の抽出	現場作業	ボーリング調査、測量				※設計へ反映			候補地確定による現地工程追加			H26年度末完了目標			
10	車輛整備工場の建設	(実績) ・基礎工事継続中	検討・設計					基礎工事			詳細工程確定による見直し						
		(予定) ・躯体工事(鉄筋) ・外壁、屋根工事 ・付帯設備工事(電気、消防、換気設備)	現場作業					躯体工事(鉄筋)			外壁、屋根工事			H26.3.20竣工予定 H26.4~試運用予定			

労働環境改善

詳細工程確定による見直し

詳細工程確定による見直し

候補地確定による現地工程追加

詳細工程確定による見直し
