


### 【3号機原子炉建屋上部除染・遮へい工事】

- 3月27日（木）～4月23日（水）主な作業実績
  - ・ R/B上部除染(ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削)
  - ・ 遮へい材設置
  - ・ SFP内瓦礫撤去
  - ・ 作業ヤード整備

□作業進捗イメージ図

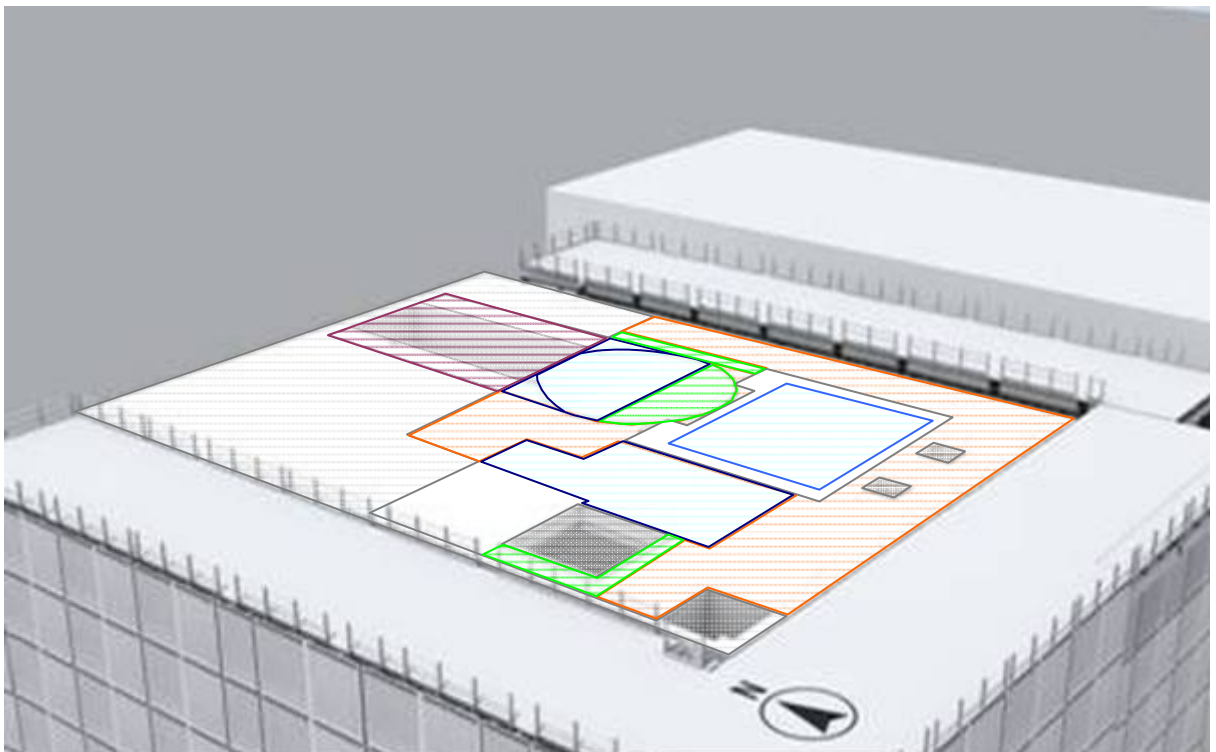

#### 【凡例】

- 除染対象外    □ ガレキ集積    □ ガレキ吸引    □ 床表層切削    □ 遮へい材設置  
□ SFP内ガレキ撤去

※除染・遮へい対策手順：ガレキ集積→ガレキ吸引→床表層切削→遮へい材設置

- 4月24日（木）～5月28日（水）主な作業予定
  - ・ SFP内瓦礫撤去
  - ・ R/B上部除染(ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削)
  - ・ 作業ヤード整備
- 備考
  - ・ R/B：原子炉建屋
  - ・ SFP：使用済燃料貯蔵プール
