


【3号機原子炉建屋上部除染・遮へい工事】

- 6月27日（金）～7月30日（水）主な作業実績
 - ・ R/B上部除染（ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削）
 - ・ R/B北西崩落部調査
 - ・ 作業ヤード整備

□作業進捗イメージ図

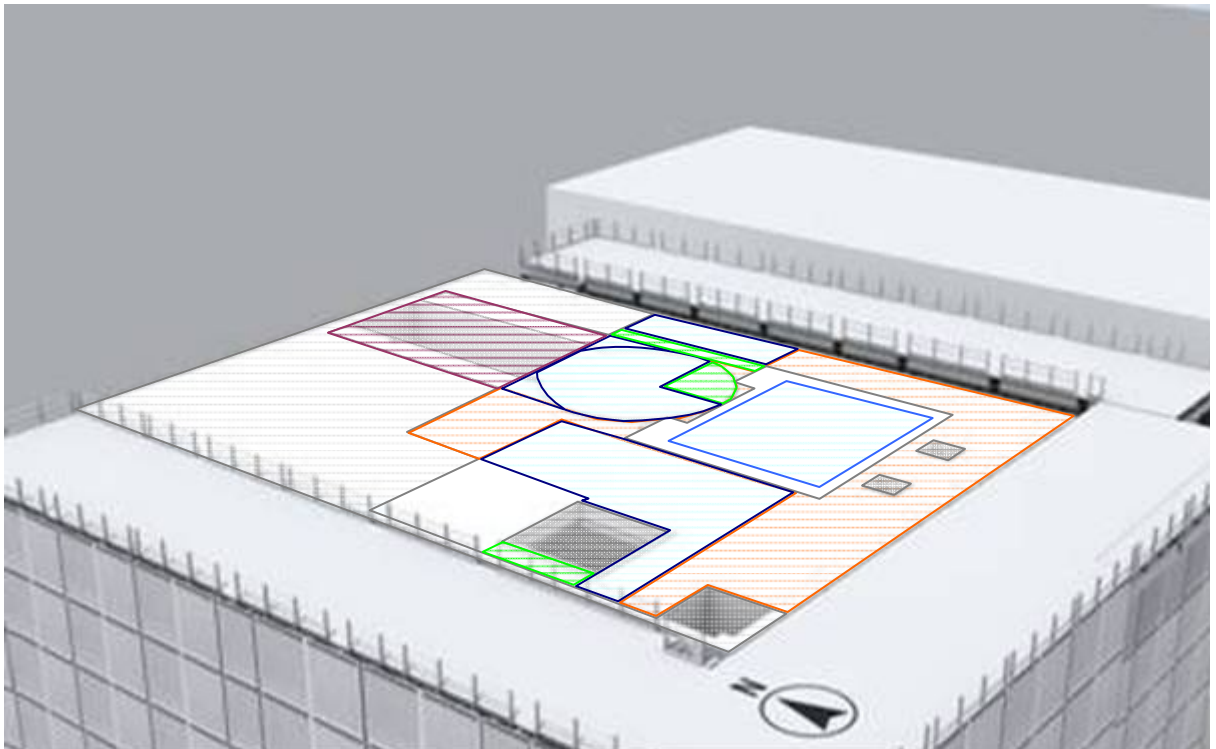

【凡例】

- 除染対象外 ■ ガレキ集積 ■ ガレキ吸引 ■ 床表層切削 ■ 遮へい材設置
■ SFP内ガレキ撤去

※除染・遮へい対策手順：ガレキ集積→ガレキ吸引→床表層切削→遮へい材設置

- 7月31日（木）～8月27日（水）主な作業予定
 - ・ SFP内瓦礫撤去
 - ・ R/B上部除染（ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削）
 - ・ 作業ヤード整備

■備考

- ・ R/B：原子炉建屋
- ・ SFP：使用済燃料貯蔵プール
