


凍土方式遮水壁大規模整備実証事業 状況報告

平成26年8月18日

(1) 施工進捗状況 (1 / 5)

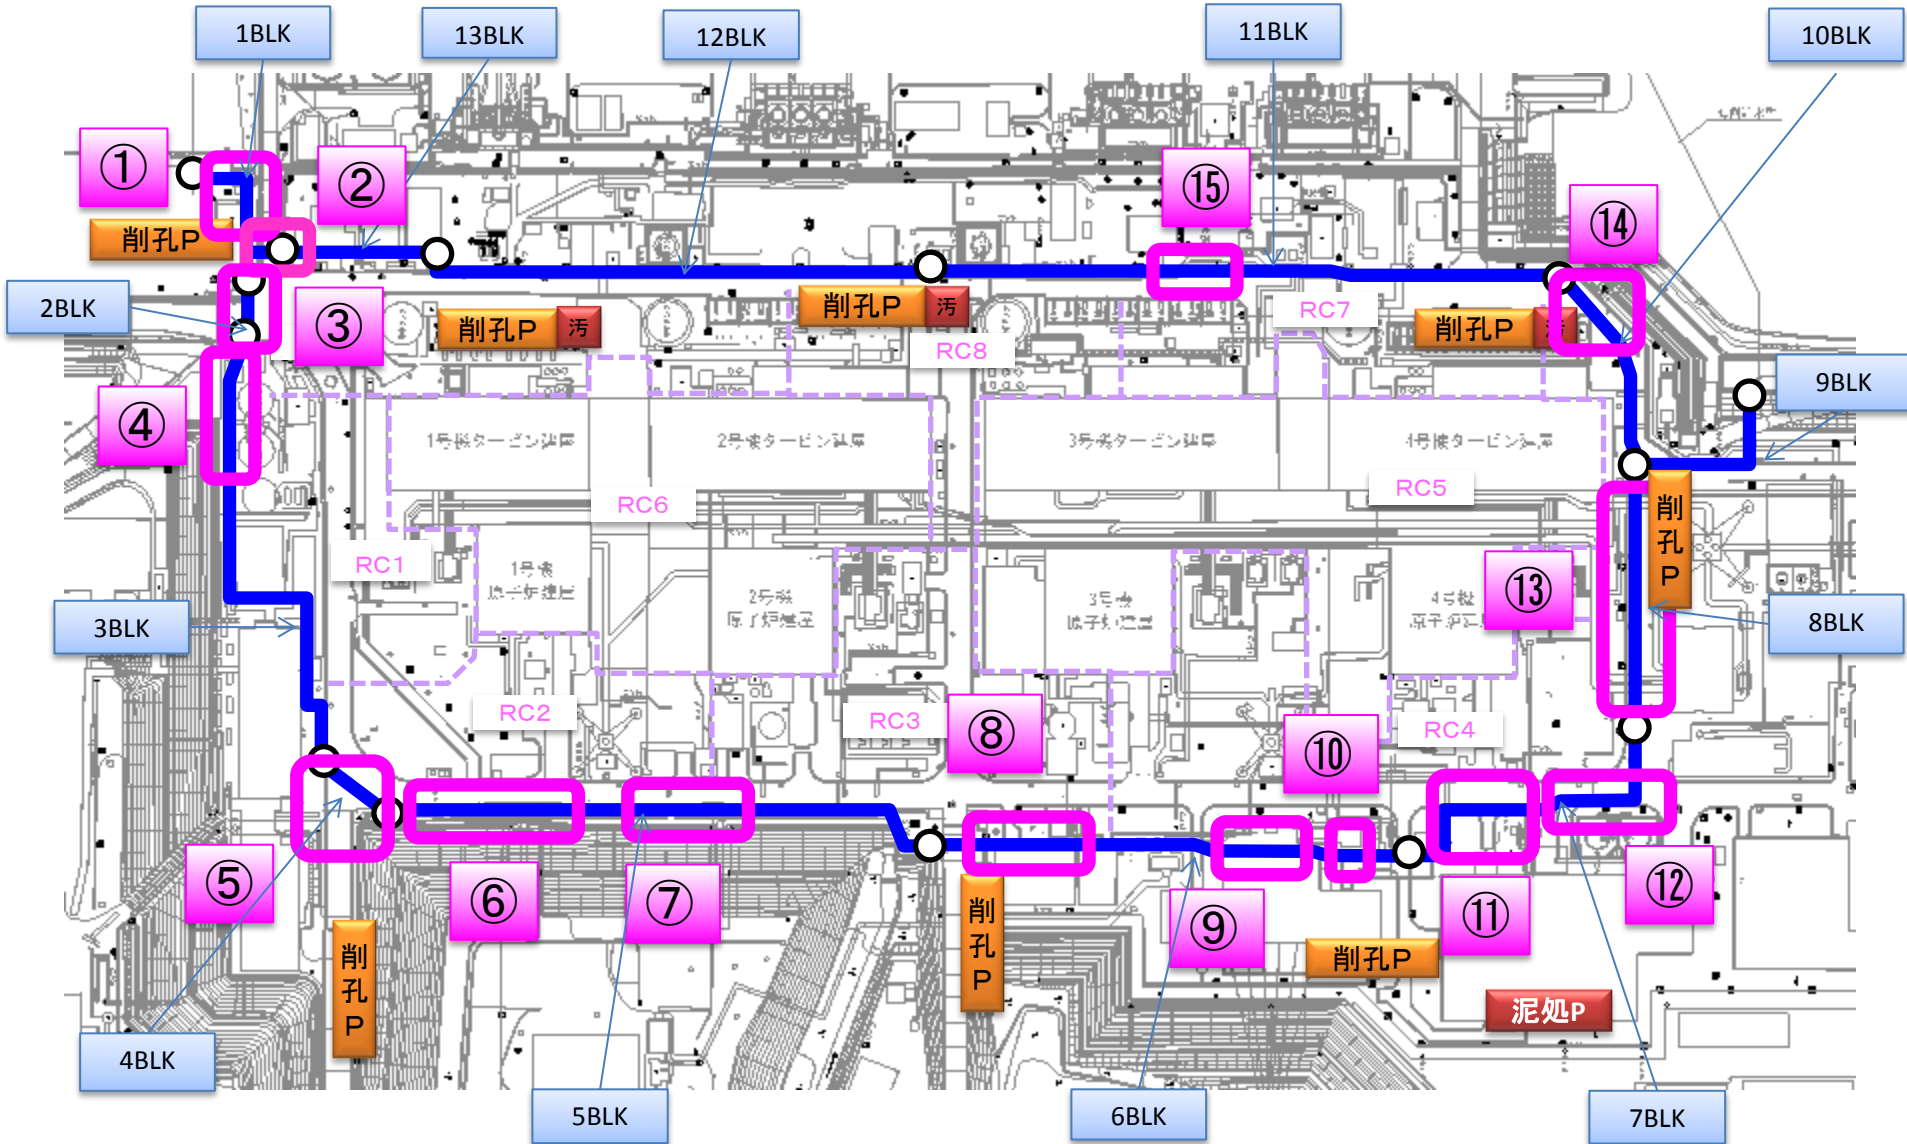

 : 今回報告箇所

(1) 施工進捗状況 (2/5)


ブロック	種別	本数	実績	進捗	貫通施工	実績	進捗	備考
1BLK	凍結管	75本	30本	40.0%	0本			
	測温管	15本	2本	13.3%	0本			
	計	90本	32本	35.6%	0本			
2BLK	凍結管	16本			0本			
	測温管	3本			0本			
	計	19本			0本			
3BLK	凍結管	206本	7本	3.4%	2本			
	測温管	39本	1本	2.6%	0本			
	計	245本	8本	3.3%	2本			
4BLK	凍結管	28本	16本	57.1%	4本			
	測温管	6本	3本	50.0%	0本			
	計	34本	19本	55.9%	4本			
5BLK	凍結管	226本	46本	20.4%	19本			
	測温管	45本	1本	2.2%	2本			
	計	271本	47本	17.3%	21本			
6BLK	凍結管	220本			18本			
	測温管	44本			0本			
	計	264本			18本			
7BLK	凍結管	108本	22本	20.4%	8本			
	測温管	22本	0本	0.0%	3本			
	計	130本	22本	16.9%	11本			
8BLK	凍結管	104本	93本	89.4%	0本			
	測温管	20本	18本	90.0%	0本			
	計	124本	111本	89.5%	0本			
9BLK	凍結管	73本			7本			
	測温管	14本			1本			
	計	87本			8本			
10BLK	凍結管	75本			9本			
	測温管	15本			0本			
	計	90本			9本			
11BLK	凍結管	225本			47本			
	測温管	45本			3本			
	計	270本			50本			
12BLK	凍結管	159本			45本			
	測温管	32本			0本			
	計	191本			45本			
13BLK	凍結管	56本			6本			
	測温管	13本			1本			
	計	69本			7本			
合計	凍結管	1571本	214本	13.6%	165本	0本		
	測温管	313本	25本	8.0%	10本	0本		
	計	1884本	239本	12.7%	175本	0本		

(8/4現在)

(1) 施工進捗状況 (3/5)



写真① 1BLK 捨石調査



写真② 1BLK トレンチ試掘



写真③ 2BLK 削孔状況



写真④ 3BLK 試掘状況

(1) 施工進捗状況 (4/5)



写真⑥ 4BLK 削孔状況



写真⑥ 5BLK 削孔状況



写真⑦ 5BLK 削孔状況



写真⑧ 6BLK 建屋前

(1) 施工進捗状況 (5/5)




写真⑨ 6BLK コア削孔状況



写真⑩ 7BLK 路下ピット



写真⑪ 7BLK 削孔状況



写真⑫ 7BLK 試掘状況

(1) 施工進捗状況 (5/5)



写真⑬ 8BLK 測温管試掘状況



写真⑭ 1 OBLK 試掘状況



写真⑮ 1 1 BLK 埋設調査状況
