


### 【3号機原子炉建屋上部除染・遮へい工事】

■ 7月31日（木）～8月27日（水）主な作業実績

- ・ SFP内瓦礫撤去
- ・ R/B上部除染(ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削)
- ・ 作業ヤード整備

□ 作業進捗イメージ図

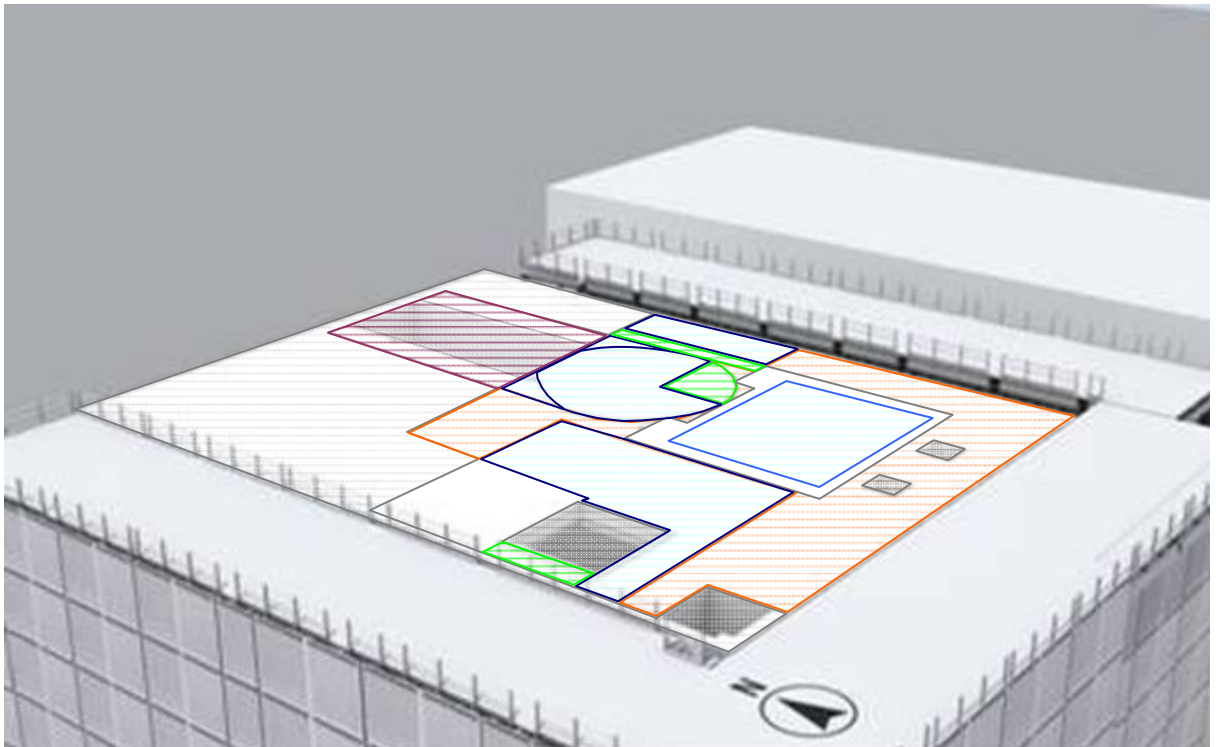

【凡例】

- 除染対象外   ■ ガレキ集積   ■ ガレキ吸引   ■ 床表層切削   ■ 遮へい材設置  
■ SFP内ガレキ撤去

※除染・遮へい対策手順：ガレキ集積→ガレキ吸引→床表層切削→遮へい材設置

■ 8月29日（金）～9月24日（水）主な作業予定

- ・ SFP内瓦礫撤去
- ・ R/B上部除染(ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削)
- ・ 作業ヤード整備

■ 備考

- ・ R/B：原子炉建屋
- ・ SFP：使用済燃料貯蔵プール
