

# 新事務棟Ⅱ期工事（9月末完成予定）の 進捗状況について

平成26年9月25日  
東京電力株式会社  
労働環境改善分野

## 1. 新事務棟の概要について

- 現場と情報共有を密にし、迅速な対応を可能とするために、現場機能の一体化・集中化を図る
- 平成26年9月末までに完成予定（Ⅰ期工事H26.6.30完成、Ⅱ期工事：H26.9末予定）

### 建物概要

- 構造：鉄骨造、2階建
- 面積：約14,000m<sup>2</sup>
- 収容人数：約1,000人



建設地




Ⅰ期工事分


- 福島第二原子力発電所の構内で執務している福島第一廃炉推進カンパニーの要員(約860名)が福島第一原子力発電所に建設している新事務棟に10月中に移転予定。

水処理関連部門など、約360名の要員は先行して7月22日より新事務棟で執務開始(既報)

2階平面図

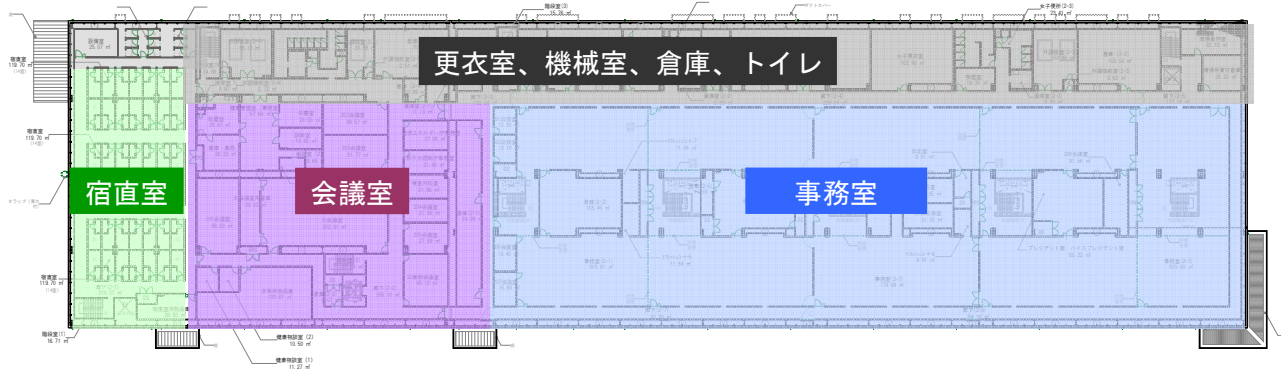

1階平面図

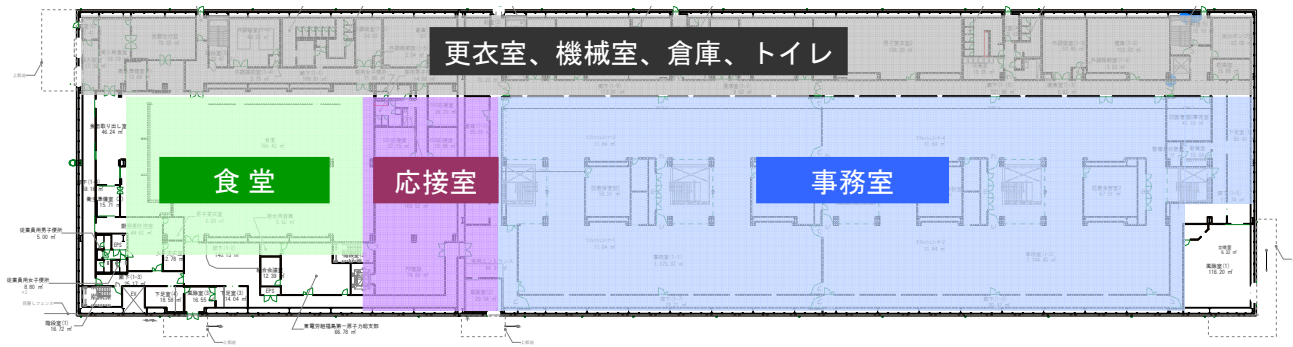

東京電力株式会社


(参考) 工事現場写真



外観 (9/10撮影)



内観 (2階部分) (9/10撮影)

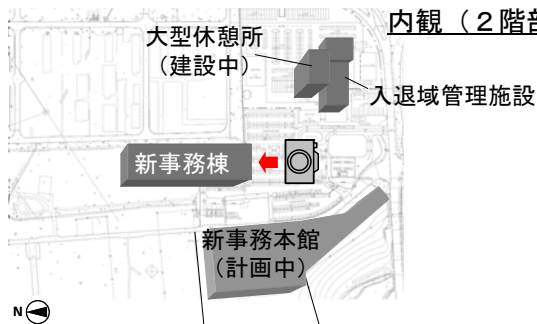

東京電力株式会社
