


凍土方式遮水壁大規模整備実証事業 状況報告

平成26年10月22日

施工進捗状況 (1 / 7)

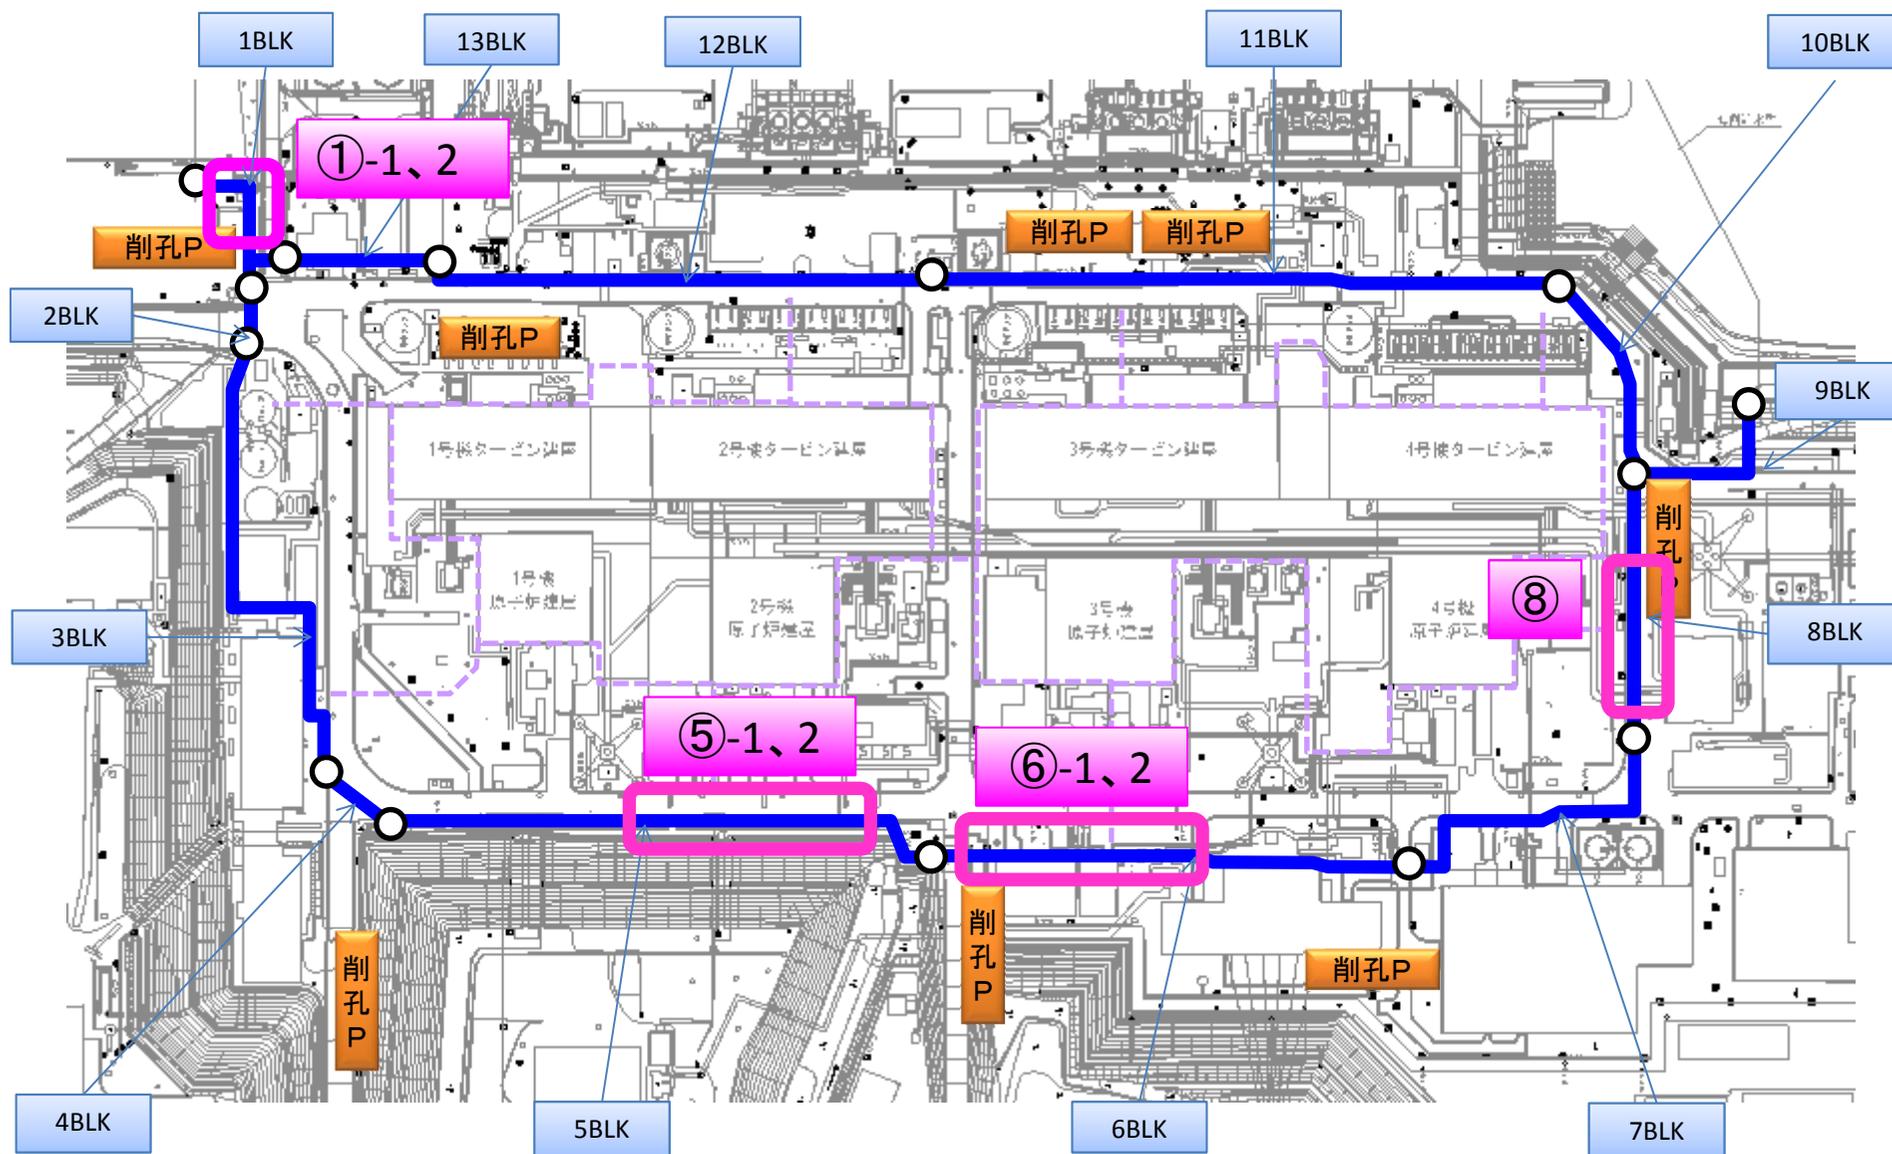

 : 写真掲載箇所

(1) 施工進捗状況 (2/7)


ブロック	種別	本数	削 孔			スタンドパイプ		建 込		備考
			実績	進捗	貫通	実績	進捗	実績	進捗	
1BLK	凍結管	75本	64本	85.3%						
	測温管	15本	14本	93.3%						
	計	90本	78本	86.7%						
2BLK	凍結管	18本	11本	61.1%						
	測温管	4本	2本	50.0%						
	計	22本	13本	59.1%						
3BLK	凍結管	196本	53本	27.0%	2本					
	測温管	38本	2本	5.3%	0本					
	計	234本	55本	23.5%	2本					
4BLK	凍結管	28本	17本	60.7%	4本					
	測温管	6本	4本	66.7%	0本					
	計	34本	21本	61.8%	4本					
5BLK	凍結管	221本	151本	68.3%	19本			43本	19.5%	
	測温管	44本	28本	63.6%	2本			9本	20.5%	
	計	265本	179本	67.5%	21本			52本	19.6%	
6BLK	凍結管	190本	62本	32.6%	18本					
	測温管	41本	12本	29.3%	0本					
	計	231本	74本	32.0%	18本					
7BLK	凍結管	125本	55本	44.0%	8本					
	測温管	27本	14本	51.9%	3本					
	計	152本	69本	45.4%	11本					
8BLK	凍結管	104本	96本	92.3%				88本	84.6%	
	測温管	21本	20本	95.2%				16本	76.2%	
	計	125本	116本	92.8%				104本	83.2%	
9BLK	凍結管	73本	41本	56.2%	7本					
	測温管	14本	7本	50.0%	1本					
	計	87本	48本	55.2%	8本					
10BLK	凍結管	75本			9本		2本	2.7%		
	測温管	15本			0本		1本	6.7%		
	計	90本			9本		3本	3.3%		
11BLK	凍結管	225本			47本			0.0%		
	測温管	45本			3本			0.0%		
	計	270本			50本			0.0%		
12BLK	凍結管	159本			45本			0.0%		
	測温管	32本			0本			0.0%		
	計	191本			45本			0.0%		
13BLK	凍結管	56本			6本					
	測温管	13本			1本					
	計	69本			7本					
合計	凍結管	1,545本	550本	35.6%	165本	0本	2本	0.4%	131本	8.5%
	測温管	315本	103本	32.7%	10本	0本	1本	1.1%	25本	7.9%
	計	1,860本	653本	35.1%	175本	0本	3本	0.5%	156本	8.4%

(10/18現在)

施工進捗状況（3／7）



写真①-1 1BLK
観測井戸

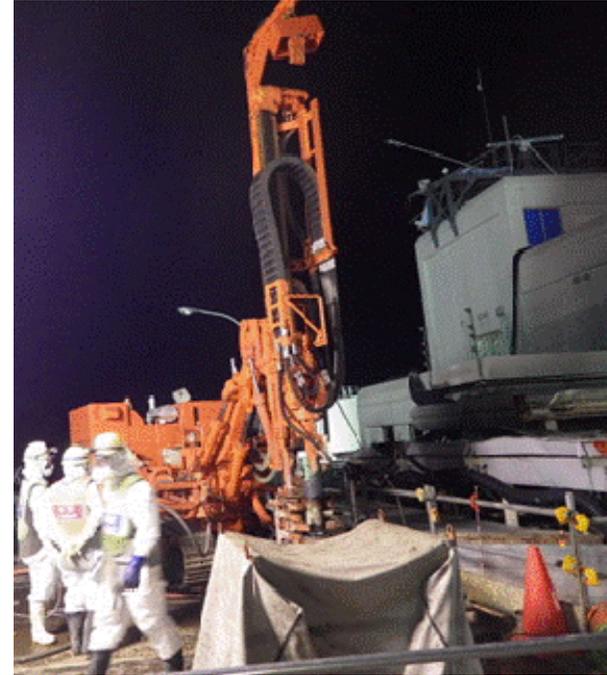

写真①-2 1BLK
削孔（13BLK側）

施工進捗状況（4／7）



写真⑤-1 5BLK削孔



写真⑤-2 5BLK削孔傾斜測定

施工進捗状況（5 / 7）



写真⑥-1 6BLK
埋設物探査ボーリング



写真⑥-2 6BLK
(線量低減対策) 鉛板壁設置

施工進捗状況（6／7）



写真⑧ 8BLK
凍結管_建込み状況

施工進捗状況 (7/7)

凍結プラント施工状況

