


### 【3号機原子炉建屋上部除染・遮へい工事】

■ 9月25日（木）～10月29日（水）主な作業実績

- ・ R/B上部除染(ガレキ集積)
- ・ 作業ヤード整備

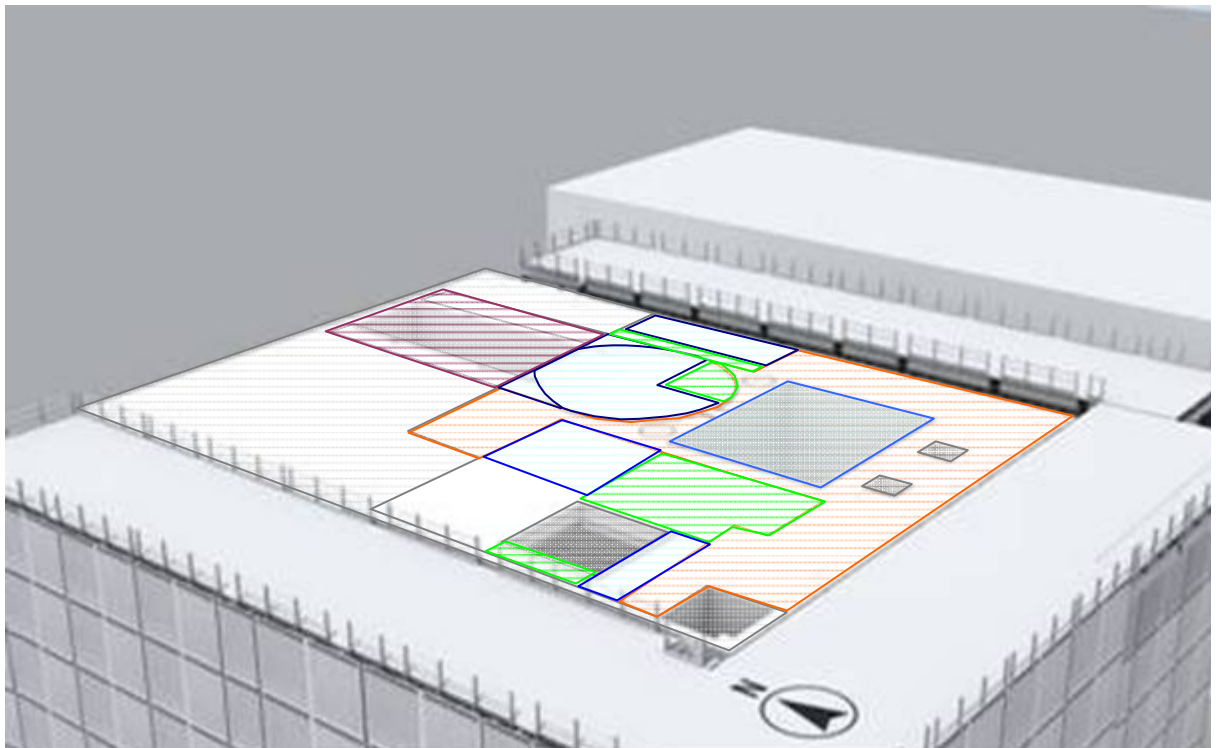

【凡例】

- 除染対象外   ガレキ集積   ガレキ吸引   床表面層切削   遮へい材設置  
SFP内ガレキ撤去

※除染・遮へい対策手順：ガレキ集積→ガレキ吸引→床表面層切削→遮へい材設置

□作業進捗イメージ図

■ 10月30日（木）～11月26日（水）主な作業予定

- ・ R/B上部除染(ガレキ集積、ガレキ吸引、床表面層切削)
- ・ 作業ヤード整備

■備考

- ・ R/B：原子炉建屋
- ・ SFP：使用済燃料貯蔵プール
