


【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

- 10月22日（水）～10月29日（水）主な作業実績
 - ・屋根貫通飛散防止剤散布

□ 今月



作業進捗

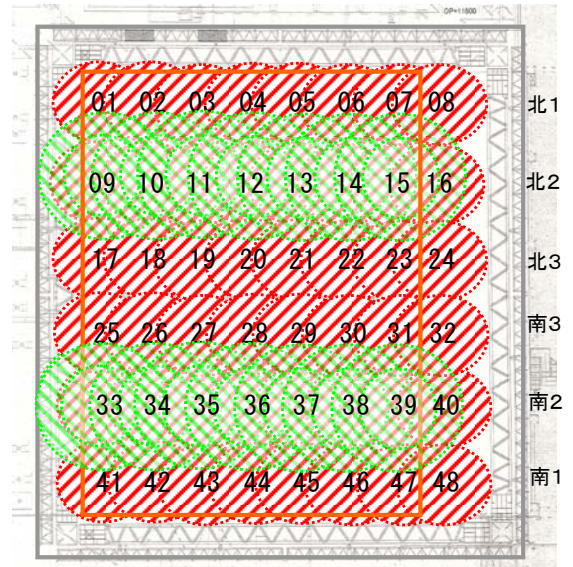

- ⊘ 飛散防止剤散布完了
- ⊙ 飛散防止剤散布完了（ドーナツ状に散布）

- 10月30日（木）～11月26日（水）主な作業予定
 - ・屋根パネル取外し（南3、北3）
 - ・飛散防止剤散布
 - ・調査
 - ・屋根パネル再取付け（北3）

■ 備考

以上
