


### 【3号機原子炉建屋上部除染・遮へい工事】

- 10月30日（木）～11月26日（水）主な作業実績
  - ・ R/B上部除染（ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削）
  - ・ 作業ヤード整備

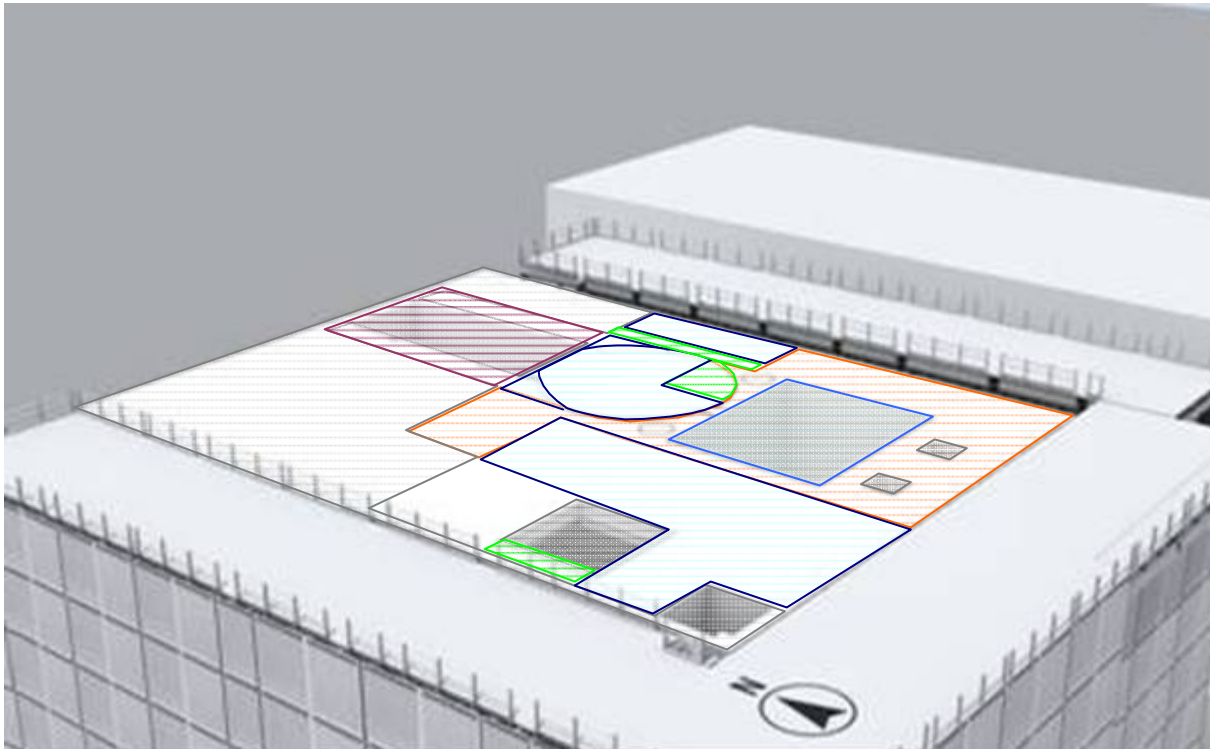

#### 【凡例】

- 除染対象外
- ガレキ集積
- ガレキ吸引
- 床表層切削
- 遮へい材設置
- SFP内ガレキ撤去

※除染・遮へい対策手順：ガレキ集積→ガレキ吸引→床表層切削→遮へい材設置

□作業進捗イメージ図

- 11月27日（木）～12月24日（水）主な作業予定
  - ・ R/B上部除染（ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削）
  - ・ SFP内瓦礫撤去
  - ・ 作業ヤード整備

#### ■備考

- ・ R/B：原子炉建屋
- ・ SFP：使用済燃料貯蔵プール
