


### 【3号機原子炉建屋上部除染・遮へい工事】

- 11月27日（木）～12月24日（水）主な作業実績
  - ・ R/B上部除染（ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削）
  - ・ SFP内瓦礫撤去
  - ・ 追加飛散防止剤散布
  - ・ 作業ヤード整備

□作業進捗イメージ図

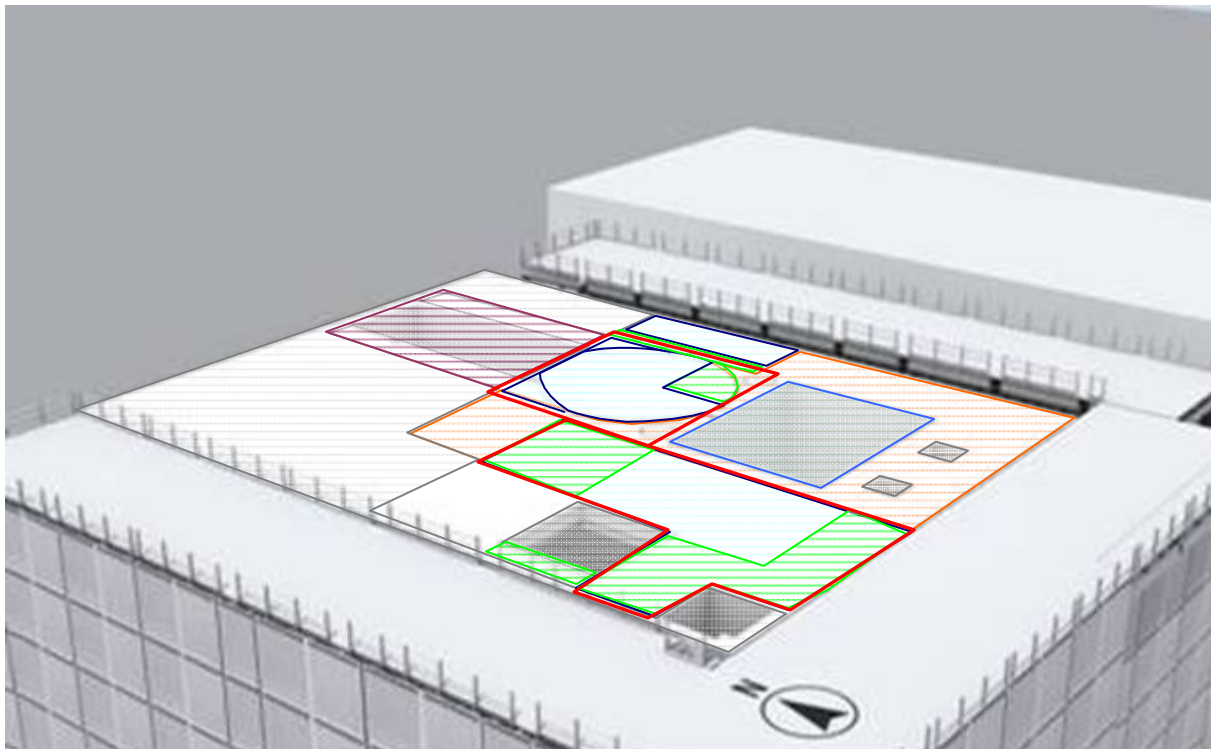

#### 【凡例】

- 除染対象外   ■ ガレキ集積   ■ ガレキ吸引   ■ 床表層切削   ■ 遮へい材設置  
■ SFP内ガレキ撤去   ■ 追加飛散防止剤散布

※除染・遮へい対策手順：ガレキ集積→ガレキ吸引→床表層切削→遮へい材設置

- 12月25日（木）～1月28日（水）主な作業予定
  - ・ R/B上部除染（ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削）
  - ・ SFP内瓦礫撤去
  - ・ 追加飛散防止剤散布
  - ・ 作業ヤード整備

#### ■備考

- ・ R/B：原子炉建屋
- ・ SFP：使用済燃料貯蔵プール
- ・ 追加飛散防止剤散布：オペレーティングフロア全面への散布は既に実施済であるため、当該月の作業進捗に合わせた追加散布（作業前、作業後）エリアのみを記載

以 上
