



# 2, 3号機取水口間の地盤改良部分の 地表処理について

平成27年2月26日  
東京電力株式会社



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社


## 地盤改良壁の地表処理

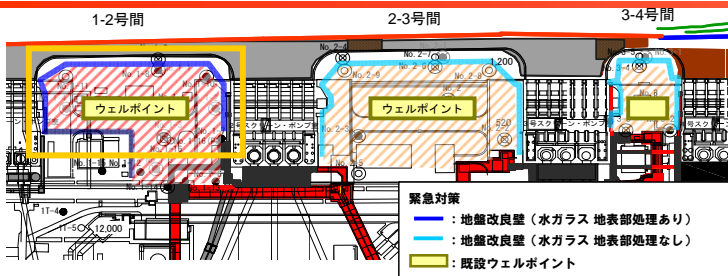

①モルタル置換完了

②モルタル置換施工

1-2号機間改良体天端から地表面までのモルタル置換作業はH26/1に完了。


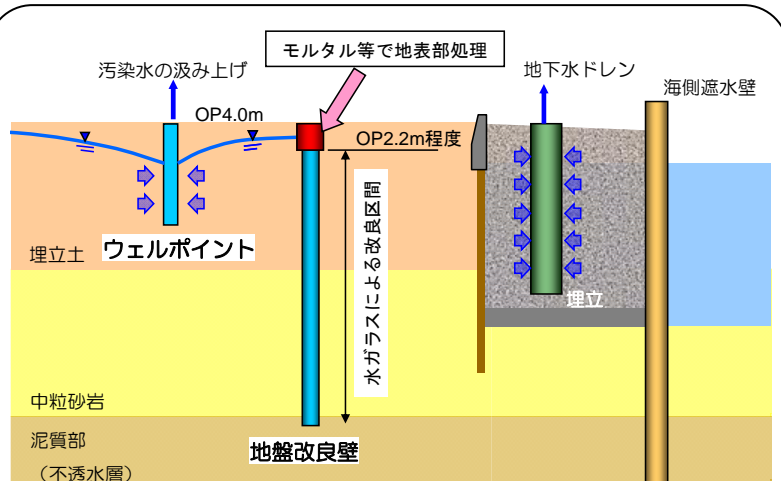


2-3号機間、3-4号機間では、地盤改良壁の天端がOP2.2m程度。地下水の越流を防止するため、1-2号機間と同様に地表部の処理を実施する。

2-3号機間の施工（掘削）にあたっては、当該箇所の地下水位を低下させる必要がある。そのため、10月末より1-2号機間の地下水汲み上げ量を抑制し、2-3号機間の汲み上げ量を増加させることで地下水位を低下させている。

3-4号機間については、2-3号機間の施工（地盤改良壁の地表部処理、ウェルポイント改修工事）に引き続き、年度末までを目途に実施する予定。

# 2,3号機間 地盤改良壁の地表処理の状況

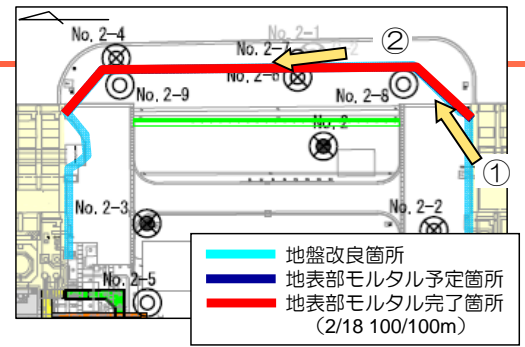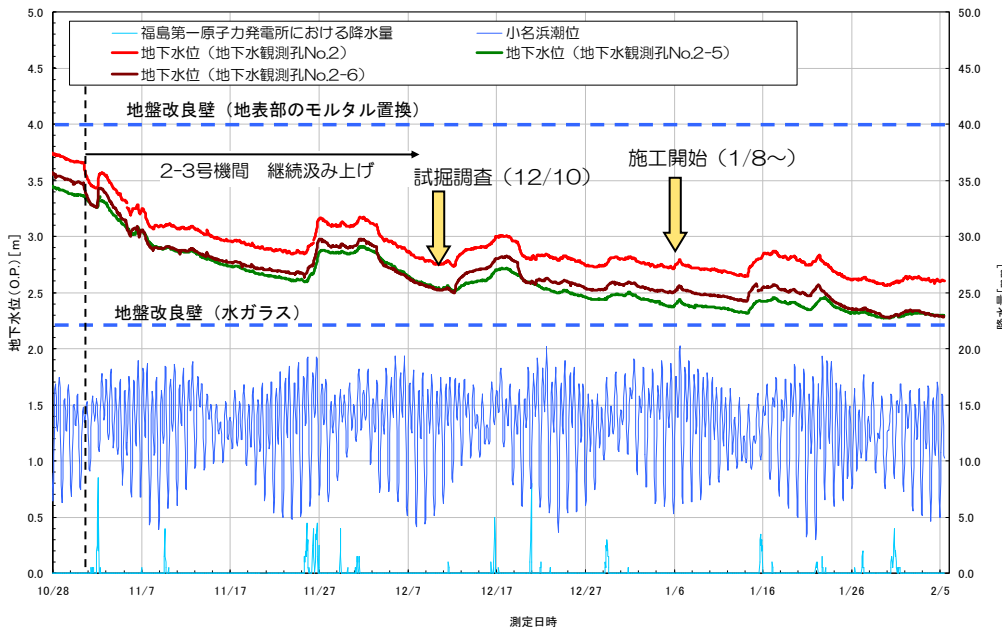

① 地表部処理完了箇所 (H27/1/20)



② 地表部処理完了箇所 (H27/2/19)

2-3号機間の地盤改良壁地表部工事他のため、ウェルポイントを連続汲み上げとして地下水位を低下させている（10月末～）。試掘調査で施工可能性を確認した後、1/8より地表部のモルタル置換を開始し、**2月18日に完了**。

引き続き、3-4号機間の地表部処理の年度末までの完成を目指す。
