


労働環境改善スケジュール

分野	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定												備考		
			2月			3月			4月			5月				6月	
			22	1	8	15	22	29	5	12	下	上	中	下	前	後	
1	防護装備の適正化検討	(実績) ・全面マスク着用を不要とするエリアの拡大計画の検討(1/29公表) ・全面マスク着用を不要とするエリア拡大に向けた連続ダストモニタの設置検討	敷地内線量低減にかかる実施方針を踏まえたタンク群を含む敷地南側エリアの全面マスク着用不要化の検討														
		(予定) ・「敷地内線量低減にかかる実施方針」を踏まえた敷地南側エリアの全面マスク着用不要化の検討(平成25~27年度) ・全面マスク着用を不要とするエリア拡大に向けた連続ダストモニタの設置検討(平成26年度未設置予定) ・エリアⅡ及びⅢへのダストモニタ設置及びダスト確認(平成27年5月全面マスク着用を不要とするエリア設定予定)	全面マスク着用を不要とするエリア拡大に向けた連続ダストモニタの設置検討														
2	重傷災害撲滅、全災害発生件数低減対策の実施	(実績) ・協力企業との情報共有 3/19安全推進協議会開催：作業工程、規制情報の連絡等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等)	情報共有、安全施策の検討・評価														
		(予定) ・3/26安全推進協議会の開催 ・作業毎の安全施策の実施(継続実施)															
3	長期健康管理の実施	(実績) ・H26年度対象者(協力企業作業員)への「がん検査」「甲状腺超音波検査」案内に対する、対象者・医療機関等からの問い合わせ対応、及び検査費用の精算手続き(継続) ・インフルエンザ・ノロウイルス感染予防・拡大防止対策(～H26年度末)インフルエンザ予防接種(10/29～1/30 1F新事務棟、近隣医療機関) ・H26年度対象者(社員)への「甲状腺超音波検査」案内及び検査実施(福島：2/3～19)(本店：3/10～12)	健康相談受付														
		(予定) ・H27年度対象者(社員)への「がん検査」案内(3月中) ・H27年度対象者(協力企業作業員)への「がん検査」「甲状腺超音波検査」案内に向けた準備	H26年度検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き、H27年度検査案内(社員)及び検査案内準備(協力企業作業員) 内容追加														
4	継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室のH27年6月末までの医師確保完了(固定医師1名+0-エコー支援医師)	各医療拠点の体制検討														
		(予定) ・1F救急医療室の恒常的な医師の確保に向けた調整	常勤医師の雇用に向けた関係者との調整														

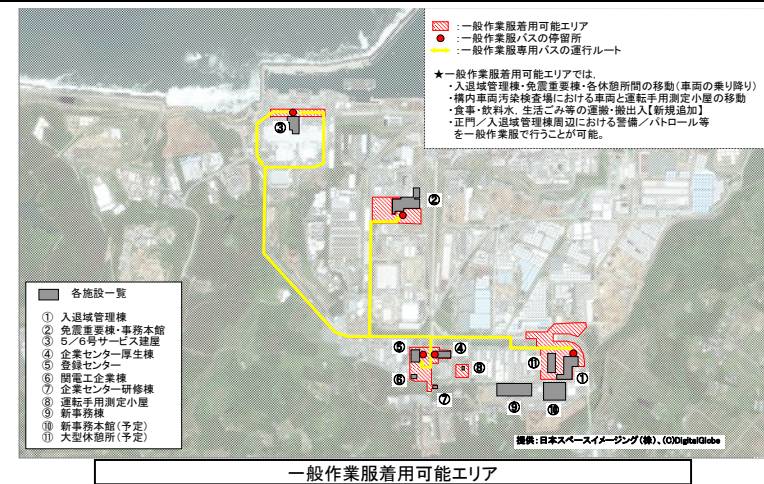

労働環境改善スケジュール

分野 区分	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定												備考				
			2月		3月				4月				5月			6月			
			22	1	8	15	22	29	5	12	下	上	中	下	前	後			
要員管理 労働環境改善	5	作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握 (実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) ・作業員の確保状況(2月実績/4月の予定)と地元雇用率(2月実績)についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況(3月実績/5月の予定)と地元雇用率(3月実績)	検討・設計															作業員の確保状況集約 ▽作業員の確保状況調査依頼	
	6	労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み (実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・作業員へのアンケートによる実態把握(実施中) ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 (予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施) ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施) ・作業員へのアンケートによる実態把握(実施中) ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応	検討・設計															労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施	
			現場作業															協力企業との意見交換会(労働環境) ▽	
	7	大型休憩所の設置 (実績) ・内装工事・設備工事・外構工事他 (予定) ・内装工事・設備工事・外構工事・各種検査	現場作業																安全点検実施による工程見直し
																			各種検査
	8	新事務本館の建設 (実績) ・設計 (予定) ・設計・準備工事・本体工事	検討・設計																
			現場作業																準備工事
																			追加 本体工事
	9	福島給食センターの設置 (実績) ・内装工事・設備工事他 (予定) ・内装工事・設備工事他	現場作業																新事務棟食堂スペースを利用し給食を開始予定 ▽
																			大型休憩所運用開始に合わせて給食を開始予定 ▽
10	道路整備の実施 (実績) ・①Sれあい交差点~五差路間の舗装工事(側溝・歩道整備含む) ・4m盤周辺道路、Gエリア周辺道路については、フェイシング工事にて実施 (予定) ・①Sれあい交差点~五差路間の舗装工事(側溝・歩道整備含む) ・②旧野島の森南側道路周辺の舗装工事(側溝・歩道整備含む) ・③プロセス建屋周辺道路、④5. 6号機周辺道路、⑤旧展望台周辺道路、⑥H5、H6、Cエリア付近道路、⑦中央通りの舗装工事 ・4m盤周辺道路、Gエリア周辺道路については、フェイシング工事にて実施	検討・設計																	
		現場作業																	舗装工事①
																			舗装工事②~⑦
																			4m盤周辺工事
																			Gエリア周辺工事

