


【3号機原子炉建屋上部除染・遮へい工事】

- 2月27日（木）～3月26日（水）主な作業実績
 - ・ R/B上部除染（ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削）
 - ・ SFP内瓦礫撤去
 - ・ 作業ヤード整備

□作業進捗イメージ図

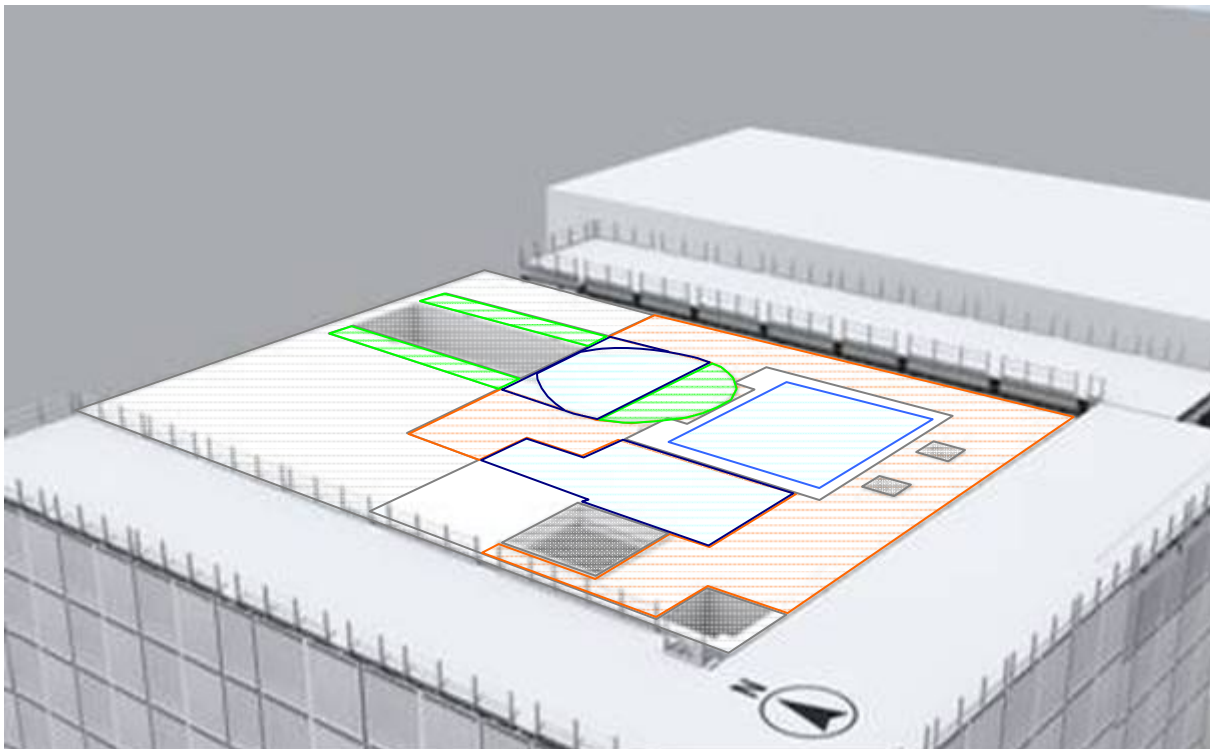

【凡例】

- ☐ 除染対象外 ☐ ガレキ集積 ☐ ガレキ吸引 ☐ 床表層切削 ☐ 遮へい材設置
☐ SFP内ガレキ撤去

※除染・遮へい対策手順：ガレキ集積→ガレキ吸引→床表層切削→遮へい材設置

- 3月27日（木）～4月23日（水）主な作業予定
 - ・ R/B上部除染（ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削）
 - ・ 遮へい材設置
 - ・ SFP内瓦礫撤去
 - ・ 作業ヤード整備
- 備考
 - ・ R/B：原子炉建屋
 - ・ SFP：使用済燃料貯蔵プール
