


労働環境改善スケジュール

分野	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		6月		7月			8月			9月	10月	備考			
			21	28	5	12	19	26	2	9	16	下	上	中		下	日	
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討	(実績) ・全面マスク着用を不要とするエリア拡大に向けた連続ダストモニタの設置 ・地下水バイパス・G/Hタンクエリア周辺の全面マスク着用を不要とするエリア設定(5/28公表、5/29運用開始) ・一般作業服エリア拡大の検討 ・ 使い捨て式防じんマスクの使用に係る意見交換会開催(各企業個別)	検討・設計	21	28	5	12	19	26	2	9	16	下				
			(予定) ・ 使い捨て式防じんマスクの使用に係る意見交換会開催(各企業個別) ・一般作業服エリア拡大の検討	現場作業														
			※ダストフィルタ化: 空気中よう素131濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※全面マスク着用不要化: 空気中放射性物質濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、全面マスク着用を不要とするエリアを設定し、作業員の負荷軽減、作業性向上を図る。 ※一般作業服化: シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗車する場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負荷軽減を図る。															
			【熱中症予防対策の実施】															
労働環境改善	防災安全	2 重傷災害撲滅、全災害発生数の推移	(実績) ・協力企業との情報共有 7/23安全推進協議会開催: 作業工程、規制情報の連絡等 ・作業毎の安全施策の実施(TBM-KY等)	現場作業														
			(予定) ・7/30安全推進協議会の開催 ・作業毎の安全施策の実施(継続実施)															
			重大な災害を踏まえたマネジメントの改善に向けた取り組み【6月までの実績報告】(7月下旬公表) ▽ 情報共有、安全施策の検討・評価															
労働環境改善	健康管理	3 長期健康管理の実施	(実績) ・2014年度対象者(協力企業作業員)への「がん検査」「甲状腺超音波検査」案内に対する、対象者・医療機関等からの問い合わせ対応、及び検査費用の精算手続き(継続)	検討・設計														
			(予定) ・2015年度対象者(協力企業作業員)への「がん検査」「甲状腺超音波検査」案内に向けた準備及び案内状送付 ・ 検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き	現場作業														
			健康相談受付															
			2015年度検査案内準備(協力企業作業員) 検査案内準備期間の見直しによる工程変更 案内状送付 【検査受診期間】 問い合わせ対応及び検査費用精算手続き															新規
労働環境改善	健康管理	4 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化	(実績) ・1F救急医療室の2015年9月末までの医師確保完了(固定医師1名+0-7-730支援医師)	検討・設計														
			(予定) ・1F救急医療室の10月~1月中旬の勤務医師調整	現場作業														
			各医療拠点の体制検討															
			1F救急医療室の9月末までの医師確保完了 1F救急医療室の10月~1月中旬の勤務医師調整															



分類 活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		6月				7月				8月				9月		10月		備考
		21	28	5	12	19	26	2	9	16	下	上	中	下	日	月				
要員管理、労働環境改善	5 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) ・作業員の確保状況(6月実績/8月の予定)と地元雇用率(6月実績)についての調査・集計 (予定) ・作業員の確保状況(7月実績/9月の予定)と地元雇用率(7月実績)についての調査・集計	▼作業員の確保状況集約 ▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況(6月実績/8月予定)と地元雇用率(6月実績)の実態把握				▼作業員の確保状況集約 ▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況(7月実績/9月予定)と地元雇用率(7月実績)の実態把握				▼作業員の確保状況集約 ▼作業員の確保状況調査依頼 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握									
	6 労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・作業員へのアンケートによる実態把握(実施中) ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 (予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施) ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施) ・作業員へのアンケートによる実態把握(実施中) ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施				労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施				労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施									
	7 大型休憩所の設置	(実績) ・運用開始(5/31) ・食堂(3F)の運用開始(6/1) ・食堂の運用中断(6/9~6/23)⇒新事務棟食堂の利用時間を拡大し対応 ・食堂(3F)の運用一時再開(6/24~6/27) ・食堂天井改修(3F)工事(6/28完了) ・食堂の運用中断(6/29~8/1予定)⇒新事務棟食堂の利用時間を拡大し対応 ・搬入口設置工事 ・搬入口設置工事の設計 ・食堂化改修(2F)本工事の設計 ・搬入口設置本工事の設計 (予定) ・搬入口設置工事 ・食堂(3F)の運用再開(8/3予定) ・食堂化改修(2F)本工事の設計 ・食堂化改修(2F)本工事 ・搬入口設置本工事の設計 ・搬入口設置本工事	搬入口設置工事の設計 食堂化改修本工事の設計 搬入口設置本工事の設計 一時再開(6/24)▼食堂の運用 搬入口設置工事 食堂天井改修工事				搬入口設置工事の設計 食堂化改修本工事の設計 搬入口設置本工事の設計 搬入口設置工事 食堂天井改修工事				搬入口設置工事の設計 食堂化改修本工事の設計 搬入口設置本工事の設計 搬入口設置工事 食堂天井改修工事								2015年5月15日 建物完了	
	8 新事務本館の建設	(実績) ・設計、準備工事 ・本体工事 ・杭工事 (予定) ・本体工事 ・杭工事 ・掘削工事 ・基礎工事	杭工事				掘削工事				基礎工事								2016年8月 完了目標	
	9 道路整備の実施	(実績) ・4m壁周辺道路は、フェニックス工事に整備完了 ・①ふれあい交差点~五差路間の舗装工事(側溝・歩道整備含む) ・②旧野鳥の森南側道路周辺の舗装工事(側溝・歩道整備含む) ・③プロセス建屋周辺道路、④5、6号機周辺道路、 ・⑤H5、H6、Cエリア付近道路、⑦中央通りの舗装工事 ・⑧5、6号機~土捨場南道路 ・Gエリア周辺道路、⑤旧展望台周辺道路は、フェニックス工事の進捗と併せ整備 (予定) ・⑨土捨場周辺道路工事、⑩Jエリア周辺道路工事 ・⑪車両整備場周辺道路工事(道路基礎部・路盤工・舗装)	⑪車両整備場周辺道路工事(道路基礎部・路盤工・舗装)の検討・設計				⑪車両整備場周辺道路工事(道路基礎部・路盤工・舗装)の検討・設計				⑨土捨場周辺道路工事・⑩Jエリア周辺道路工事の検討・設計									

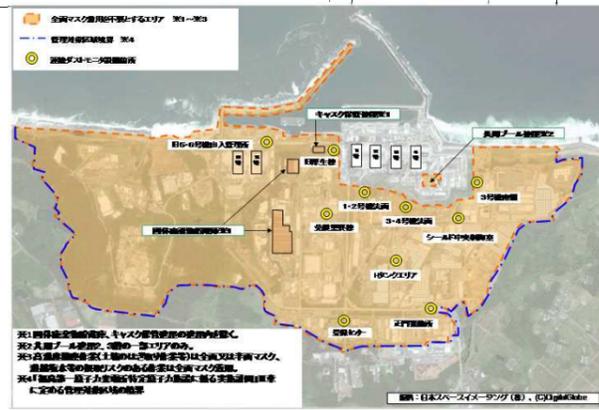
