


港湾の海底土被覆等の状況 魚介類対策実施状況

2015年11月26日

東京電力株式会社



1. 港湾の状況(港湾内海底土被覆工事の進捗)

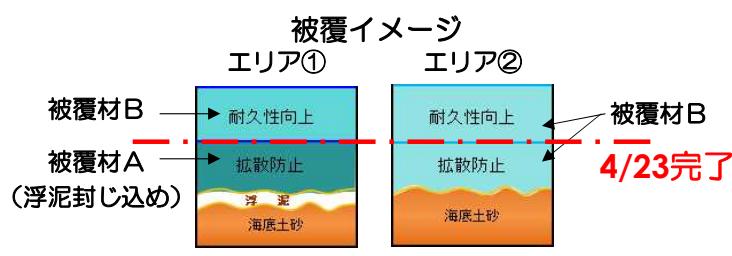



- 4月23日に港湾内全域の被覆（拡散防止）が完了
- 6月23日からエリア①の2層目の追加被覆を開始
- 9月5日から北防波堤の魚類対策工の被覆を開始
- 10月19日に北防波堤の魚類対策工の被覆を完了
- 10月22日からエリア①の2層目の追加被覆を再開

11月18日現在

66.0%完了

凡例

■ エリア①、北防波堤
被覆完了箇所

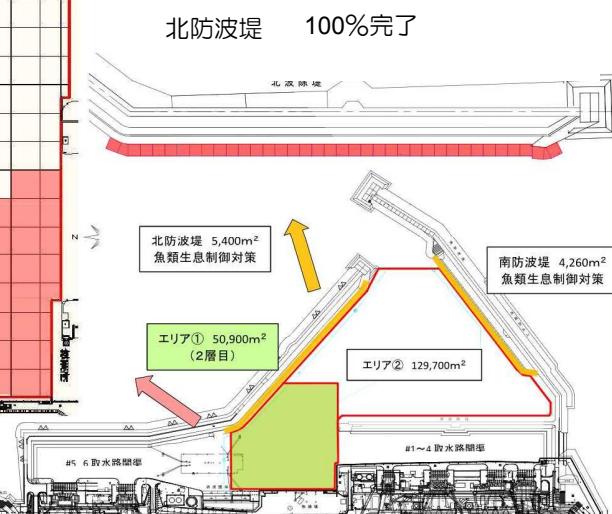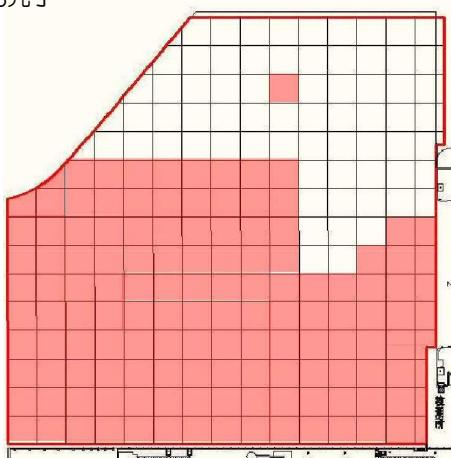

2. 工程

◆ 概略工程

項目	2015年度			2016年度			備考
	7	10	1	4	7	10	
北防波堤	材料試験 根固石被覆						
南防波堤	基部補修・石材充填	網設置	根固石被覆				
東波除堤前面	網手配	網設置			網設置		
東波除堤開渠側	エリア①	エリア①		エリア②		エリア②	
海底土被覆	エリア①			エリア②			エリア②の2層目の範囲については検討中。

※工程は波の状況、他工事との干渉により変動する。

◆ 施工概要

- 北防波堤は施工時の魚類の移動を防ぐため、現状の魚類移動防止網を設置した状態で根固石の被覆を実施済み。
- 南防波堤は透過防止工欠損箇所の石材補充が完了し次第、速やかに施工時の魚類の移動を防ぐための魚類移動防止網等を設置し、根固石の被覆を実施する。
- 移動防止網のある北防波堤から施工し、移動防止網の準備が整い次第他の防波堤等の施工を行う。



3-1. 港湾魚類対策の現状(1/2)

1. 港湾魚対策の現状(1/2)

- ①港口からの魚出入り抑制のため、次の対策を実施中
港湾内の底刺網、かご網の設置 / ブロックフェンス設置 / 港湾口の底刺網の2重化
- ②防波堤沿いの魚移動防止のため、『魚類移動防止網』を設置※
- ③物揚場前中空三角ブロック周辺からの魚出入り抑制のため、シルトフェンス、底刺し網を設置
- ④魚類の汚染抑制のため、港湾内海底土被覆(1層目完了)

※東波除堤、南防波堤の魚類移動防止網は、海底土被覆工事のため、一時的に撤去

[東波除堤 : 2014.10.29~
南防波堤 : 2014.3.26~]

表 港湾口底刺し網の対策強化(2015年7月27日より実施中)

	強化前			強化後			強化の目的
	網丈	網の目合 い	網糸の 太さ	網丈	網の目合い	網糸の 太さ	
外側	1.5m カレイ 網	5寸 (約 15cm)	細	4.0m スズキ網	4.5寸 (約14cm)	太	港湾への魚侵入 ブロック
				1.5m カレイ網	3.6寸 (約11cm)	細	更なる小魚の捕獲



3-2. 港湾魚類対策の現状(2/2)

1. 港湾魚対策の現状 (2/2)



【港湾内底刺し網の目合い変更試験】

○港湾内のアイナメ捕獲強化を目的として、底刺し網の目合いを3. 6寸から3寸に変更
(← 網の調達等の準備が整い次第実施予定 (12月中旬開始目途))



東京電力

3-3. 港湾での単位漁具当たり魚類捕獲数

図 1F港湾における単位漁具当たり魚類捕獲数(かご漁)


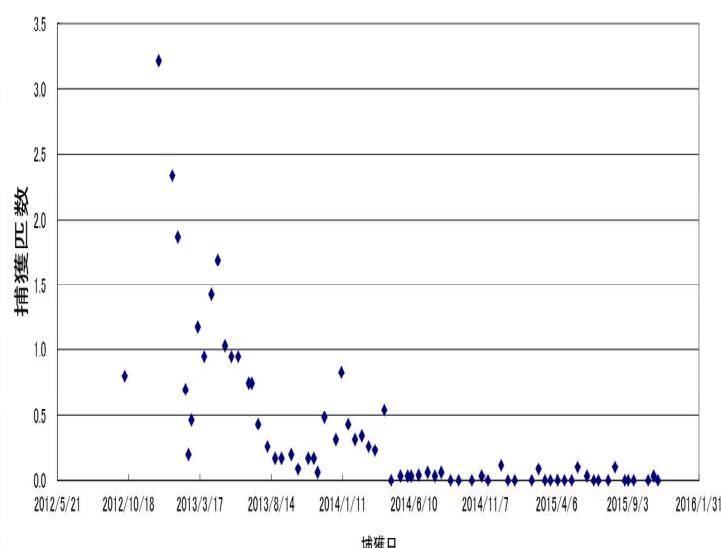


図 1F港湾における単位漁具当たり魚類数(刺し網漁)



東京電力

3-4. 魚種別の重量の経時変化

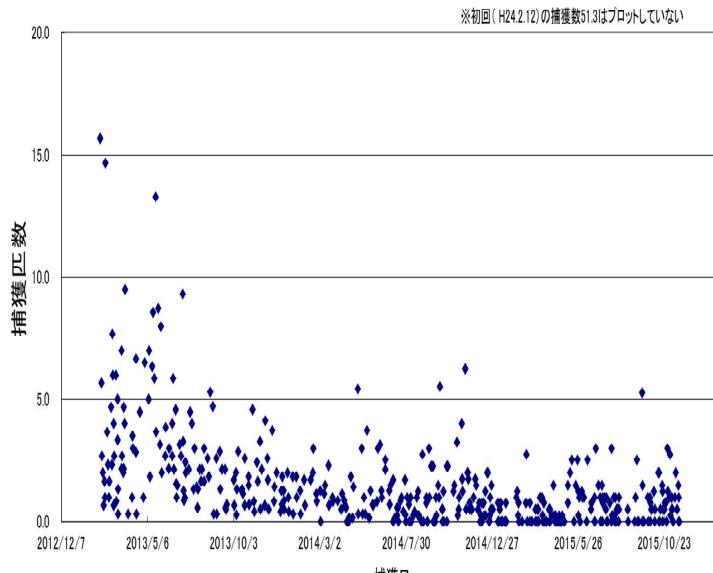
