

港湾の海底土被覆等の状況 魚介類対策実施状況


2015年12月24日

東京電力株式会社




東京電力

1. 港湾の状況(港湾内海底土被覆工事の進捗)

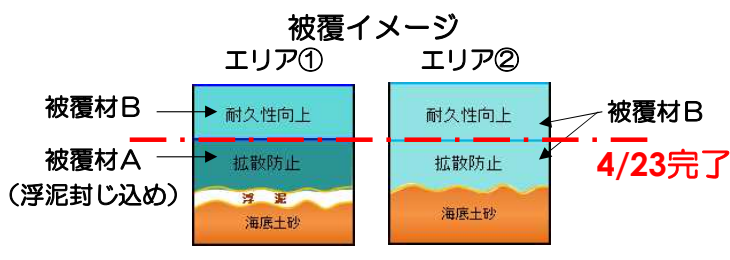

- 4月23日に港湾内全域の被覆（拡散防止）が完了
- 6月23日からエリア①の2層目の追加被覆を開始
- 9月5日から北防波堤の魚類対策工の被覆を開始
- 10月19日に北防波堤の魚類対策工の被覆を完了
- 10月22日からエリア①の2層目の追加被覆を再開

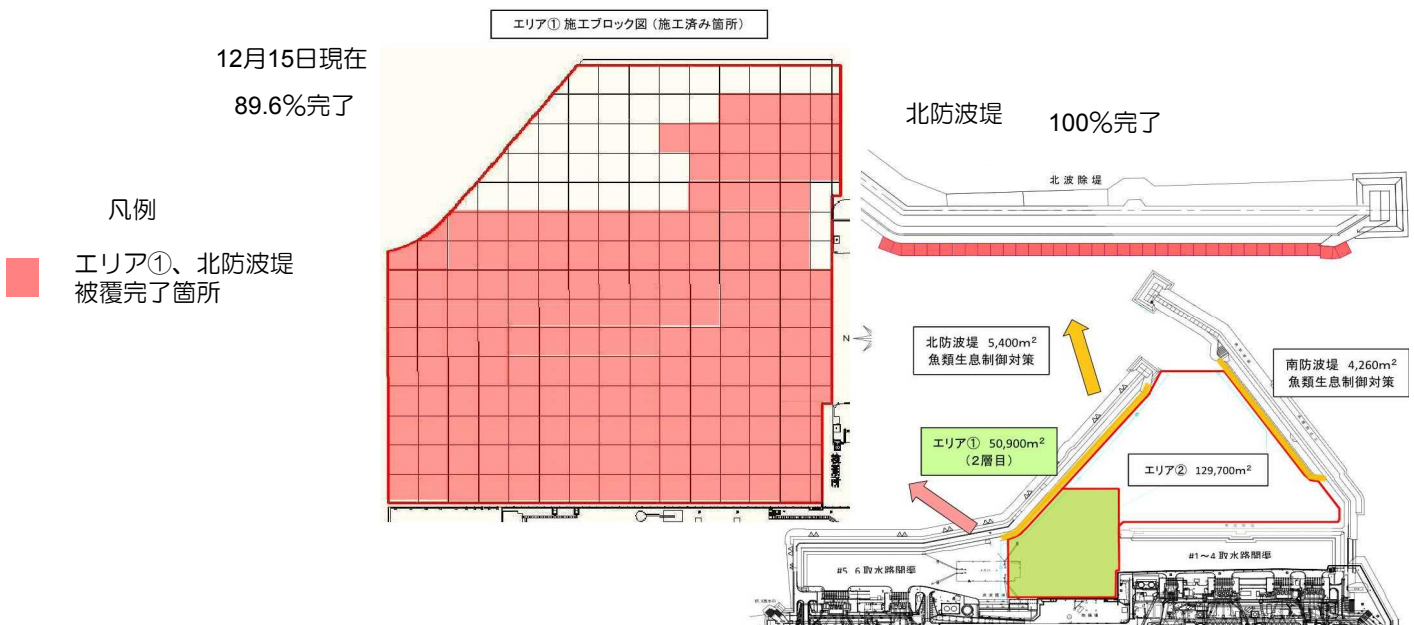

2. 工程

◆ 概略工程

項目	2015年度			2016年度			備考
	7	10	1	4	7	10	
北防波堤	材料試験	根固石被覆					エリア② の2層目 の範囲に ついては 検討中。
南防波堤		基部補修・石材充填	網設置 根固石被覆				
東波除堤前面				網設置			
東波除堤開渠側		網手配		網設置			
海底土被覆	エリア①	エリア①	エリア②		エリア②		

※工程は波の状況、他工事との干渉により変動する。

◆ 施工概要

- 北防波堤は施工時の魚類の移動を防ぐため、現状の魚類移動防止網を設置した状態で根固石の被覆を実施済み。
- 南防波堤は透過防止工欠損箇所の石材補充が完了し次第、速やかに施工時の魚類の移動を防ぐための魚類移動防止網等を設置し、根固石の被覆を実施する。
- 移動防止網のある北防波堤から施工し、移動防止網の準備が整い次第他の防波堤等の施工を行う。

