


港湾内海底土被覆工事の実施状況

2015年4月30日

東京電力株式会社



福島第一原子力発電所港湾内海底土被覆工事の実施状況

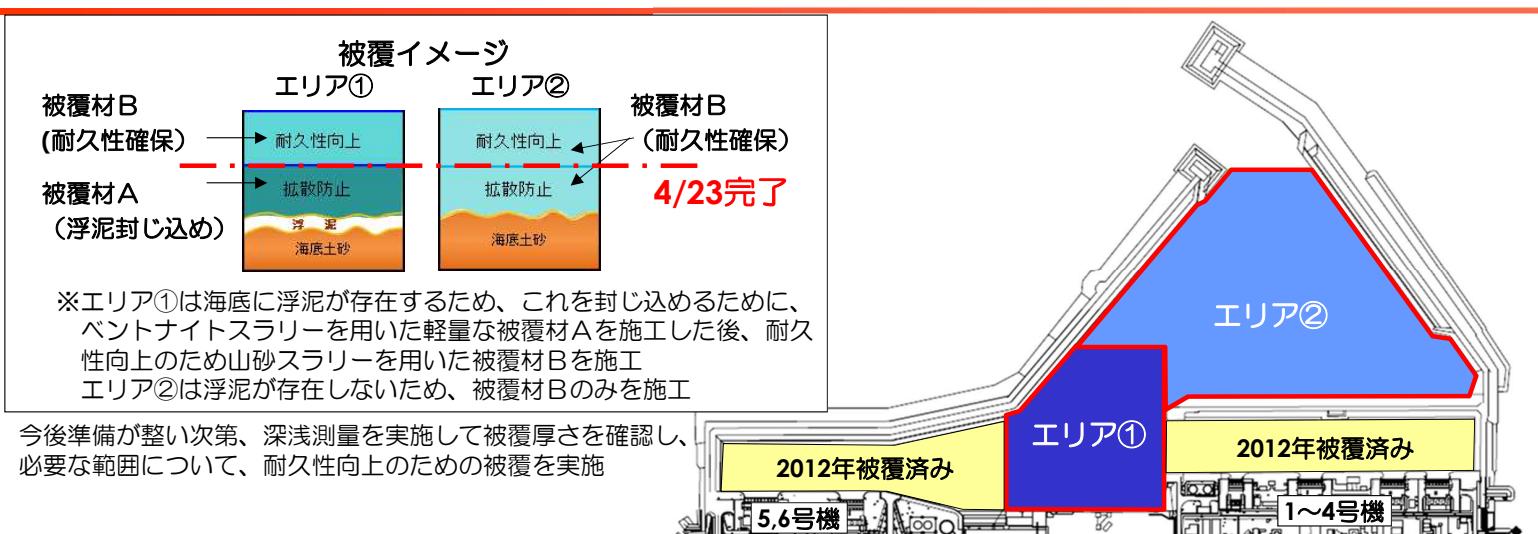

| 施工エリア | 施工面積 (m ²) | 打設量 (m ³) | 開始日 | 完了日 |
|-------|------------------------|-----------------------|------------|------------|
| エリア① | 50,900 | 10,700 | 2014.07.17 | 2014.10.03 |
| エリア② | 129,700 | 21,800 | 2014.12.14 | 2015.04.23 |
| 合計 | 180,600 | 32,500 | 2014.07.17 | 2015.04.23 |

打設量は暫定値であり今後変更となる場合がある

＜参考＞取水口前面における被覆実績

(1~4号機側) 被覆面積：約34,000m², 施工期間：H24.3.14～5.11

(5,6号機側) 被覆面積：約38,600m², 施工期間：H24.5.16～7.05

※取水路開渠は浮泥が存在したため、ベントナイトスラリーを用いた被覆材を使用し、2層被覆した
