


【3号機原子炉建屋上部除染・遮へい工事】

- 4月29日（水）～5月27日（水）主な作業実績
 - ・ R/B 上部除染（ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削）
 - ・ 飛散防止剤散布
 - ・ 作業ヤード整備

□ 作業進捗イメージ図

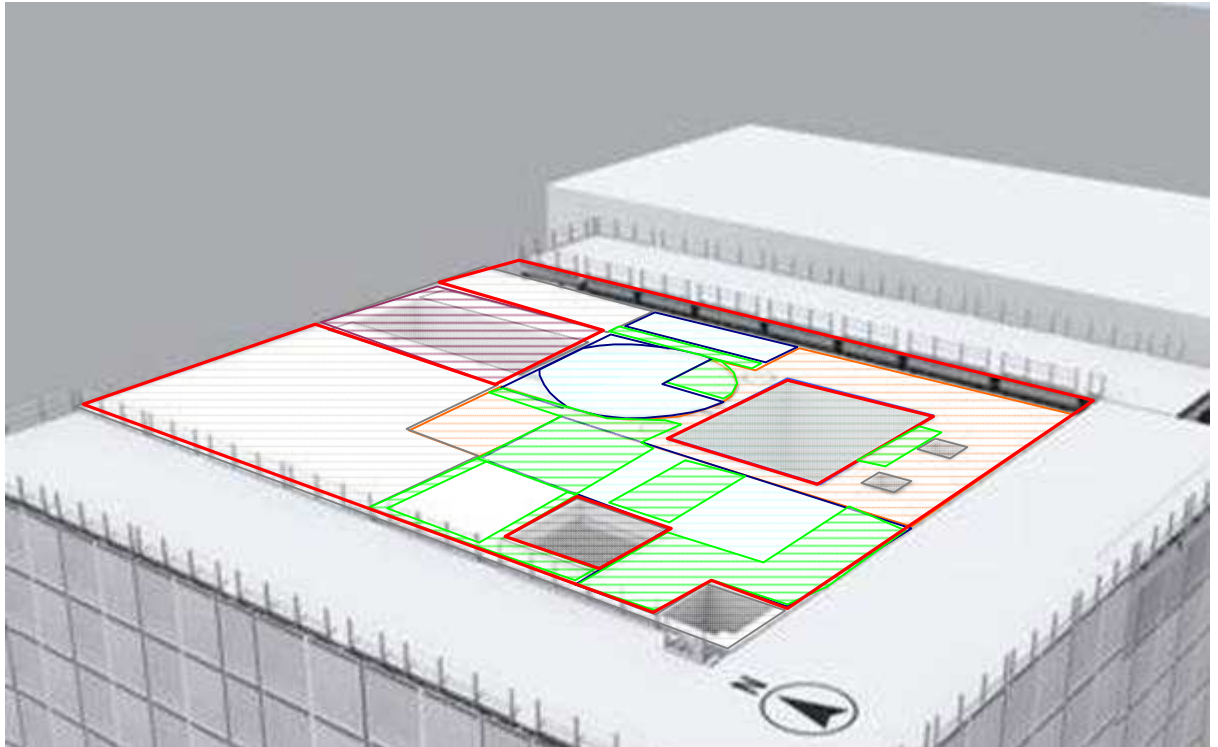

【凡例】

- | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-------|--------|
| 除染対象外 | ガレキ集積 | ガレキ吸引 | 床表層切削 | 遮へい材設置 |
| SFP内ガレキ撤去 | 追加飛散防止剤散布 | | | |

※除染・遮へい対策手順：ガレキ集積→ガレキ吸引→床表層切削→遮へい材設置

- 5月28日（木）～6月24日（水）主な作業予定
 - ・ R/B 上部除染（ガレキ集積、ガレキ吸引、床表層切削）
 - ・ 飛散防止剤散布
 - ・ 作業ヤード整備

■ 備考

- ・ R/B：原子炉建屋
- ・ SFP：使用済燃料貯蔵プール
- ・ 飛散防止剤散布：当該月の作業進捗に合わせた追加散布（作業前、作業後）及び定期散布のエリアのみを記載

以上
