


1. タンクエリア図

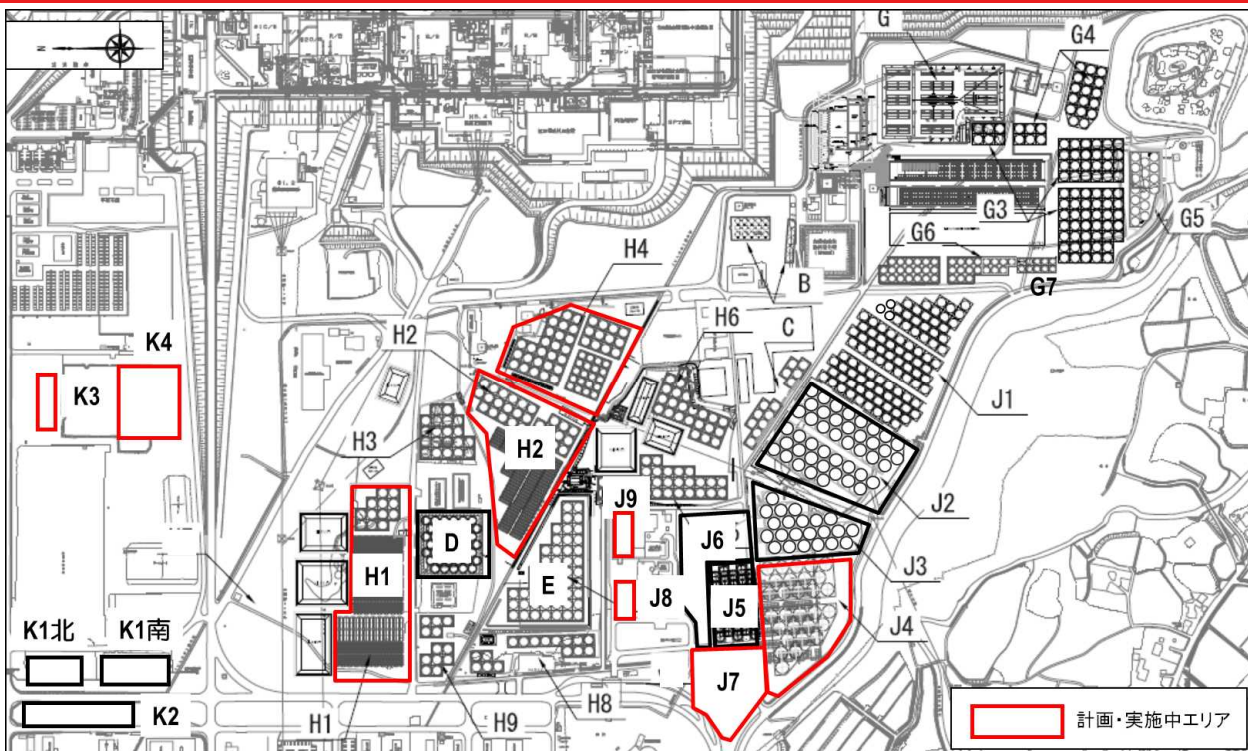

2-1 タンク工程(新設分)

		2015年度						2016年度						16.4の覚込 /計画基数						
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	3月
J7 現地溶接型	3月30日進捗見込	タンク						太数字:タンク容量(単位:千m3)												
	基数	6.0	4.8	13.2	8.4	8.4	0.0	4.8												
	4月26日進捗見込	5	4	11	7	7	0	4												
	基数	6.0	4.8	13.2	7.2	9.6	0.0	4.8												
J8エリア 現地溶接型	3月30日進捗見込	地盤改良・基礎設置						タンク								42基/42基				
	基数							4.9	1.4											
	4月26日進捗見込							7	2											
	基数							4.9	1.4											
J9エリア 現地溶接型	3月30日進捗見込	地盤改良・基礎設置						タンク				2.1		2.1		2.1		2.1		
	基数											3		3		3		3		
	4月26日進捗見込 (概略)											2.1		2.1		2.1		2.1		
	基数											3		3		3		3		7基/9基
K3 完成型	3月30日進捗見込	地盤改良・基礎設置						タンク												
	基数							2.8	2.8	2.8										
	4月26日進捗見込							4	4	4										
	基数							2.8	2.8	2.8										
K4 完成型	3月30日進捗見込	地盤改良・基礎設置						タンク												
	基数							10.0								10.0	5.0			
	4月26日進捗見込 (概略)							10								10	5			
	基数							10.0								10.0	5.0	基/35基		

2-2 タンク工程(リプレース分)

		2015年度			2016年度												16.4の見込 /計画基数				
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月	4月以降
H1ブルータンクエリア 完成型	3月30日進捗見込	タンク撤去・地盤改良・基礎設置			5.0	15.0	8.0	太数字:タンク容量(単位:千m3)													
	既設除却																				
	4月26日進捗見込				4	12	8														
	既設除却				5.0	10.0	15.0														
H1東フランジタンクエリア 完成型	3月30日進捗見込	地盤改良・基礎設置			4	8	12	フランジタンクエリアのタンク開発量は、 上記ブルータンクエリアに計上												67基/87基	
	既設除却	残水・撤去																			
	4月26日進捗見込																				
	既設除却																				
リプレース タンク	H2ブルータンクエリア 現地溶接型	3月30日進捗見込	地盤改良・基礎設置			残水・撤去			タンク			2.4	7.2	12.0	2.4	9.6	4.8	12.0	9.6	45.6	
		既設除却	▲ 10																		
		4月26日進捗見込 (概略)							2.4	7.2	12.0	2.4	9.6	4.8	12.0	9.6	45.6				
		既設除却							1	3	5	1	4	2	5	4	19				
		既設除却																			基/44基
		既設除却																			
H2フランジタンクエリア 現地溶接型	3月30日進捗見込	残水・撤去			地盤改良・基礎設置																
	既設除却																				
	4月26日見直																				
	既設除却																				
H4エリア 完成型	3月30日進捗見込	残水・撤去			地盤改良・基礎設置												10.0	20.0			
	既設除却	タンク																			
	4月26日進捗見込 (概略)	▲ 22 ▲ 26															12.0	24.0			
	既設除却	▲ 22 ▲ 26															10	20			

3. タンク建設進捗状況

エリア	全体状況	完成数(本日現在)
J7	全量完成	現地溶接型 42基/42基
J8	全量完成	現地溶接型 9基/9基
J9	旧技術訓練棟を撤去後、700m3の現地溶接型タンク、12基を設置する予定	
K3	タンク設置中 ・5/26時点(検査済 4基/12基) 高性能多核種除去装置の北側エリアに700m ³ 級、12基の工場完成型タンクを設置する計画	工場完成型 8基/12基
K4	多核種除去装置エリアにおいて、1,000m ³ 、35基の工場完成型タンクを設置する予定。 地盤改良中	
H1	現在、タンク設置中 ・5/26時点(検査済 71基/87基)	71基/87基
H2	2015/5/27フランジタンク解体着手。2015/10/1ブルータンク撤去認可。現在、タンク基礎撤去、地盤改良、基礎構築中	
H4	2016/12/14にフランジタンク撤去認可。フランジタンク解体中	
