


【3号機原子炉建屋上部除染・遮へい工事】

■ 4月28日（木）～5月25日（水）主な作業実績

- ・ R/B 上部新燃料貯蔵庫ハッチ蓋撤去
- ・ R/B 上部除染（新燃料貯蔵庫小ガレキ集積、小ガレキ吸引）
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ 作業ヤード整備

□ 作業進捗イメージ図

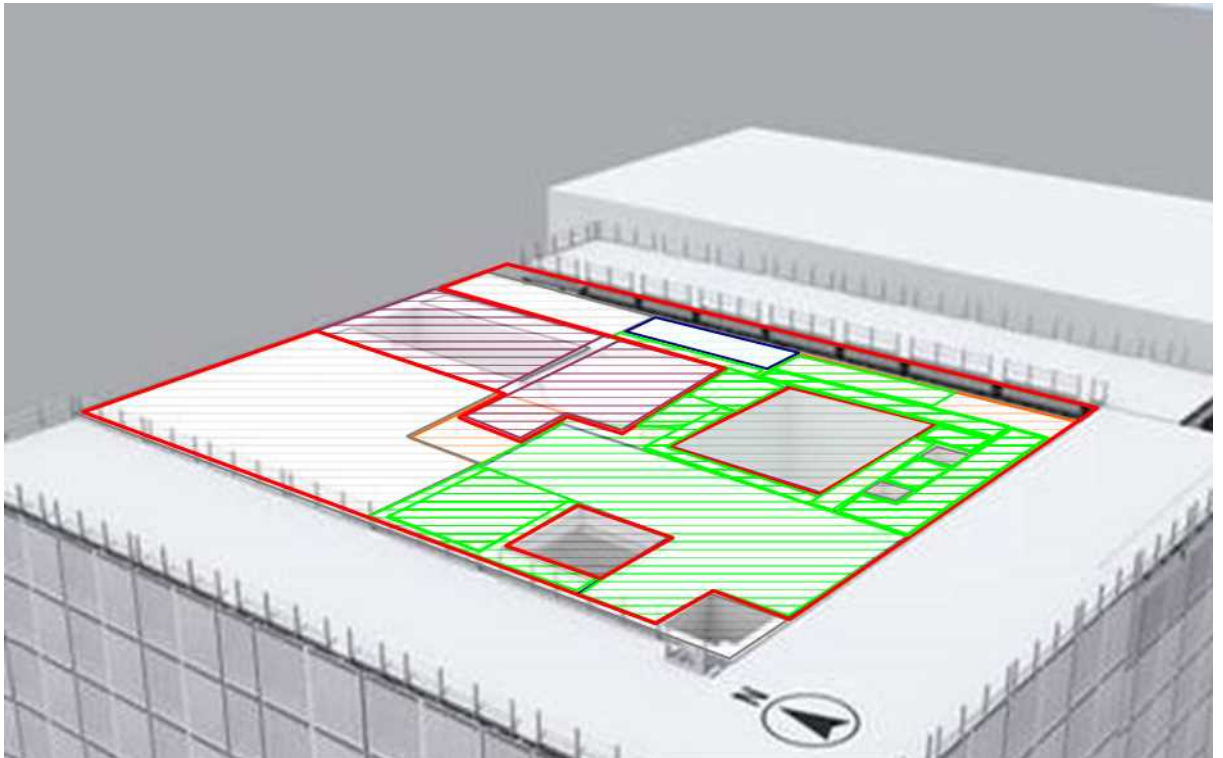

【凡例】

- 除染対象外 ガレキ集積 ガレキ吸引 床表層切削 遮へい材設置
SFP内ガレキ撤去 追加飛散防止剤散布

※除染・遮へい対策手順：ガレキ集積→ガレキ吸引→床表層切削→遮へい材設置

■ 5月26日（木）～6月29日（水）主な作業予定

- ・ R/B 上部新燃料貯蔵庫グレーチング撤去
- ・ R/B 上部除染（新燃料貯蔵庫小ガレキ集積、小ガレキ吸引）
- ・ 飛散防止剤散布
- ・ 作業ヤード整備

■ 備考

- ・ R/B：原子炉建屋
- ・ SFP：使用済燃料貯蔵プール
- ・ 飛散防止剤散布：当該月の作業進捗に合わせた追加散布（作業前、作業後）及び定期散布のエリアのみを記載

以 上
