


### 3号機原子炉建屋オペフロ遮へい体設置工事

#### ■ 7月の主な作業実績

- 2016年7月13日～同年7月25日 B工区遮へい体設置
- 2016年7月11日～ C工区遮へい体設置
- 2016年7月27日～ D工区遮へい体設置

#### ■ 8月の主な作業予定

- 2016年8月上旬 A工区第Ⅱ期、C工区、D工区遮へい体設置完了
- 2016年8月下旬 G工区遮へい体設置開始

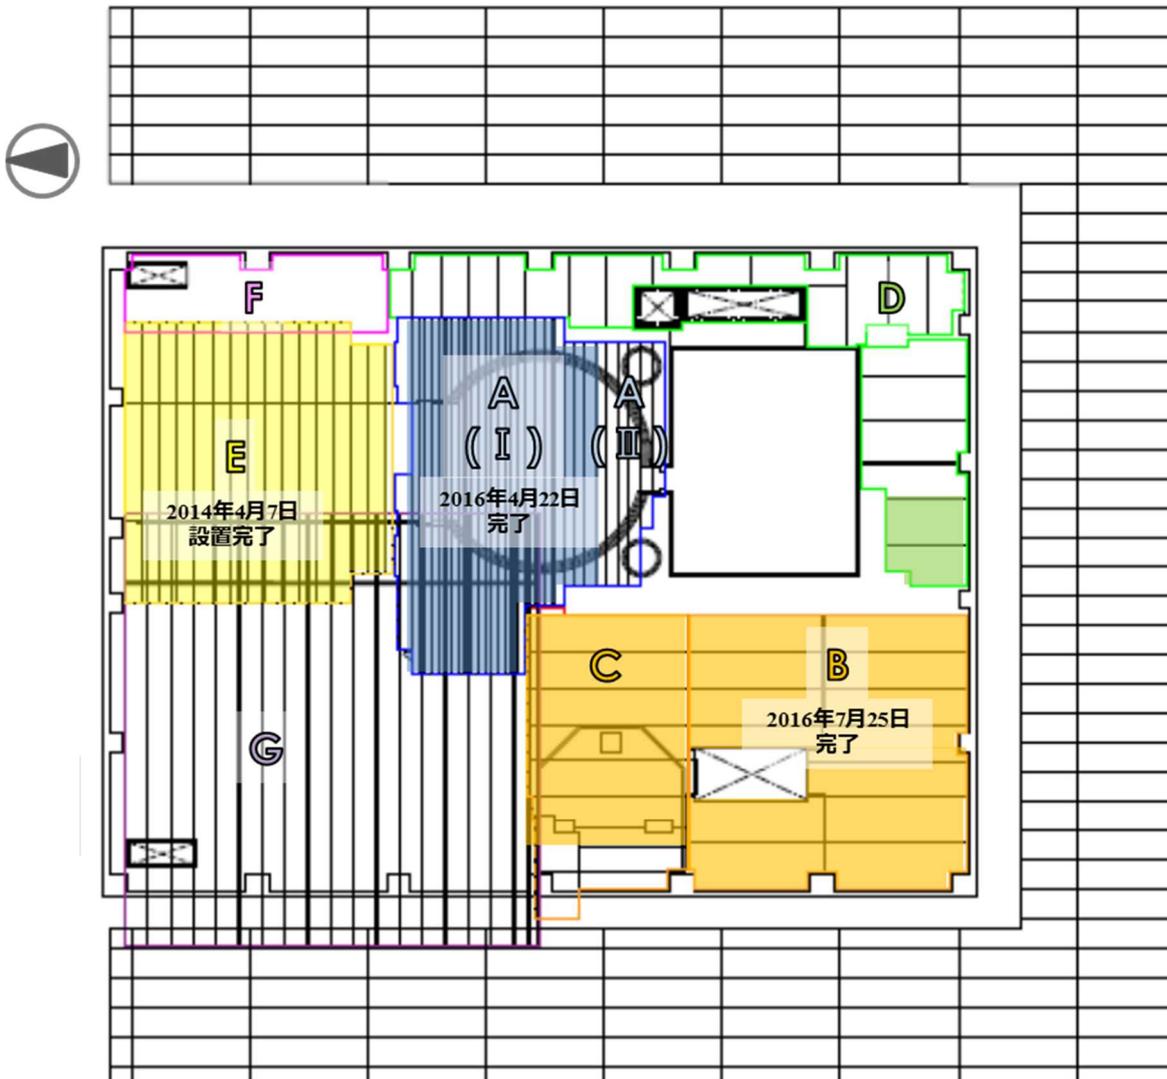

3号機原子炉建屋オペフロ遮へい体設置状況

(2016年7月27日時点)

以上
