

【1号機原子炉建屋カバー解体工事】

■ 7月28日（木）～8月24日（水）の主な作業実績

- ・ 資機材整備
- ・ 飛散防止剤の定期散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ オペフロ小ガレキ吸引（支障物撤去含む）
- ・ 壁パネル取り外し前の飛散防止剤散布


□ 今月



全景(北西面)

撮影：H28.8.11

□ 作業進捗

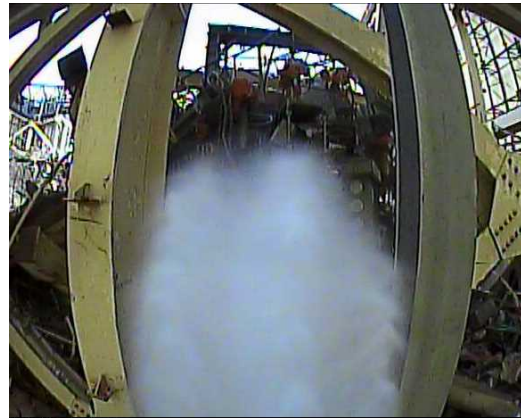

壁パネル取り外し前の飛散防止剤散布状況

撮影：H28.8.4

■ 8月25日（木）～9月28日（水）の主な作業予定

- ・ 飛散防止剤散布の定期散布
- ・ 壁パネル取り外し前飛散防止剤散布
- ・ ダストサンプリング
- ・ 壁パネル取り外し
- ・ オペフロ調査

■ 備考

- ・ なし

以 上
