


3号機原子炉建屋オペフロ遮へい体設置工事

■ 10月の主な作業実績

- 補完遮へい体および構台間遮へい体等設置

■ 11月の主な作業予定

- F工区遮へい体設置 (10/28~11/月上旬)
- 補完遮へい体および構台間遮へい体等設置

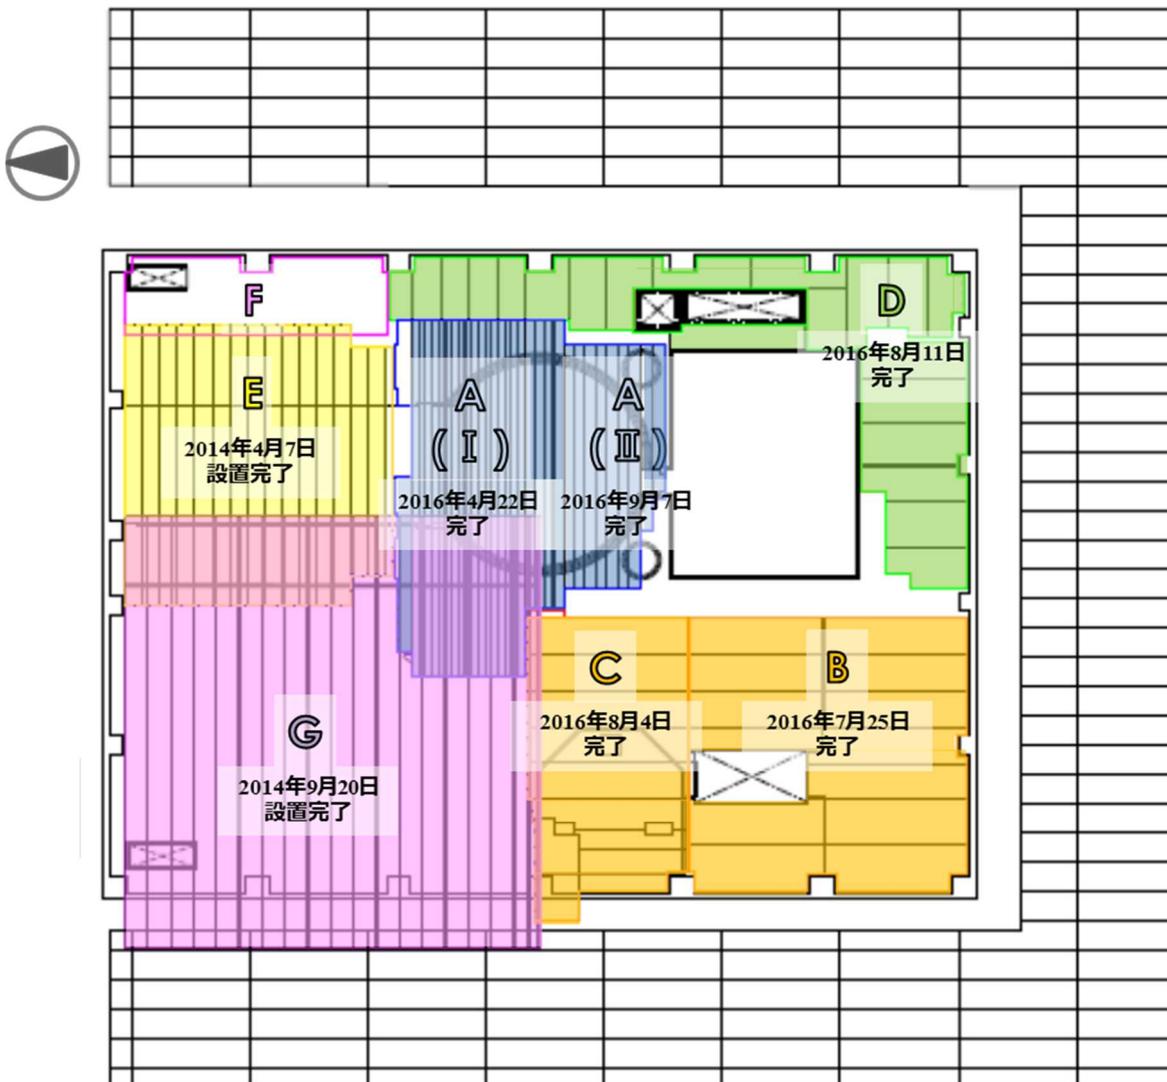

3号機原子炉建屋オペフロ遮へい体設置状況

(2016年10月26日時点)

以 上
