

2号機PCV内部調査にむけた X-6ペネ穴あけ及び今後の予定について

2016年11月24日

IRID TEPCO

【報告事項】

■ X-6ペネ穴あけと今後の予定について

技術研究組合 国際廃炉研究開発機構 (IRID)
東京電力ホールディングス株式会社


©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

1. 2号機原子炉格納容器(PCV)の状況について

IRID TEPCO

- 2011年3月11日の震災の影響により、原子炉圧力容器(RPV)内の核燃料が気中に露出し、溶融した。
 - 事故進展解析の結果、溶融した核燃料の一部がペデスタル内に落下している可能性があることが判明している。
- ↓
- 燃料デブリを取出すためには、原子炉格納容器内(PCV)の調査を実施し、デブリ及び周辺構造物の状況を把握することが必要。

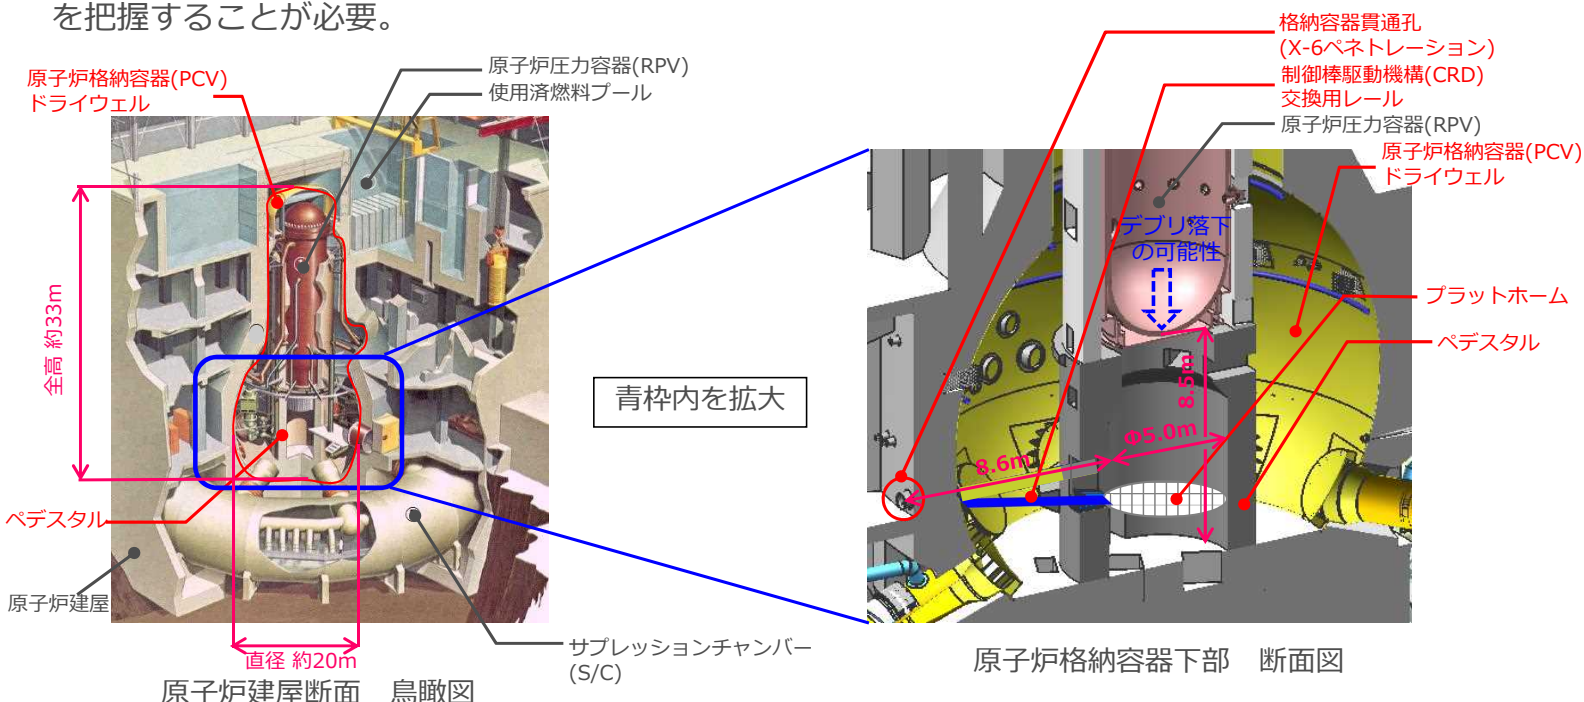


©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

2. 原子炉格納容器(PCV)内部調査の概要について

- 【調査目的】: ①ペDESTAL内次回調査装置への設計・開発フィードバック情報(プラットフォームの変形有無等)を取得する。
②ペDESTAL内プラットフォーム上及び制御棒駆動機構(CRD)ハウジングへのデブリ落下状況, 及びペDESTAL内構造物の状況を確認する。
- 【調査部位】: ペDESTAL内プラットフォーム上から下記部位の調査を実施(プラットフォーム、制御棒駆動機構等)



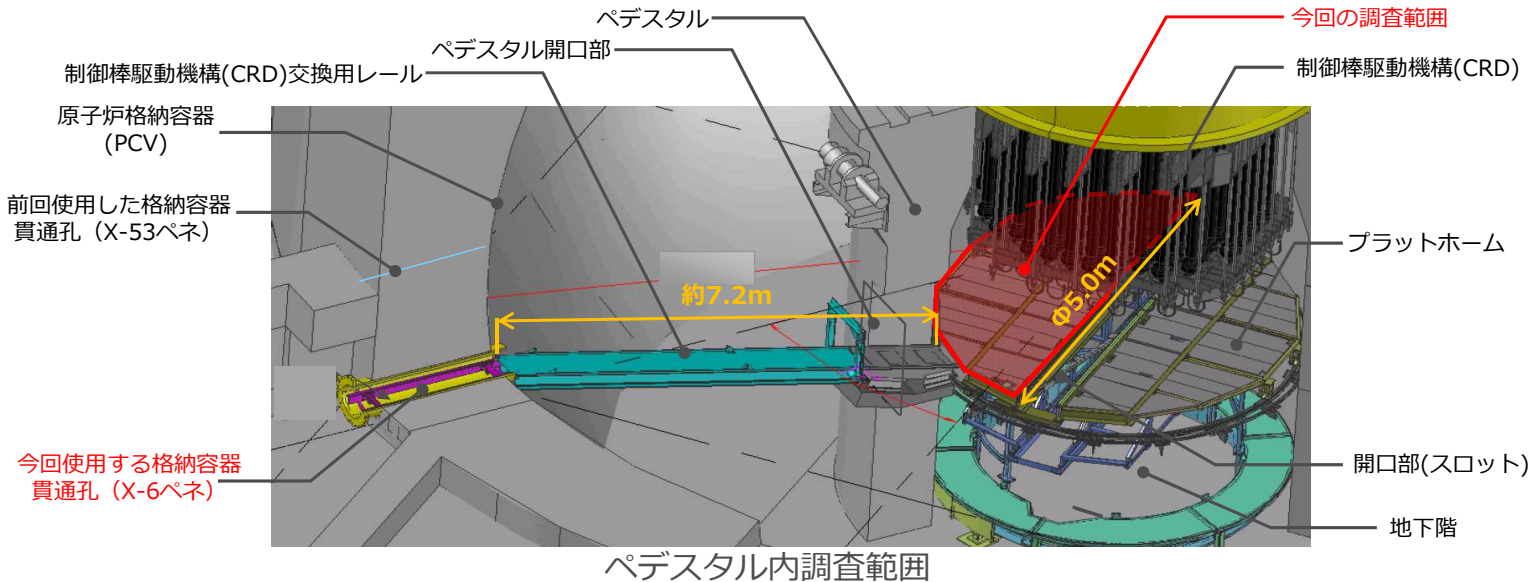


3. PCV内部調査にむけた作業ステップ

ステップ1. 装置の搬入

ステップ2. 装置の設置

ステップ3. 穴あけ

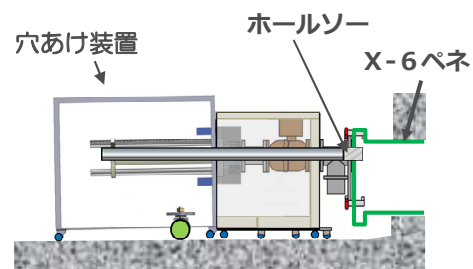
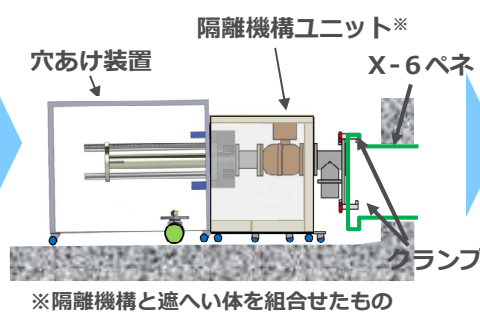



ステップ4. 事前確認用ガイドパイプによるX-6ペネ内、CRDレール事前調査


ステップ5. ガイドパイプによるペDESTAL内事前調査

ステップ6. 堆積物除去装置の投入※ ※堆積物の状況により実施しない可能性あり

ステップ7. 自走式調査装置による内部調査

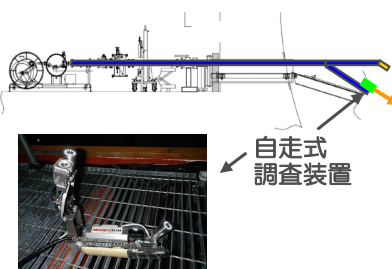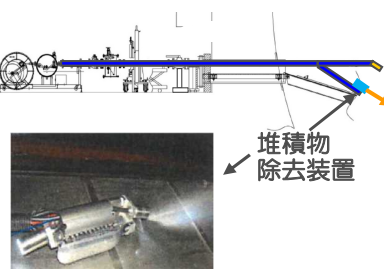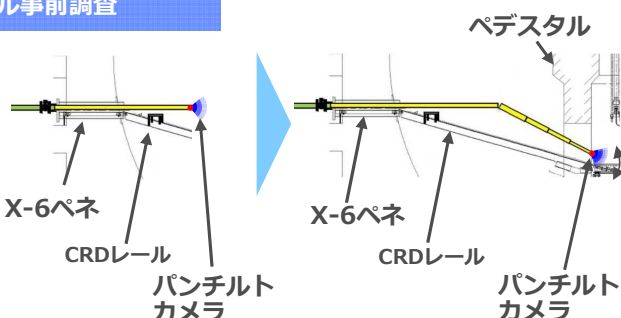

- 穴あけに使用する隔離機構ユニット及び穴あけ装置の製作は完了しており、現在習熟訓練中。

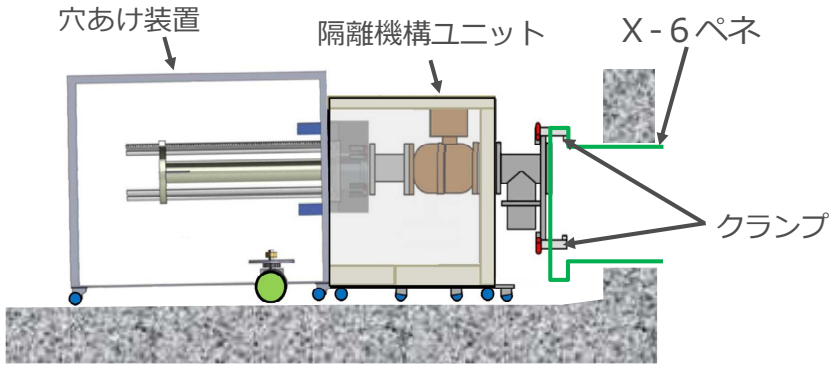

隔離機構ユニット及び穴あけ装置を設置した際のイメージ図



穴あけ装置の製作状況



隔離機構ユニットの製作状況

- ・遠隔化の開発項目は大きく3つあり、それぞれの要素試験結果は以下の通り。

装置の自走	装置の固定	X-6の穴あけ
遮へい体を載せた状態で自走で所定の位置に移動する。	遠隔操作でクランプにより装置をX-6ペネに取り付ける。	ドリル交換が不要となるようにホールソー方式で穴あけを行う。
荷重を載せた状態での自走試験を実施。	加工反力以上の力でクランプできることを確認。	ホールソー（Φ115）で穴あけできることを確認

4. X-6ペネ穴あけ

4. 3 組合せ試験の結果 (1/2)


■ 装置の組立

隔離機構ユニットの遠隔操作
用ケーブルの接続



操作用ケーブルの接続


隔離機構ユニットフランジと
穴あけ装置フランジの接続

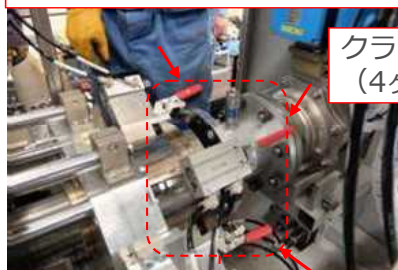

クランプで連結
(4ヶ所)



反対面でも
2ヶ所連結

遮へい体連結

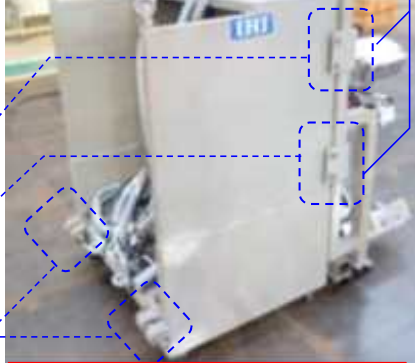

ボルト・ナットで連結
(側面4ヶ所, 底面2ヶ所)

隔離機構ユニットフレームと
穴あけ装置フレームの連結

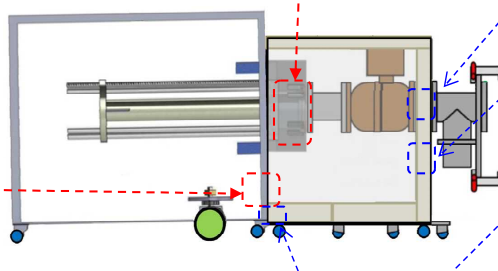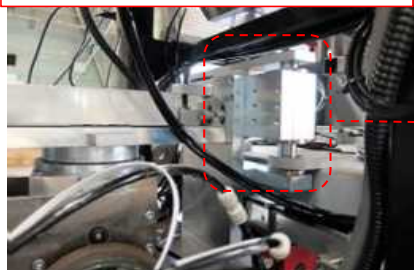

計画通り組み立てられることを確認。

4. X-6ペネ穴あけ


4. 3 組合せ試験の結果 (2/2)

■ 装置の自走



装置の前進、後進、旋回（左右）が
実施できることを確認。

■ 装置の固定

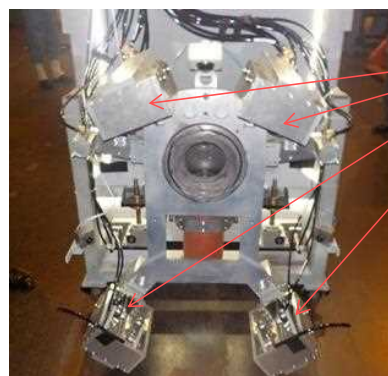

クランプ




X-6ペネの模擬体に固定できることを確認。

■ X-6ペネの穴あけ

隔離機構ユニット

X-6ペネ
模擬体

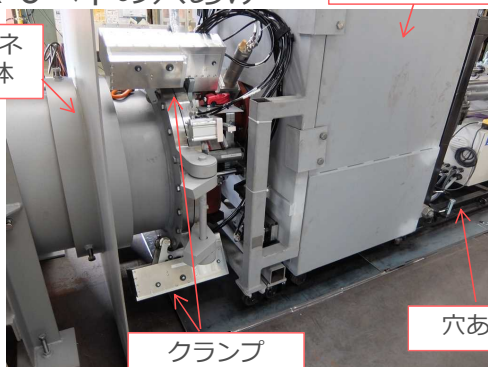

クランプ

穴あけ装置

X-6ペネの模擬体に穴あけできる
ことを確認。

4. X-6 ペネ穴あけ


4. 4 現地作業の概要

- 穴あけ作業は、下図作業ステップ (ii) に示すように、隔離機構側から窒素を加圧することによりバウンダリを構築し、PCV内の気体及び穴あけ作業で発生するダストが外部に漏れ出て周辺環境へ影響を与えないよう作業する。
- 穴あけ作業後は、穴あけ装置引き抜き時に隔離機構ユニットのボール弁を閉する。
- なお、PCV内の気体が外部に漏れ出て周辺環境へ影響を与えていないことを確認するため、作業前にX-6ペネ近傍に連続ダストモニタを設置し、作業中のダスト濃度を監視する。

作業ステップ(i)
穴あけ前

作業ステップ(ii)
穴あけ(X-6ペネ貫通)

作業ステップ(iii)
穴あけ装置取り外し

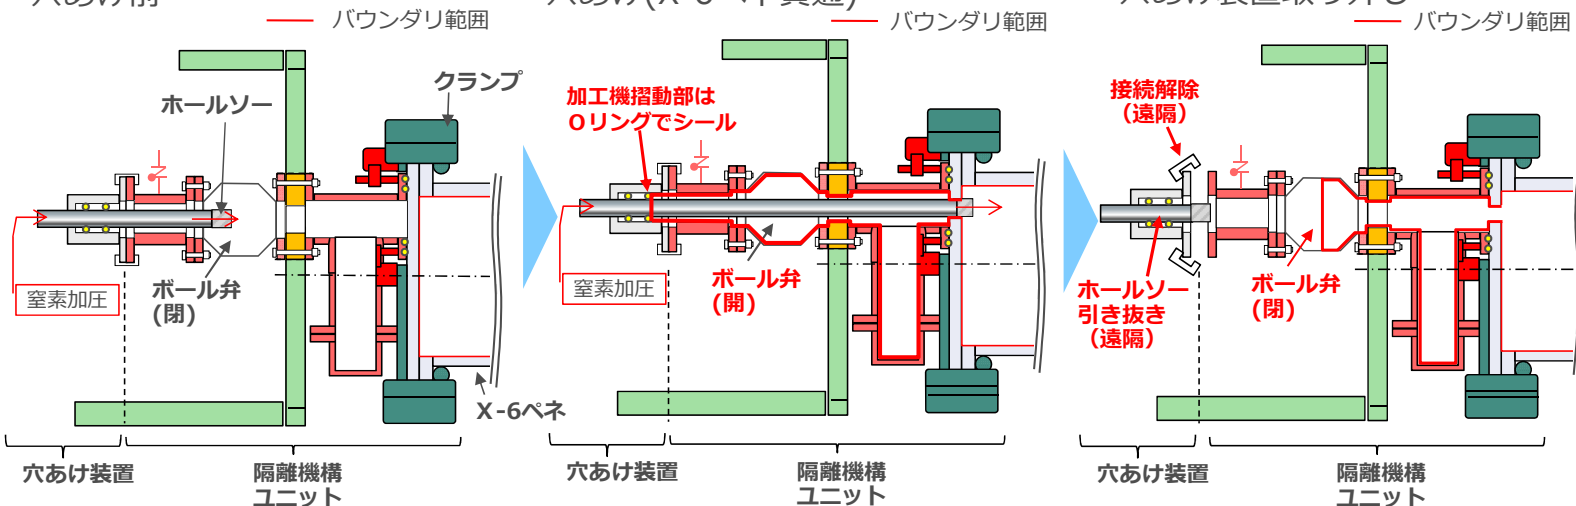


5. PCV内部調査 (A2調査)

5. 1 ガイドパイプによる事前調査の概要

- 事前確認用ガイドパイプによるX-6ペネ内及びCRDレールの状況確認後、ガイドパイプによるペDESTAL内事前調査を行う。

カメラ撮影方向

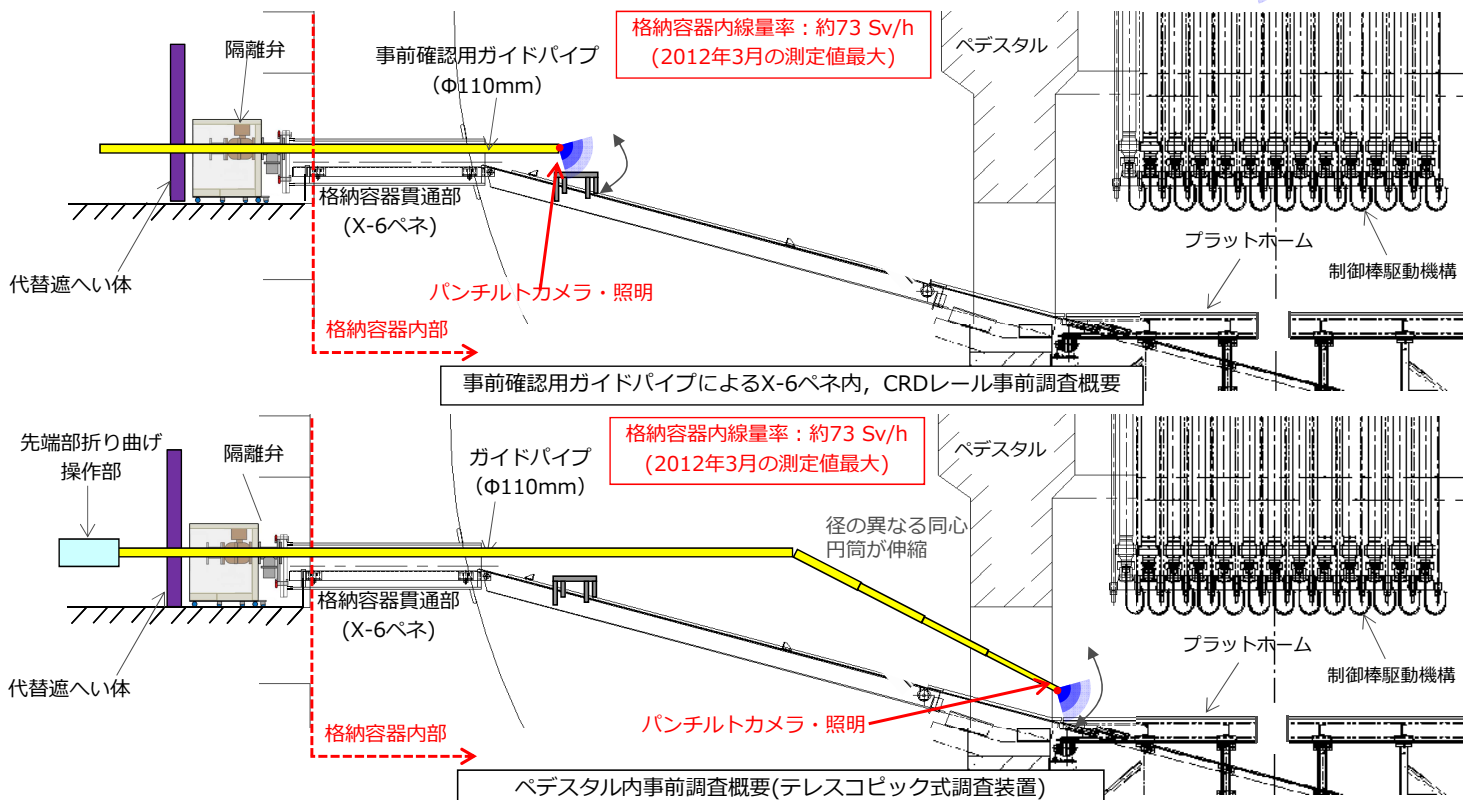


5. PCV内部調査 (A2調査)

5. 2 堆積物除去及び自走式調査装置による内部調査の概要

- 事前調査において、CRDレール上に自走式調査装置の走行に影響を与える可能性のある堆積物があつた場合、堆積物除去装置を走行させ、堆積物の除去を行う。
- 最後に自走式調査装置をPCV内へ走行させ、内部調査を行う。

カメラ撮影方向

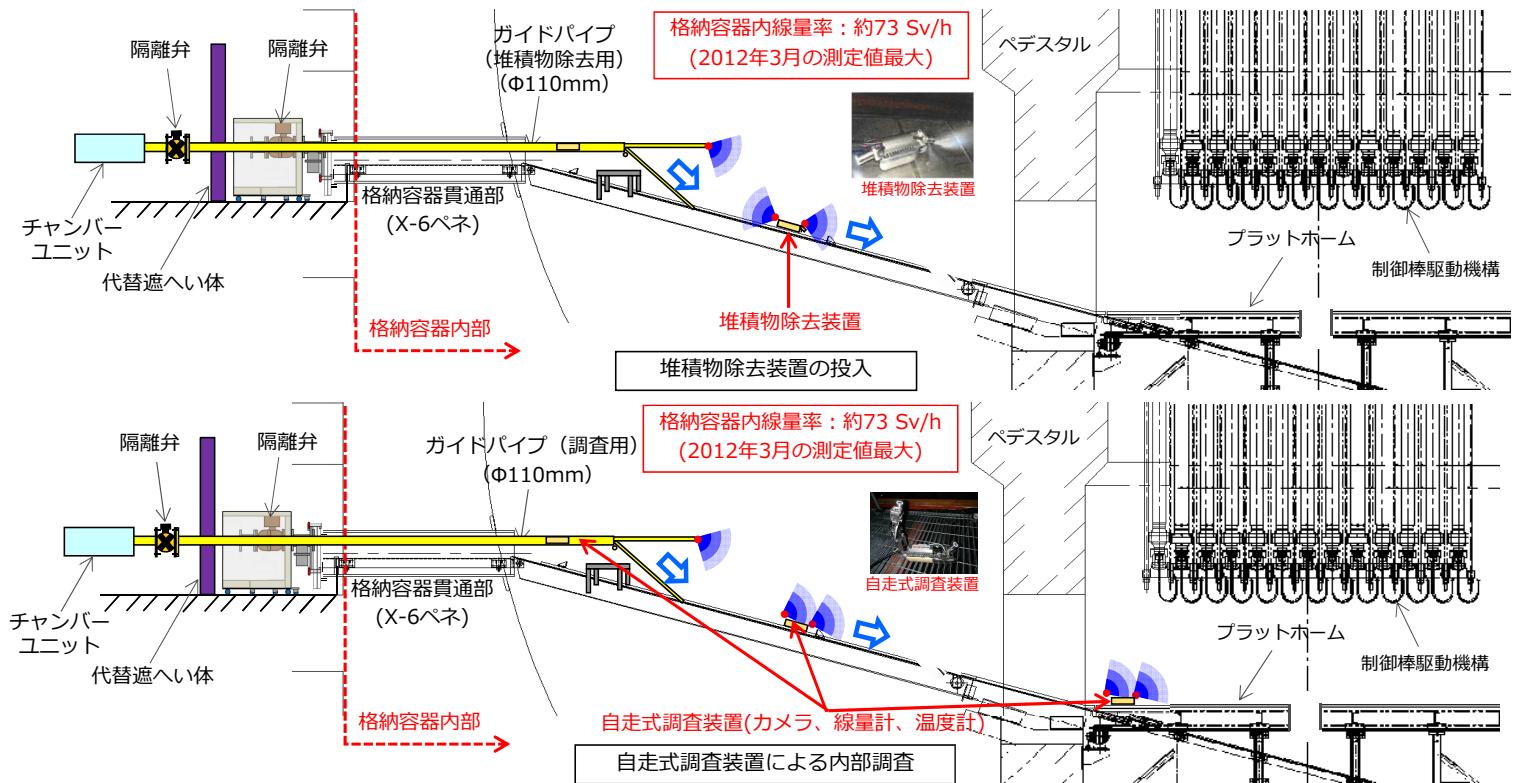

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

10

6. 工程

大よその規模感を表現するものであり、各作業期間は変更となる可能性がある。

作業項目	2016年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新規遮へい体を用いた A2調査	装置設計、遮へい設計				装置製作、遮へい製作				習熟訓練 (X-6ペネ穴あけ)			
									X-6ペネ穴あけ前の準備作業 (X-6ペネ前の床面平坦化)			
									X-6ペネ 準備・穴あけ			
									習熟訓練 (A2調査装置)			
									A2準備・調査			
