福島第一原子力発電所 1号機 建屋カバー解体工事の進捗状況について

2017年8月31日

T=PCO

東京電力ホールディングス株式会社


©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved. 無断複製・転載禁止 東京電力ホールディングス株式会社

建屋カバー解体の流れ

TEPCO

1

■ 建屋カバー解体工事は下記フローに沿って実施。現在は、建屋カバーの柱・梁の改造を実施中

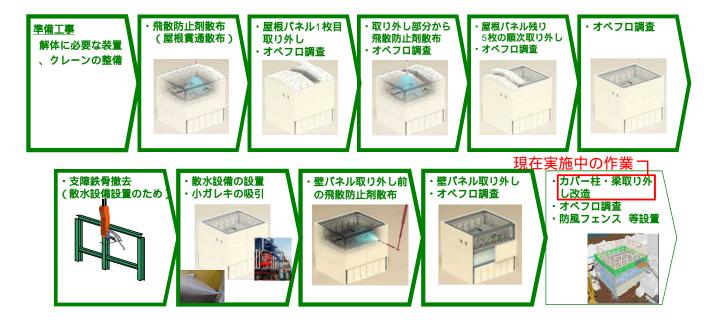

材質が鋼板であることから、名称を「防風シート」から「防風フェンス」に変更

- 2017年5月11日、建屋カバーの柱・梁の取り外し作業が完了。
- 現在、ガレキ撤去作業時のダスト飛散を抑制する防風フェンスの設置に向けた作業を進めている。
- 改造した北側の柱・梁を8/29~8/31に設置。今後、順次設置を進めていく。
- これまで、作業に伴うダストモニタの警報発報なし、モニタリングポストの有意な変動なし。



取付け前 (2017年6月19日撮影)



北側柱・梁取付け後 (2017年8月31日撮影)

2
