

# 2号機海水配管トレンチ建屋接続部における 溜まり水移送作業完了について

---

2019年8月29日

東京電力ホールディングス株式会社

**TEPCO**

# 2号機海水配管トレンチ建屋接続部溜まり水移送実績について

## 【2号海水配管トレンチ水移送実績】

水移送期間：2019年6月19日～8月2日（移送完了）、水移送実績：約115m<sup>3</sup>

### 【南側トレンチ】

- 水移送期間：6月19日～7月18日
- 水移送実績：約77m<sup>3</sup>
- 水移送状況：
  - ・トレンチ内部に凍結止水用のパッカーがせり出しており、計画より移送能力の低いポンプを使用
  - ・水位計により移送完了確認（7/18）

### 【北側トレンチ】

- 水移送期間：7月26日～8月2日
- 水移送実績：約38m<sup>3</sup>
- 削孔・水移送状況：
  - ・削孔用コアカッターが障害物を噛み中断（7/14）
  - ・位置替え、再削孔完了（7/25）
  - ・トレンチ内部にパッカーがせり出しており、計画より移送能力の低いポンプ使用
  - ・水位計により移送完了確認（8/2）


## 【2号海水配管トレンチ水移送工程】

| 対象箇所   | 2019年                               |  |           |              |
|--------|-------------------------------------|--|-----------|--------------|
|        | 6月                                  | 7月   | 8月        | 9月           |
| 南側トレンチ | 準備・削孔(3月～)<br>水移送 (6/19～<br>▽7/18完了 | 充填<br>▽7/18完了                              | 移送完了      |              |
| 北側トレンチ |                                     | 削孔中断(7/14) 再削孔<br>▽7/25完了<br>水移送<br>▽8/2完了 | 充填 (立坑部含) | 整地・片付け (南側含) |


# (参考) 2号機海水配管トレンチ建屋接続部充填状況について

## 【充填閉塞工事の状況】

- 充填期間：2019年7月16日～8月22日（立坑含む）充填完了
- 充填範囲：南側トレンチ、北側トレンチ、立坑（打設高さ T.P+9.81m）

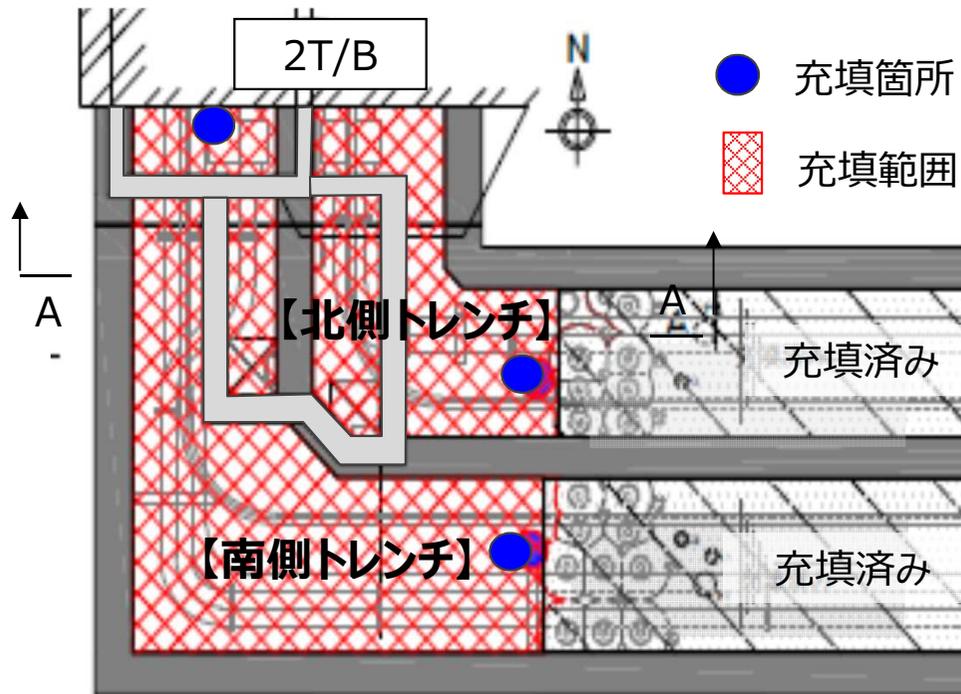

2号機海水配管トレンチ建屋接続部平面図

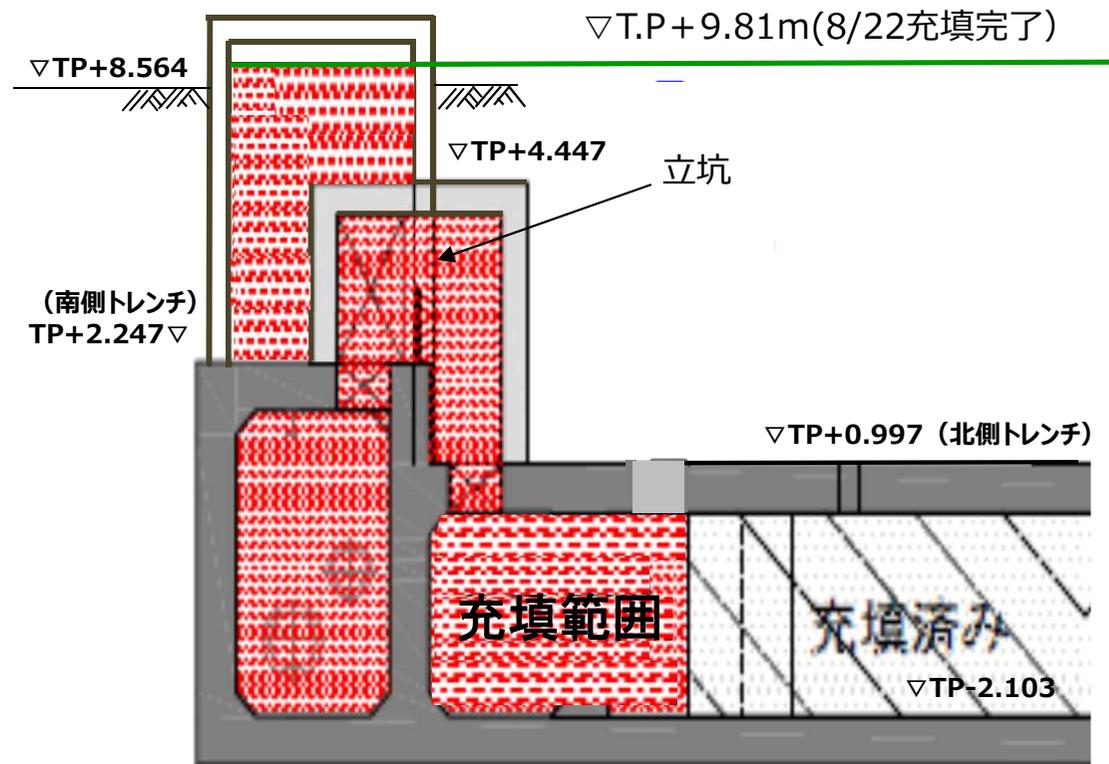

2号機海水配管トレンチ建屋接続部断面図 (A-A)
