


分野名	南戸中長期実行プラン2021 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月 以降	備 考
					16	23	30	6	13	20	27	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
使用済燃料プール対策	●1号機大型カバーの設置完了(2023年度頃) ●1号機燃料取り出しの開始(2027～2028年度) ●2号機燃料取り出しの開始(2024～2026年度) ●1～6号機燃料取り出し完了(2031年内)	カバ―	1号機	〔実 績〕 ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・建屋カバー（残置部）解体 〔予 定〕 ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備 ・大型カバー設置（準備作業含む）	検討・設計	大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計																		【主要工程】 ○ガレキ撤去：'18/1/22～20/11/24（大型カバー設置後に再開予定） ・Xプレス撤去：'18/9/19～'18/12/20 ・機器ハッチ養生：'19/1/11～'19/3/6 ・屋根鉄骨分断：'19/2/5～'19/2/22 ・SFP周辺小ガレキ撤去：'19/3/18～'20/9/18 ・ウェルブラグ調査：'19/7/17～'19/8/26 ・SFP内干渉物等調査：'19/8/2、'19/9/4～6 9/20、27 ・ウェルブラグ上のH鋼撤去：'19/8/28 ・FHM下部支障物撤去：'20/3/3～'20/3/14 ・SFPゲートカバー設置：'20/3/16～'20/3/18 ・SFP養生設置（準備作業含む）：'20/3/20～'20/6/18 ・FHM支保設置（準備作業含む）：'20/9/15～'20/10/23 ・天井クレーン支保設置（準備作業含む）：'20/10/28～'20/11/24 ○大型カバー設置 ・残置カバー解体（準備作業含む）：'20/11/25～'21/6/19 【規制庁関連】 ・オペレーティングフロア床上ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可（'19/3/1） ・大型カバー 実施計画変更申請（'21/6/予定） ※○番号は、別紙配置図と対応			
					現場作業	①現地調査等（'13/7/25～） ②作業ヤード整備 等 ③建屋カバー（残置部）解体（準備作業等含む） 最新工程を反映																		③大型カバー設置（準備作業等含む） 最新工程を反映			
			燃料取り出し用カバーの詳細設計の検討 原子炉建屋上部のガレキの撤去 燃料取り出し用カバーの設置工事	2号機	検討・設計	燃料取り出し用構台の検討・設計																		【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：'19/10/31 ・ヤード整備工事：'15/3/11～'16/11/30 ・西側構台設置工事：'16/9/28～'17/2/18 ・前室設置工事：'17/3/3～'17/5/16 ・屋根保護層撤去（遠隔重機作業）：'18/1/22～'18/5/11 ・オペレーティングフロア西側外壁開口：'18/4/16～'18/6/21 ・鉄骨トラス状況確認：'18/2/28～'18/3/17 ・オペレーティングフロア調査：'18/6/25～'18/7/18 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け：'18/8/23～'18/11/6 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け後調査と片付け：'18/11/14～'19/2/28 ・西側構台設備点検：'19/2/13～'19/3/26 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け（その2）：'19/3/25～'19/8/27 ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け（その3）：'19/9/10～'20/2/25 ・SFP内調査：'20/4/27～'20/6/30（調査：'20/6/10～'20/6/11） ・オペレーティングフロア残置物移動・片付け（その4）：'20/3/2～'20/12/11 ・原子炉建屋オベフロ調査：'20/12/7～'21/3/10 ・【構外】原子炉建屋オベフロ除染作業検証：'21/3/15～'21/7/末 ・原子炉建屋オベフロ除染：'21/6/22～'22/1/下旬 ・原子炉建屋オベフロ遮蔽体設置：'21/10/月上旬～'22/5/下旬 ・地盤改良工事：'21/9/末～'22/上期 【規制庁関連】 ・西側外壁開口設置 ・実施計画変更認可（'17/12/21） ・燃料取り出し用構台 ・実施計画変更申請（'20/12/25） ・燃料取扱設備 ・実施計画変更申請（'20/12/25） ※○番号は、別紙配置図と対応			
					現場作業	④南側ヤード干渉物撤去 【構外】原子炉建屋オベフロ除染 除染作業検証・モックアップ 最新工程を反映 ⑤原子炉建屋オベフロ除染 除染装置試運転・モックアップ・準備作業 最新工程を反映 ⑥原子炉建屋オベフロ除染 最新工程を反映																		④地盤改良 （2022年度上期完了予定） ⑤原子炉建屋オベフロ除染 （2022年1月完了予定） ⑥原子炉建屋オベフロ除染（準備作業等含む） （2022年5月完了予定） 【構外】原子炉建屋オベフロ遮蔽体設置（準備・モックアップ） （2022年5月完了予定）			
		燃料取扱設備	クレーン／燃料取扱機の設計・製作 プール内ガレキの撤去、燃料調査等	1号機	検討・設計	燃料取り出し設備の検討・設計																		【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：2014年10月 →プール燃料取り出しに特化したプランを選択 ・ガレキ撤去計画継続検討 ・燃料取り出し計画の選択：'19/12/19 （2026年度頃完了予定）			
				2号機	検討・設計	燃料取り出し設備の検討・設計																		【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択：'19/10/31 （2024年度頃完了予定）			
	●その他プール燃料取り出し関連作業	共用プール	燃料受け入れ	〔実 績〕 ・なし 〔予 定〕 ・なし	現場作業																			【主要工程】 ○共用プール設備点検： ・クレーン点検：'21/3/15～'21/4/9			
			乾式キャスク製作	〔実 績〕 ・乾式キャスク製作・検査 〔予 定〕 ・乾式キャスク製作・検査	調達	乾式キャスク製作・検査																		【主要工程】 ・実施計画変更認可済（'20/9/29） 継続検討中			
			共用プール空き容量確保（既設仮保管設備受入）	〔実 績〕 ・なし 〔予 定〕 ・なし	現場作業																			【主要工程】 ・乾式キャスク搬出作業開始（'22/3）			
			乾式保管設備（共用プール用）検討・設計・設置工事	〔実 績〕 ・乾式保管設備（共用プール用）検討 〔予 定〕 ・乾式保管設備（共用プール用）検討	検討・設計	乾式保管設備（共用プール用）検討																		継続検討中			
		高線量機器取り出し	制御棒等高線量機器取り出し	3号機	検討・設計	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作																		【主要工程】 ○3号機 使用済燃料プール内調査：'21/7/中旬～'21/9 ○3号機 使用済燃料プール内ガレキ撤去：'21/9～ （2022年9月完了予定）			
				現場作業	プール内調査 プール内ガレキ撤去 （2024年度頃完了予定）																						
		4号機	検討・設計	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作 （2024年度頃完了予定）																							

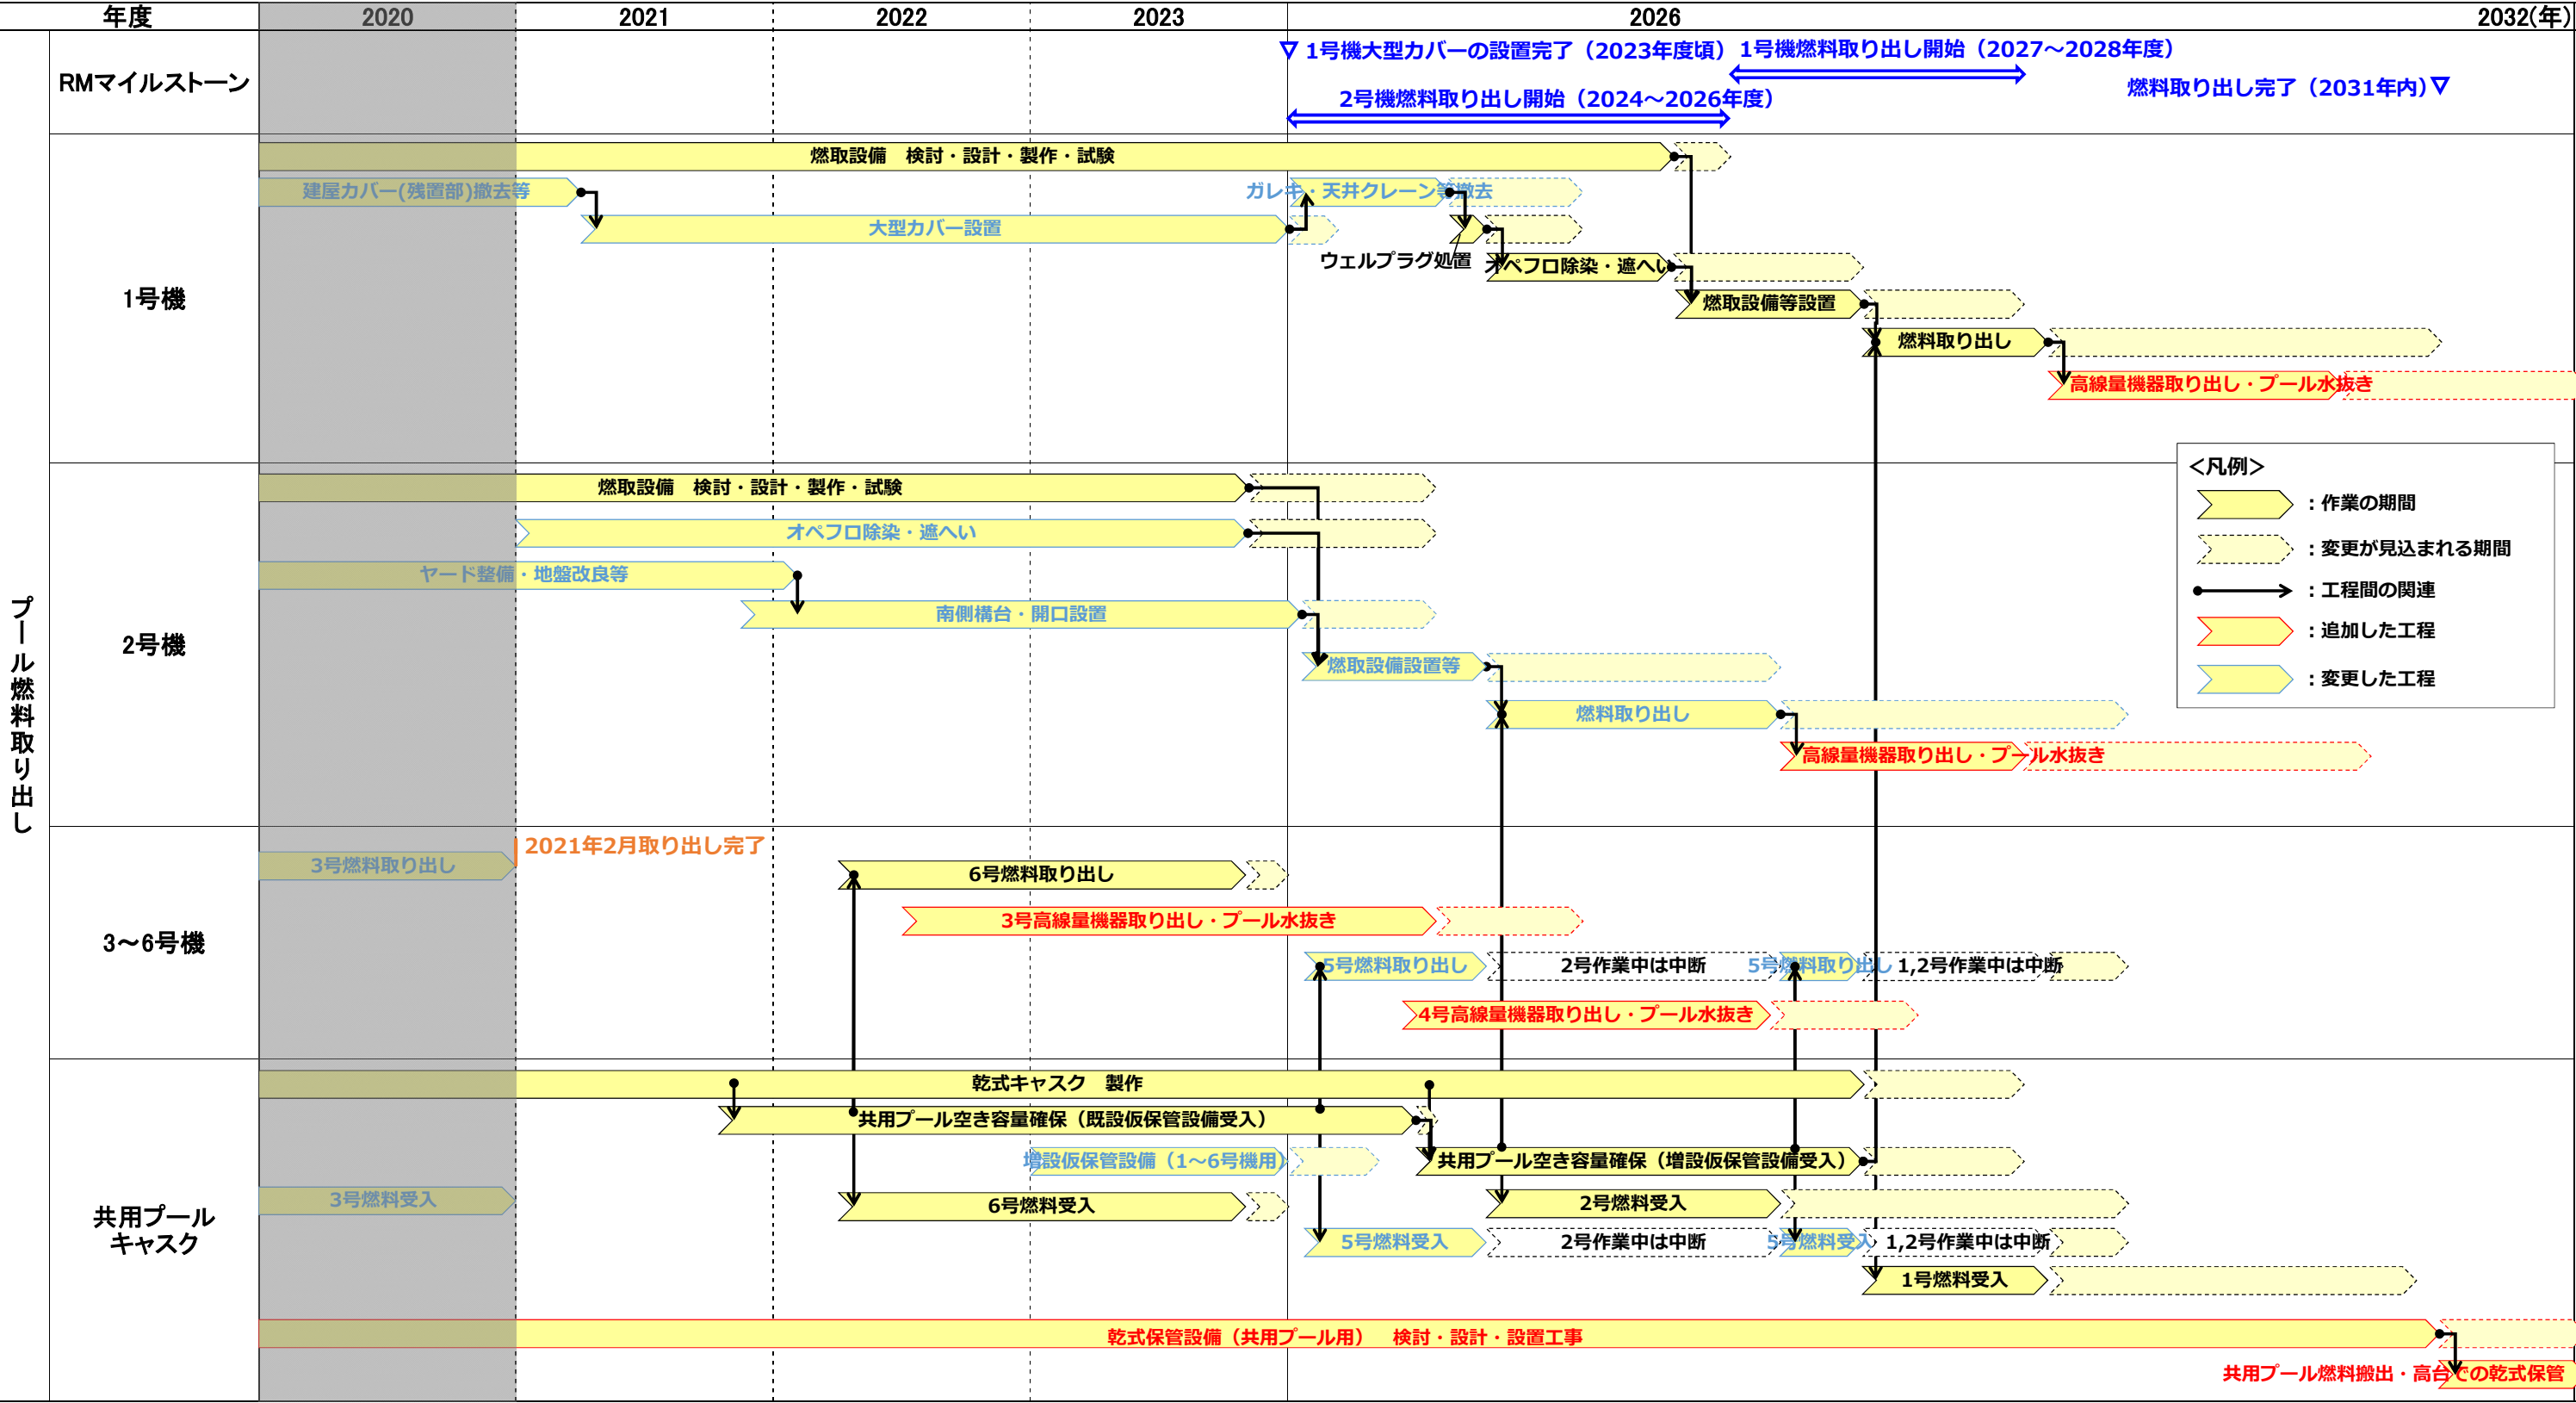

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
