

1号機燃料取り出しに向けた工事の進捗について



2021年6月24日



東京電力ホールディングス株式会社

建屋カバー(残置部)解体の状況

- 大型カバーを原子炉建屋に設置するため、干渉する建屋カバー(残置部)の解体を2020年12月19日より開始し2021年6月19日に当初計画とおりに完了。
- 継続して原子炉建屋周囲の作業ヤード整備を実施。

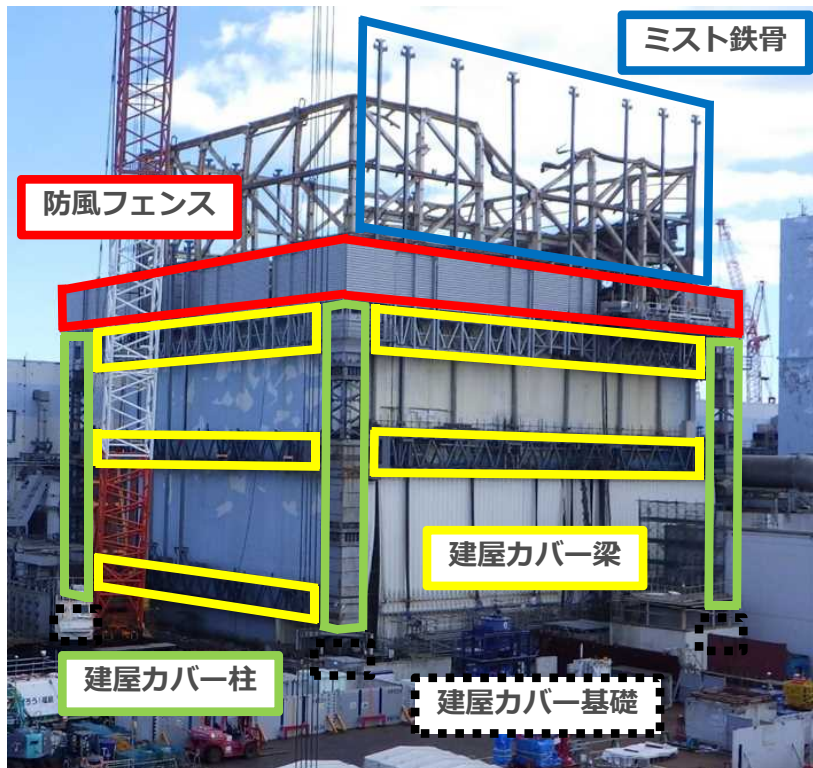

1号機原子炉建屋全景（2020年3月時点）




1号機原子炉建屋全景（2021年6月19日時点）

大型カバーの組立て作業状況

- 2021年4月下旬より大型カバー設置へ向けた仮設構台の組立て作業等を構外ヤードで実施中。

現時点

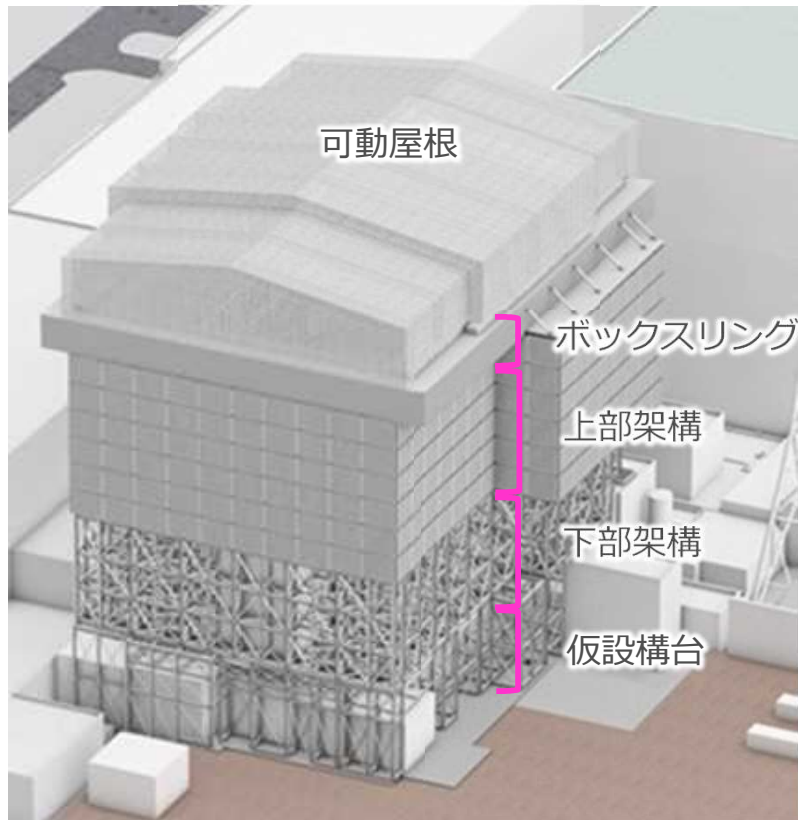

大型カバー全体の概要図



構外ヤード全景（2021年6月21日時点）

スケジュール

- 建屋カバー（残置部）の解体は2021年6月19日に完了。
現在，原子炉建屋周囲の作業ヤード整備や構外ヤードでの仮設構台の組立て作業等を実施中。
2021年上期より大型カバー設置工事に着手する予定。

	2020 年度			2021 年度							2022 年度	2023 年度	2024 年度
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	下期			
中長期RM マイルストーン												2023年度頃 大型カバー設置完了	
建屋カバー(残置部) 解体	防風フェンス等・ミスト鉄骨解体			梁・柱解体									
	小割解体等			基礎解体									
大型カバー設置				作業ヤード整備，構外ヤード地組等									
				大型カバー設置工事（準備作業等含む）									
				大型カバー付帯設備設置									
許認可				実施計画変更申請（大型カバー）									
				実施計画変更申請（付帯設備）									

※周辺工事との調整や現場状況等を踏まえて、工程は変更となる可能性がある
