


汚染水対策スケジュール（1/3）

分野	括り	関係中長期実行プラン2021目標工程	対象設備・作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月以降	備 考
					15	22	29	5	12	19	26	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中		
汚染水対策分野	●原子炉建屋滞留水を2020年末の半分程度に低減(2022～2024年度)	建屋内滞留水	【1～4号機 滞留水移送装置】 (実績) ・1～4号機滞留水移送装置運転 (予定) ・1～4号機滞留水移送装置運転	現場作業 1～4号機滞留水移送装置設置 運転																				(継続運転)			
			【α核種除去設備検討】	設計・検討																					(2022年2月設計完了予定)		
			【1～4号機 T/B床面スラッジ等の回収方法検討】	設計・検討																					(2023年度設計完了予定)		
			【滞留水処理 代替タンク設計】	設計・検討																					(2022年3月設計完了予定)		
			【プロセス主建屋・高温焼却建屋ゼオライト土壌の検討】	設計・検討																					(2023年度上期設計完了予定)	高温焼却伊建屋の地下層調査完了(2021/5/20～5/28) プロセス主建屋の地下層調査完了(2021/7/26～8/6) プロセス主建屋の地下層線量調査実施(2021/10～)	
	●汚染水発生量を100m3/日以下に抑制(2025年内)	浄化設備	【仮設多核種除去設備】 【高性能多核種除去設備】 【増設多核種除去設備】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転	現場作業 処理運転(処理水の状況に応じて適宜運転または処理停止)																					(継続運転)	処理水及びタンクのインサービス状況に応じて適宜運転または処理停止 仮設多核種除去設備 除去性能確認に係る実施計画変更申請(2021/7/2) 増設多核種除去設備 前処理設備改選に係る実施計画変更申請(2021/7/27)	
			【サブドレン浄化設備】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転	現場作業 処理運転																					(継続運転)	サブドレン汲み上げ、運用開始(2015.9.3～) 排水開始(2015.9.14～) 前処理フィルタ1B、2B取替完了(2021.5/27)	
			【5/6号機サブドレンの復旧】 (実績) サブドレン設備復旧工事着手(2020/9/7～) ・配管設置：約1900/約1900m ・中継タンク設置：2/2基 ・ポンプ・水位計設置：0/13箇所 ・試験(各設備設置後)：一式(未実施)	現場作業																					(2022年3月運転開始予定)	2021年2月18日 5・6号機サブドレン集水設備復旧の実施計画変更認可(原規規発第2102184号)	
			【地下水バイパス設備】 (実績) ・運転 (予定) ・運転	現場作業 運転																					(継続運転)		
			【セシウム吸着装置】 【第二セシウム吸着装置】 【第三セシウム吸着装置】 (実績) ・処理運転 (予定) ・処理運転	現場作業 処理運転																					(継続運転)	2021年1月29日 吸着塔の第二セシウム吸着装置及び第三セシウム吸着装置での再利用の実施計画変更認可(原規規発第2101291号) 使用前検査予定月：2021年10月(第三セシウム吸着装置、2・3号) 2021年11月(第二セシウム吸着装置、2・3号)	
		陸側排水壁	(実績・予定) ・未凍結箇所補助工法は2018年9月に完了 ・維持管理運転2019年2月21日全域展開完了	現場作業 維持管理運転(北側、南側の一部 2017/5/22～、海側の一部 2017/11/13～、海側全域・山側の一部 2018/3/14～、山側全域2019/2/21完了)																					(継続運転)		
		フェーシング(陸側排水壁内エリア)	【凍土壁内フェーシング(全6万m ²)】 (予定) 4号機タービン建屋東側	現場作業 4号機タービン建屋東側																					(2022年2月工事完了予定)	4号機タービン建屋東側：2021年4月7日開始	
		3号機R/B燃料取出用カバー雨水対策(HPCI室水位上昇対応)	(実績) ・2021年8月6日 仮設雨樋設置完了 (予定) ・2022年2月 雨樋本設化完了予定	現場作業 雨水排水先変更(サブドレンNo.34付近の地表面に排水)																							

汚染水対策スケジュール（2/3）

分野名	括り	関係中長期実行プラン2021目標工程	対象設備・作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月以降	備 考		
					15	22	29	5	12	19	26	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中			下	
汚 染 水 対 策 分 野	●タンク関連	H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握	現場作業	モニタリング																					(継続実施)	2018年9月10日 Eエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について（実施計画変更認可） ※：残水回収中の2基を除く 実施計画変更申請中 2021年8月2日 福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画 変更認可申請書（廃炉発官R3第68号） ※工程前倒しを検討中 年1回、溜まり水の点検を実施		
			タンク解体	(実績・予定) ・Eエリアフランジタンク解体工事 ：49基解体予定	現場作業	Eエリアフランジタンク解体工事																		(2022年4月 工事完了予定)*					
			タンク設置	(実績・予定) ・G4北エリア溶接タンク設置工事 ：6基設置予定 ・G5エリア溶接タンク設置工事 ：17基設置予定	現場作業	G4北エリア溶接タンク設置工事																		(2022年8月* 工事完了予定) (2022年8月 工事完了予定)					
		●溜まり水対策	溜まり水対策	【構内溜まり水の除去】	現場作業																							(継続実施)	
		●自然災害対策	津波対策	○日本海沿岸津波対策 ・日本海沿岸津波対策防潮堤設置 (実績・予定) 試験施工 本体構築工事	現場作業	現場調査・測量・試験施工			本体構築工事																			(2024年3月 工事完了予定)	1～4号機側：2024年3月完了予定 現場番手：2021/06/21開始 テールアルメス工：2021年9月14日作業開始
				○3.11津波対策 ・建屋開口部閉止 (実績) 閉止箇所数 123箇所/127箇所 (9月28日時点) (予定) 外部開口閉塞作業 継続実施	現場作業	【区分5】 1～4Rw/B、4R/B、4T/B並等																						(2022年3月 工事完了予定)	【区分①②】 1～3T/B等2019年3月、全67箇所完了 【区分③】 2、3R/B外部のハッチ等 (2019年3月～2020年3月、全20箇所完了) 【区分④】 1～3R/B群等 (2019年9月～2020年11月、全16箇所完了) 【区分5】 1～4Rw/B、4R/B、4T/B (2020年3月～2022年3月、20箇所/24箇所完了)
				○3.11津波対策 ・メガフロート移設【9/22時点】 (実績) 着底マウンド造成100%、バラスト水処理100%、 内部除染作業100% メガフロート移設・仮着底：100% 内部充填作業：100% 護岸ブロック製造：100% 据付：100% 裏込工：100% ブロック基礎被覆：100% 上部盛土工：100% 上部コンクリート工：55% (予定) 埋立エリア盛土工 港湾ヤード整備	現場作業	護岸工事																						(2022年2月 工事完了予定)	着底マウンド造成：2019年5月20日開始、2020年2月7日完了 バラスト水処理：2019年5月28日開始、2020年2月20日完了 内部除染：2019年7月16日開始、2020年2月26日完了 メガフロート移設・仮着底：2020年3月4日完了 内部充填：2020年4月3日開始、8月3日完了 護岸ブロック据付：2020年10月2日開始、2021年2月4日完了 裏込工：2021年1月16日開始、2021年3月24日完了 ブロック基礎被覆：2021年3月25日開始、2021年6月8日完了 上部盛土工：2021年4月19日開始、2021年8月3日完了 上部コンクリート工：2021年6月16日開始、2021年10月29日完了目標 ※2月13日の地震による影響を福島県と協議し、追加申請を実施予定。
	豪雨対策		○豪雨対策 ・O排水路新設 (実績) (9月20日時点) 準備工事 完了 立坑構築工（雨発達立坑部） 75% 立坑構築工（上流側到達立坑部） 60% 立坑構築工（下流側到達立坑部） 20% 立坑構築工（小口径推進部） 40% トンネル工（下流側機械掘進工） 40%	現場作業	立坑構築工事（雨発達立坑部、下流側到達立坑部、上流側到達立坑部、小口径推進部）																					(2022年8月 工事完了予定)	雨発達立坑部：2021/03/06施工開始 下流側到達立坑部：2021/03/22準備開始、7月16日施工開始 上流側到達立坑部：2021/04/05施工開始 トンネル工事：2021/07/29開始、2021/09/06掘進作業開始、2021/09/16初期掘進開始 、2021/9/28本掘進開始		
				トンネル工事（下流側～2022.1）																					(2022年8月 工事完了予定)				

廃炉中長期実行プラン2021

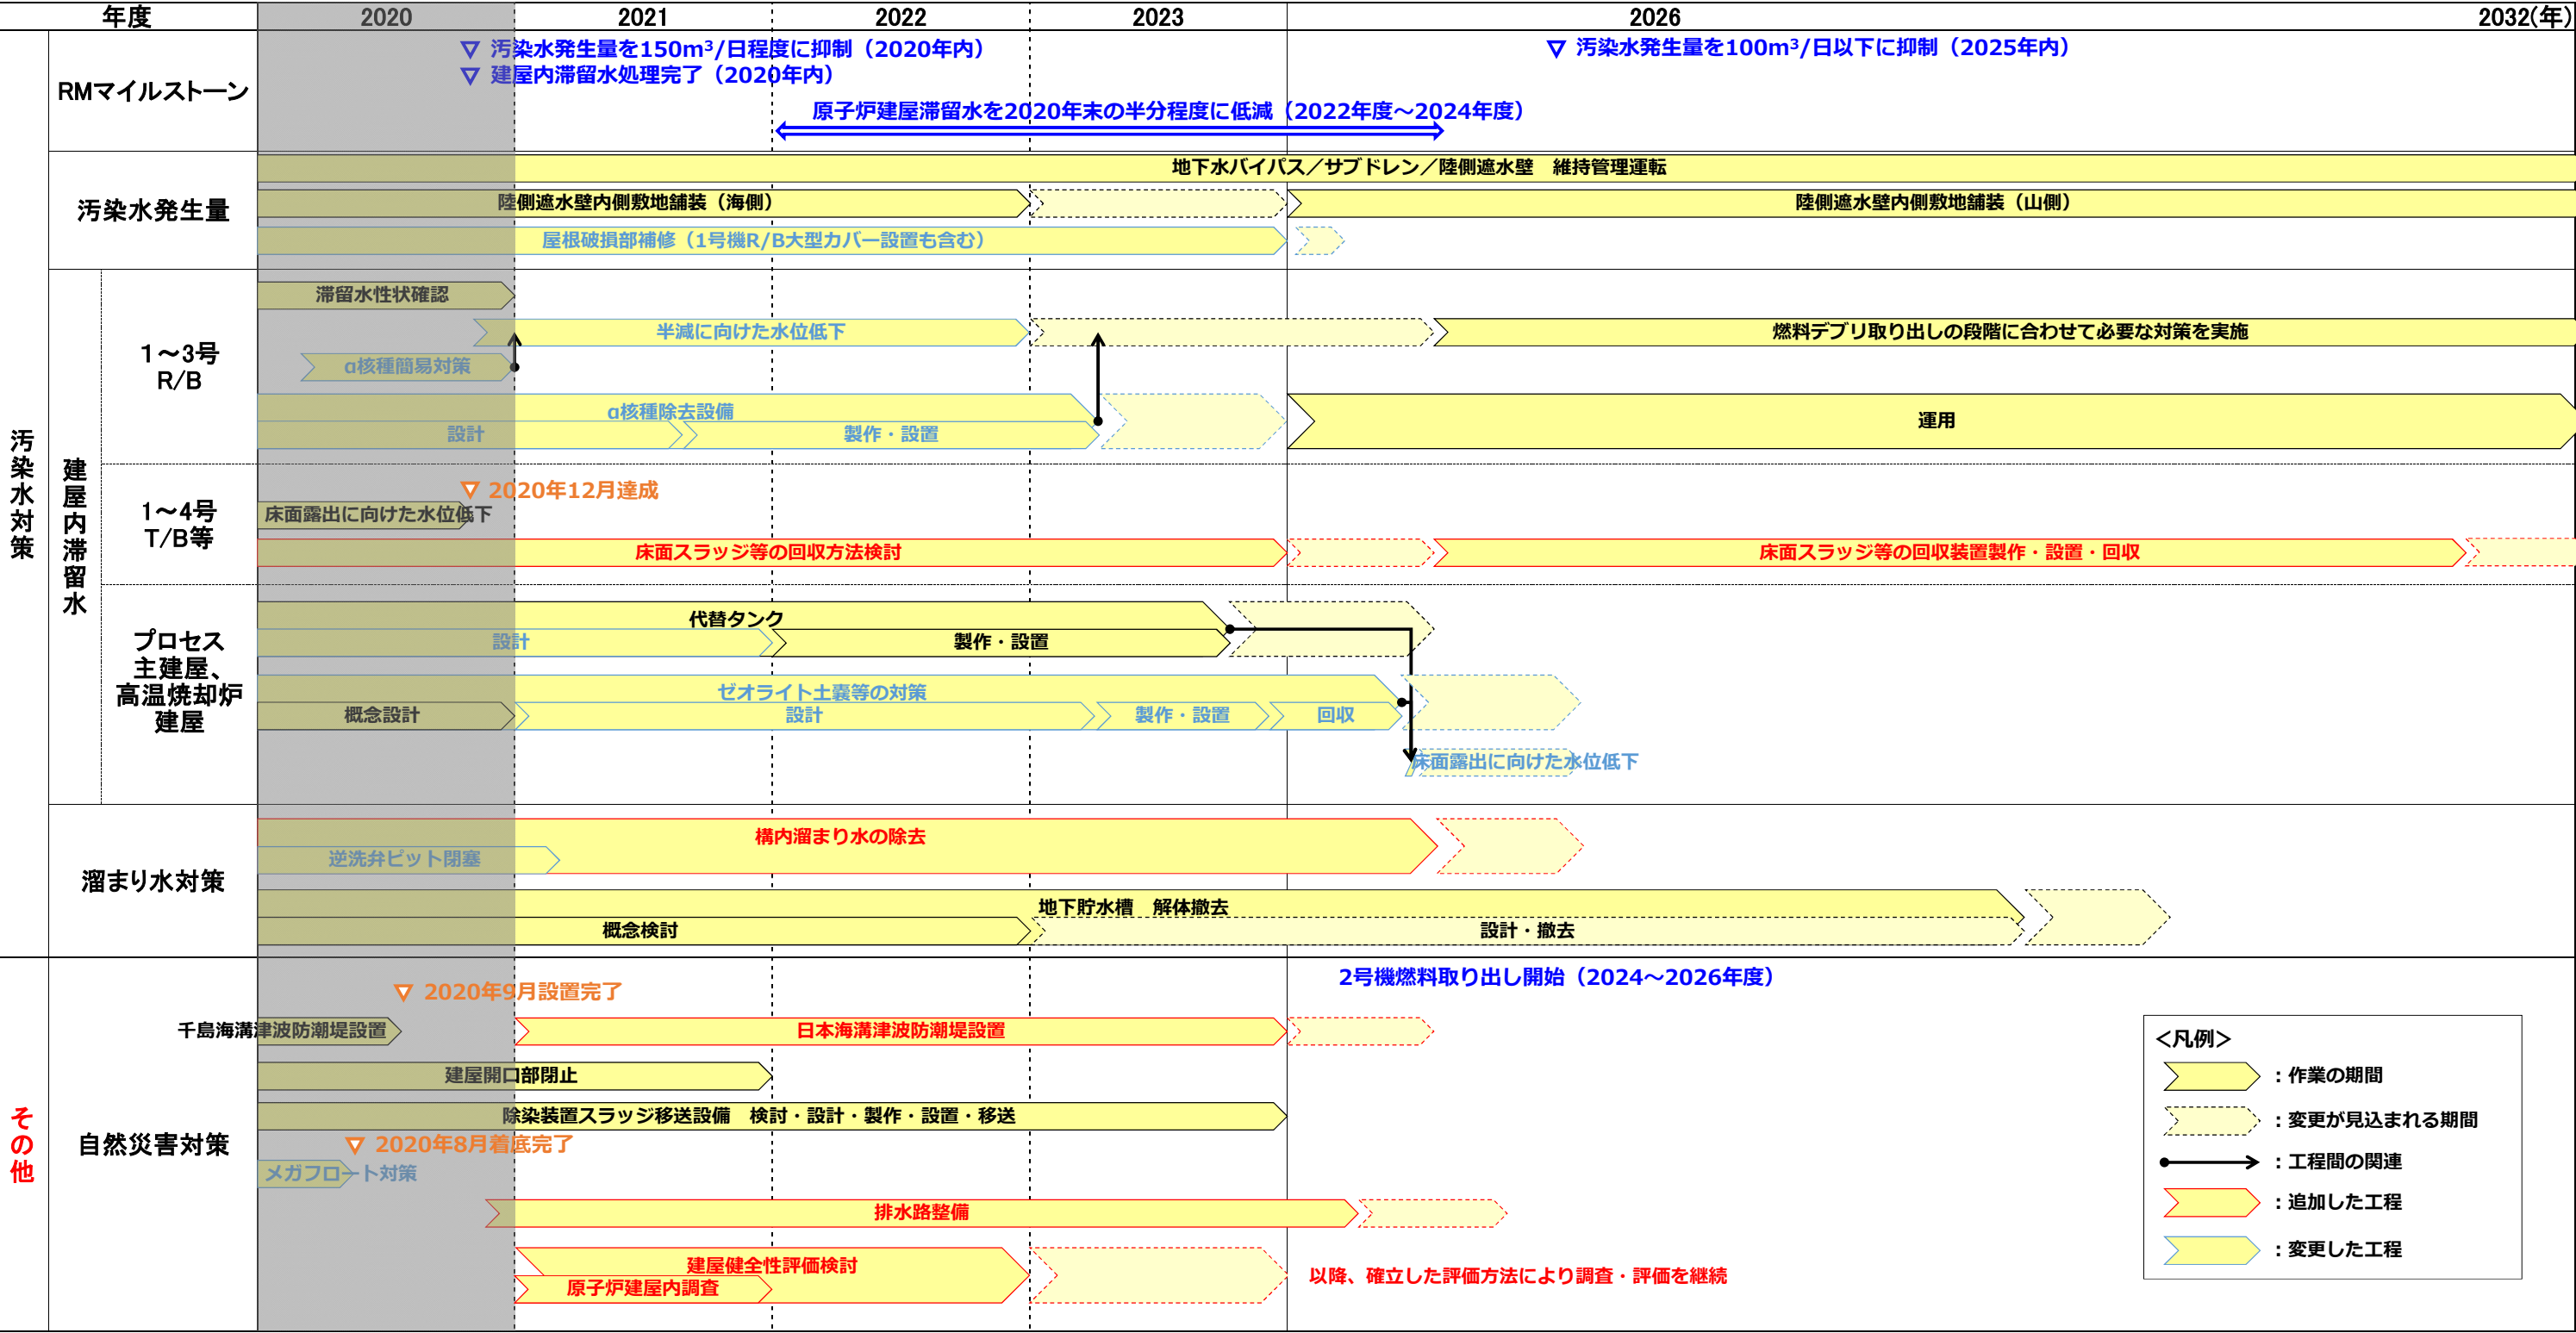

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
