


分野名	拠/中長期実行プラン2021 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月以降												備考
					10	20	3	10	17	24	31	上	中	下	上	中	
●1号機大型カバ ーの設置完了(2023年度 頃) ●1号機燃料取り出し の開始(2027~ 2028年度) ●2号機燃料取り出し の開始(2024~ 2026年度) ●1~6号機燃料取り 出し完了(2031年 内)	燃料取り出し用カバ ー の設置	燃料取り出し用カバ ー の設置	(実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備・外壁調査 ・大型カバー仮設機台等設置 【構外】大型カバー換気設備他準備工 事  (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・現地調査等 ・作業ヤード整備・外壁調査 ・大型カバー仮設機台等設置 ・R/B壁面アンカー設置 ・【構外】大型カバー換気設備他準備工 事	検討・設計 大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計 (2022年度完了予定)													○ガレキ撤去: '18/1/22~20/11/24 (大型カバー設置後に再開予定) ・Xブレース撤去: '18/9/19~'18/12/20 ・機器ハッチ養生: '19/1/11~'19/3/6 ・屋根鉄骨分解: '19/2/5~'19/2/22 ・SFP周辺小ガレキ撤去: '19/3/18~'20/9/18 ・フェルフラグ調査: '19/7/17~'19/8/26 ・SFP内干渉物調査: '19/8/2 ~'19/9/4~6 9/20, 27 ・ウェルフラグ上のH鋼撤去: '19/8/28 ・FHM下部支障物撤去: '20/3/3~'20/3/14 ・SFPゲートカバー設置: '20/3/16~'20/3/18 ・SFP養生設置 (準備作業含む): '20/3/20~'20/6/18 ・FHM支保設置 (準備作業含む): '20/9/15~'20/10/23 ・天井クレーン支保設置 (準備作業含む): '20/10/28~'20/11/24 ○大型カバー設置 ・残置カバー解体 (準備作業含む): '20/11/25~'21/6/19 ・大型カバー仮設機台等設置: '21/8/28~ ・大型カバー換気設備他準備工事: '21/10/19~ 【規制庁関連】 ・オペレーティングフロア床上げガレキの一部撤去等 実施計画変更認可 ('19/3/1) ・大型カバー 実施計画変更申請 ('21/6/24) ・大型カバー換気設備他 実施計画変更申請 ('21/8/23) ※○番号は、別紙配置図と対応
				現場作業 ①現地調査等 ('13/7/25~) ②作業ヤード整備、構外ヤード地盤、外壁調査等 ③-1大型カバー仮設機台等設置 ③-2R/B壁面アンカー設置、ベースプレート設置 ③-3本柱敷き足場等 【構外】大型カバー換気設備他準備工事 ④地盤改良 ⑤原子炉建屋オヘフロ除染 【構外】原子炉建屋オヘフロ遮蔽体設置 (準備・モックアップ)													
●その他プール燃料取 り出し関連作業	燃料 取 扱 機 器	燃料取り出し用カバ ー の設置	(実績) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・南側ヤード干渉物撤去 ・原子炉建屋オヘフロ除染 (除染装置試運転・モックアップ 含む) ・地盤改良試験施工 ・原子炉建屋オヘフロ遮蔽体設置 【構外】遮蔽体設置準備・モックアップ ・地盤改良 ・地盤改良試験施工  (予定) ・燃料取り出し方法の基本検討 ・南側ヤード干渉物撤去 ・原子炉建屋オヘフロ除染 (除染装置試運転・モックアップ 含む) ・原子炉建屋オヘフロ遮蔽体設置 【構外】遮蔽体設置準備・モックアップ ・地盤改良 ・地盤改良試験施工	検討・設計 燃料取り出し用機台の検討・設計 (2024年度完了予定)													【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択: '19/10/31 ・ヤード整備工事: '15/3/11~'16/11/30 ・西側機台設置工事: '16/9/28~'17/2/18 ・前室設置工事: '17/3/3~'17/5/16 ・屋根保護撤去 (連通重機作業): '18/1/22~'18/5/11 ・オペレーティングフロア西側外壁開口: '18/4/16~'18/6/21 ・鉄骨トラス状況確認: '18/2/28~'18/3/17 ・オペレーティングフロア調査: '18/6/25~'18/7/18 ・オペレーティングフロア残留物移動・片付け: '18/8/23~'18/11/6 ・オペレーティングフロア残留物移動・片付け後調査と片付け: '18/11/14~'19/2/28 ・西側機台設置準備: '19/2/13~'19/3/26 ・オペレーティングフロア残留物移動・片付け (その2): '19/3/25~'19/8/27 ・オペレーティングフロア残留物移動・片付け (その3): '19/9/10~'20/2/25 ・SFP内調査: '20/4/27~'20/6/30 (調査: '20/6/10~'20/6/11) ・オペレーティングフロア残留物移動・片付け (その4): '20/3/2~'20/12/11 ・原子炉建屋オヘフロ調査: '20/12/7~'21/3/10 ・【構外】原子炉建屋オヘフロ除染作業検証: '21/3/15~'21/7/21 ・原子炉建屋オヘフロ除染: '21/6/22~'22/1/下旬 ・原子炉建屋オヘフロ遮蔽体設置: '21/9/21~'22/5/下旬 ・地盤改良工事: '21/10/下旬~'22/上旬 ・燃料交換機撤去工事: '22/6/上旬~'22/6/下旬 【規制庁関連】 ・西側外壁開口設置 実施計画変更認可 ('17/12/21) ・燃料取り出し用機台 実施計画変更申請 ('20/12/25) ・燃料取扱設備 実施計画変更申請 ('20/12/25) ※○番号は、別紙配置図と対応
燃料取扱設備				検討・設計 燃料取り出し設備の検討・設計 (2022年度完了予定)													【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択: 2014年10月 ・燃料取り出しに特化したプランを選択 ・ガレキ撤去計画継続検討 ・燃料取り出し計画の選択: '19/12/19
燃料取扱設備		検討・設計 燃料取り出し設備の検討・設計 (2024年度完了予定)													【主要工程】 ・燃料取り出し計画の選択: '19/10/31		
共用プールの燃料受け入れ		現場作業 ・なし (予定) ・共用プール新燃料外観点検	現場作業 乾式キャスク製作・検査													【主要工程】 ・共用プール新燃料外観点検: '21/12/2~'22/1/25	
共用プールの乾式キャスク製作		(実績) ・乾式キャスク製作・検査 (予定) ・乾式キャスク製作・検査	調整 乾式キャスク製作・検査													【主要工程】 ・実施計画変更認可済 ('20/9/29)	
共用プールの乾式保管設備(仮設仮保管設備受入)	(実績) ・なし (予定) ・なし	現場作業 乾式保管設備(共用プール用) 検討・設計・設置工事													【主要工程】 ・乾式キャスク撤出作業開始 ('22/3)		
共用プールの乾式保管設備	(実績) ・乾式保管設備(共用プール用) 検討 (予定) ・乾式保管設備(共用プール用) 検討	検討・設計 乾式保管設備(共用プール用) 検討													継続検討中		
高線量機器取り出し	制 御 棒 等 高 線 量 機 器 取 り 出 し	(実績) ・高線量機器取り出し方法の検討 ・プール内調査 ・プール内ガレキ撤去準備 (予定) ・高線量機器取り出し方法の検討 ・プール内ガレキ撤去準備 ・プール内ガレキ撤去	検討・設計 高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作 (2022年9月完了予定)													【主要工程】 ③号機 使用済燃料プール内調査: '21/7/15~'21/10/6 ③号機 使用済燃料プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去: '21/10/7~	
現場作業 高線量機器取り出し準備 ・高線量機器取り出し方法の検討 ・高線量機器取り出し方法の検討			高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作 (2024年度完了予定)													(2024年度完了予定)	

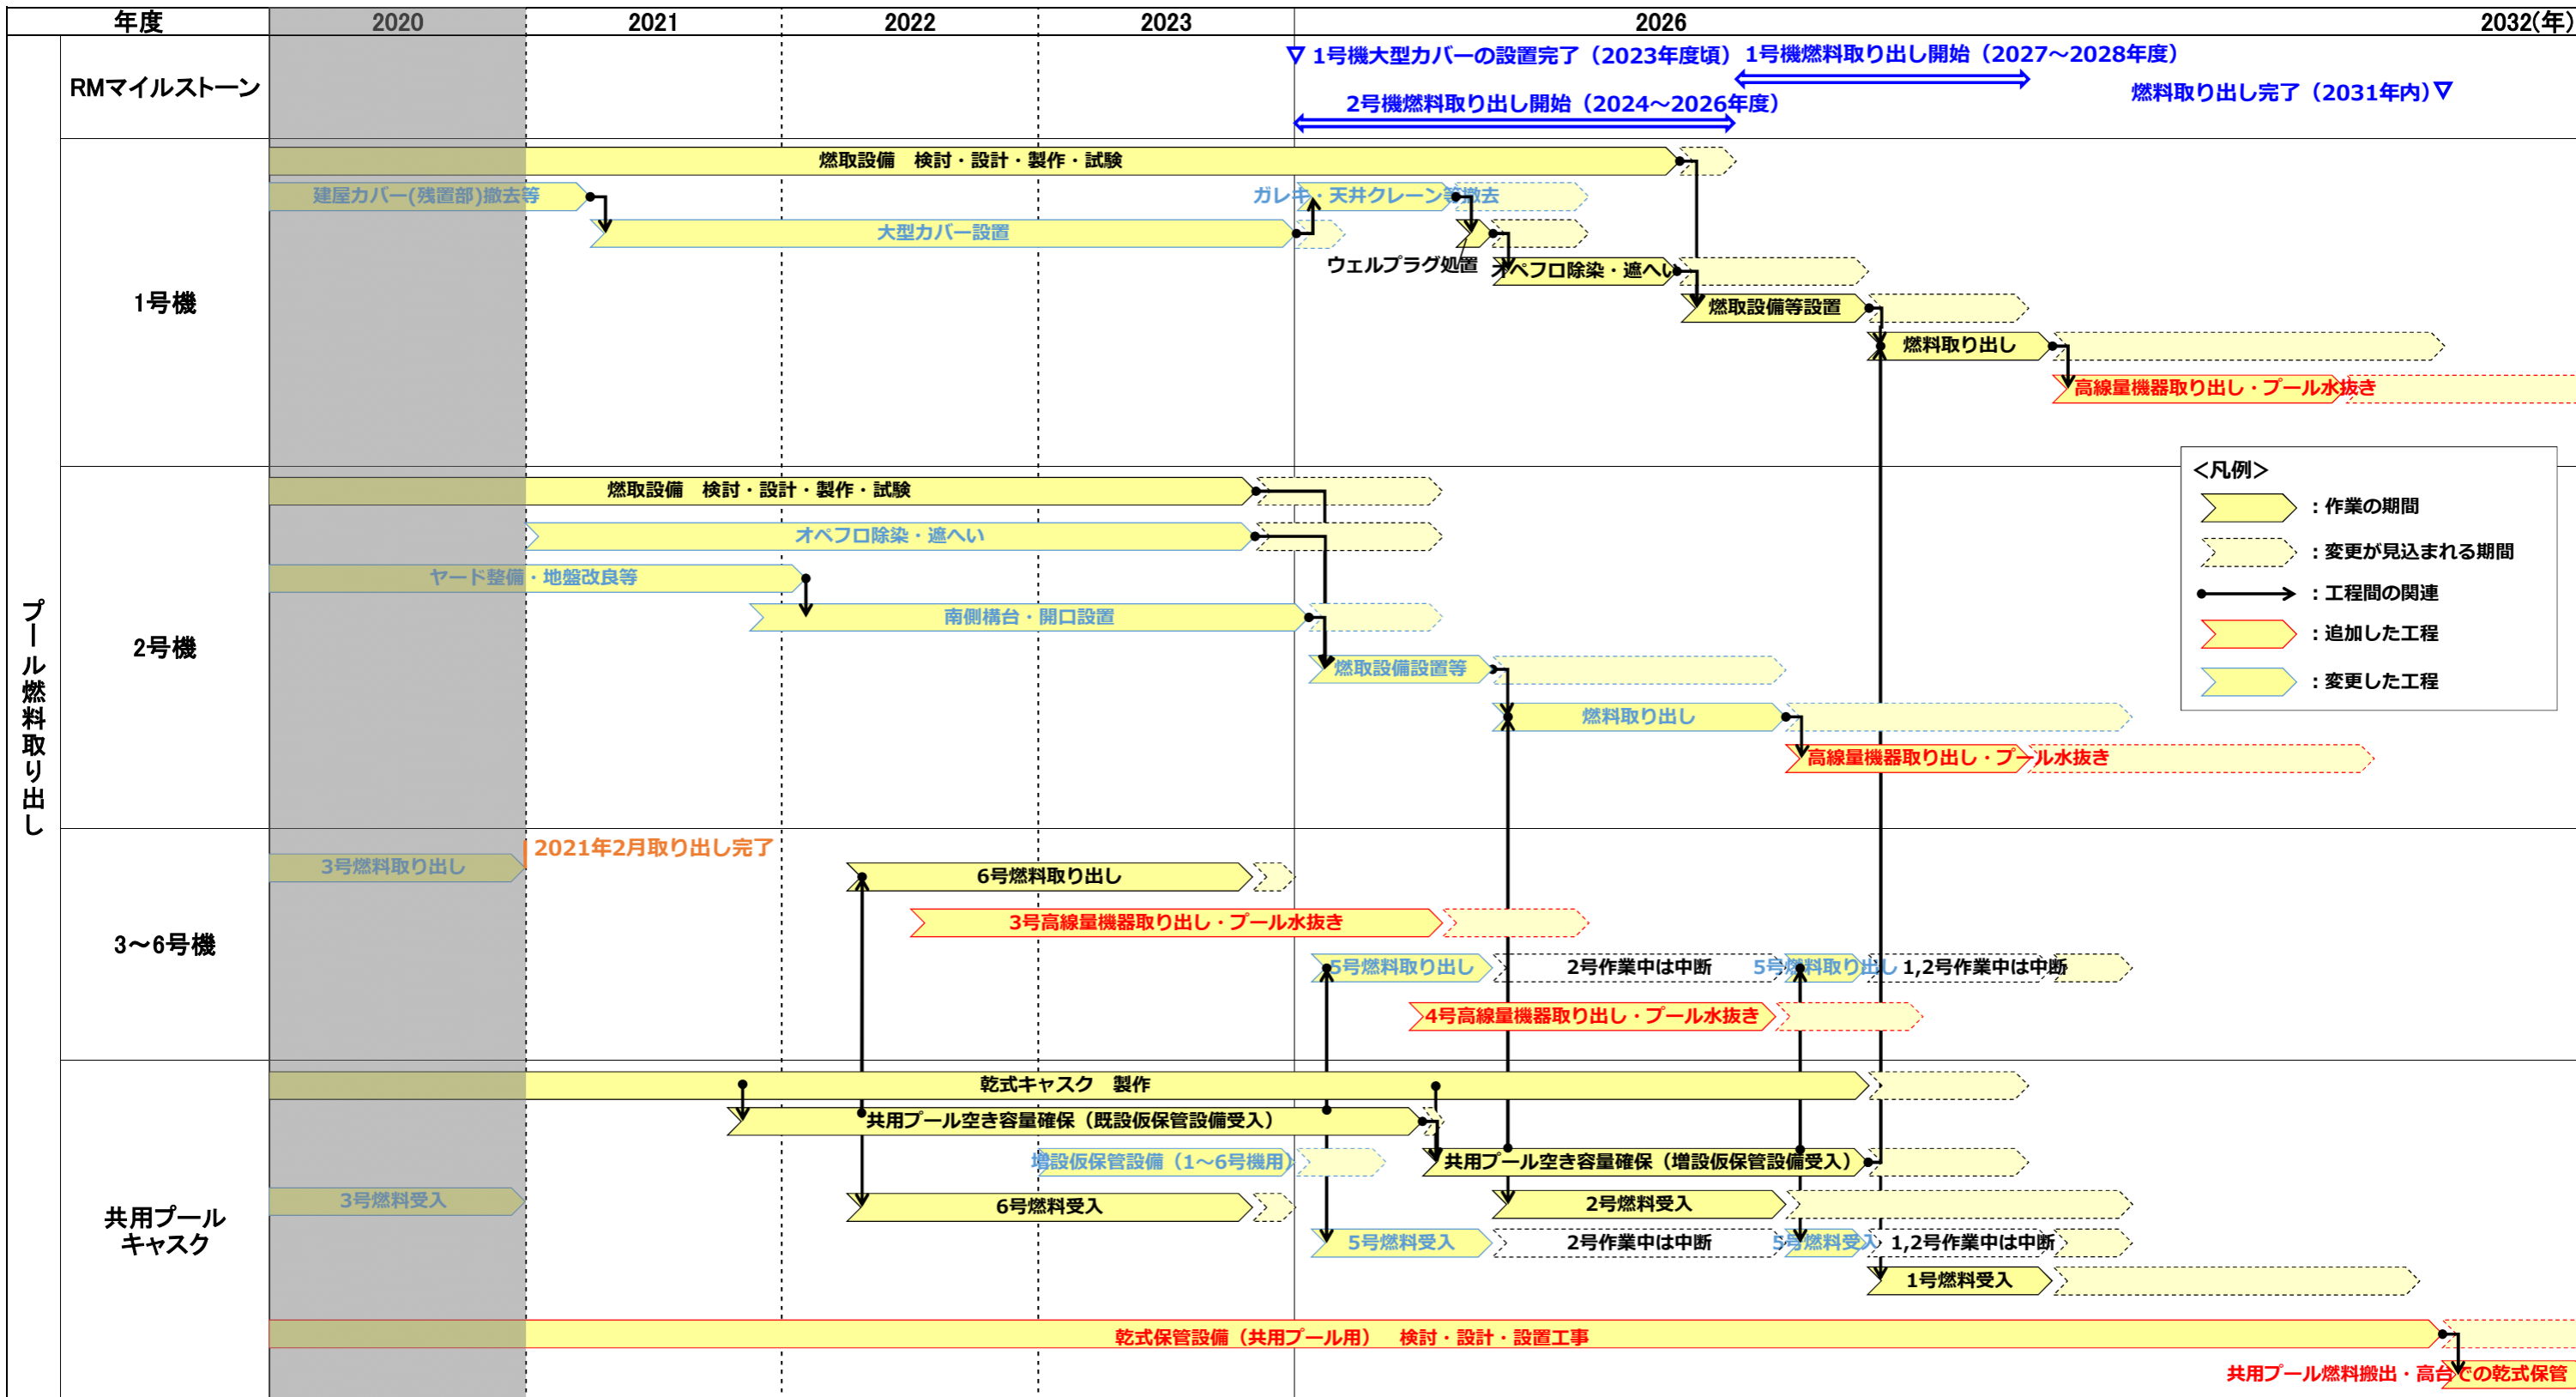

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
