


燃料デブリ取り出し準備 スケジュール

分野名	実施工程	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月以降			備考	
				14	21	28	5	12	19	26	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20		27
				日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日	日		日
原子炉建屋内環境改善	原子炉建屋内環境改善	1号機 (実績) ○建屋内環境改善(継続) (予定) ○建屋内環境改善(継続)	現場作業	建屋内環境改善 2階線量低減に向けた準備作業																					建屋内環境改善 ・2階線量低減の準備作業'20/7/20~ ・PCWAロケット配管穿孔'22/1月~2月予定 ・PCW熱交換器内取水サンプリング'22/3月予定				
		2号機 (実績) ○建屋内環境改善(継続) (予定) ○建屋内環境改善(継続)	現場作業	建屋内環境改善 R/B大物搬入口2階達へい設置																					建屋内環境改善 ・R/B大物搬入口2階達へい設置 '21/11/29~'22/1月予定				
		3号機 (実績) ○建屋内環境改善(継続) (予定) ○建屋内環境改善(継続)	現場作業	建屋内環境改善 北西エリア機器撤去および除染 機器撤去・除染																					建屋内環境改善 ・線源調査'20/2/19~5/22 原子炉建屋1階の線源調査・線源調査の実施。 ・準備作業'20/11/17~'20/12/13 ・北西エリア機器撤去'20/12/14~'21/3/22 R/B1階北西エリアの線源となつている制御室の撤去。 ・北西エリア機器撤去および除染 '21/7/12~'22/1月予定				
格納容器内水循環システムの構築	格納容器内水循環システムの構築	1号機 (実績)なし (予定)なし	現場作業																										
		2号機 (実績)なし (予定)なし	現場作業																										
		3号機 (実績) ○原子炉格納容器水位低下(継続) (予定) ○原子炉格納容器水位低下(継続)	現場作業	原子炉格納容器水位低下 取水設備設置																					・3号機原子炉格納容器内取水設備設置に係る実施計画 変更申請('21/2/1) 一補正申請('21/7/14) 一部可('21/7/27) ・取水設備設置'21/10/1~'22/3月予定				
燃料デブリ取り出し準備	燃料デブリ取り出し準備	初号機の燃料デブリ取り出しの開始 ●取り出し規模の更なる拡大(1/3号機) ●段階的な取り出し規模の拡大(2号機)	共通	検討・格納	【研究開発】PCV内部詳細調査技術の開発																					(継続実施)			
					PCVベスタル内(CRD下部、プラットフォーム上、ベスタル地下階)調査技術の開発																					(継続実施)			
					PCVベスタル外(ベスタル地下階、作業員アクセス口)調査技術の開発																					(継続実施)			
					【研究開発】RPV内部調査技術の開発																					(継続実施)			
					穴あけ技術・調査技術の開発																					(継続実施)			
					試験的取り出し技術の開発																					(継続実施)			
燃料デブリの取り出し	燃料デブリの取り出し	1号機 (実績) ○原子炉格納容器内部調査(継続) ○1/2号機SGTS配管撤去(継続) (予定) ○原子炉格納容器内部調査(継続) ○1/2号機SGTS配管撤去(継続)	現場作業	PCV内部調査 PCV内部調査装置投入に向けた作業																					(2022年8月完了予定)				
		2号機 (実績) ○原子炉格納容器内部調査(継続) (予定) ○原子炉格納容器内部調査(継続)	現場作業	PCV内部調査 PCV内部調査装置投入に向けた作業																					(2022年内完了予定)				
		3号機 (実績) ○3号機南側地上ガレキ撤去(継続) (予定) ○3号機南側地上ガレキ撤去(継続)	現場作業	3号機南側地上ガレキ撤去																									

廃炉中長期実行プラン2021

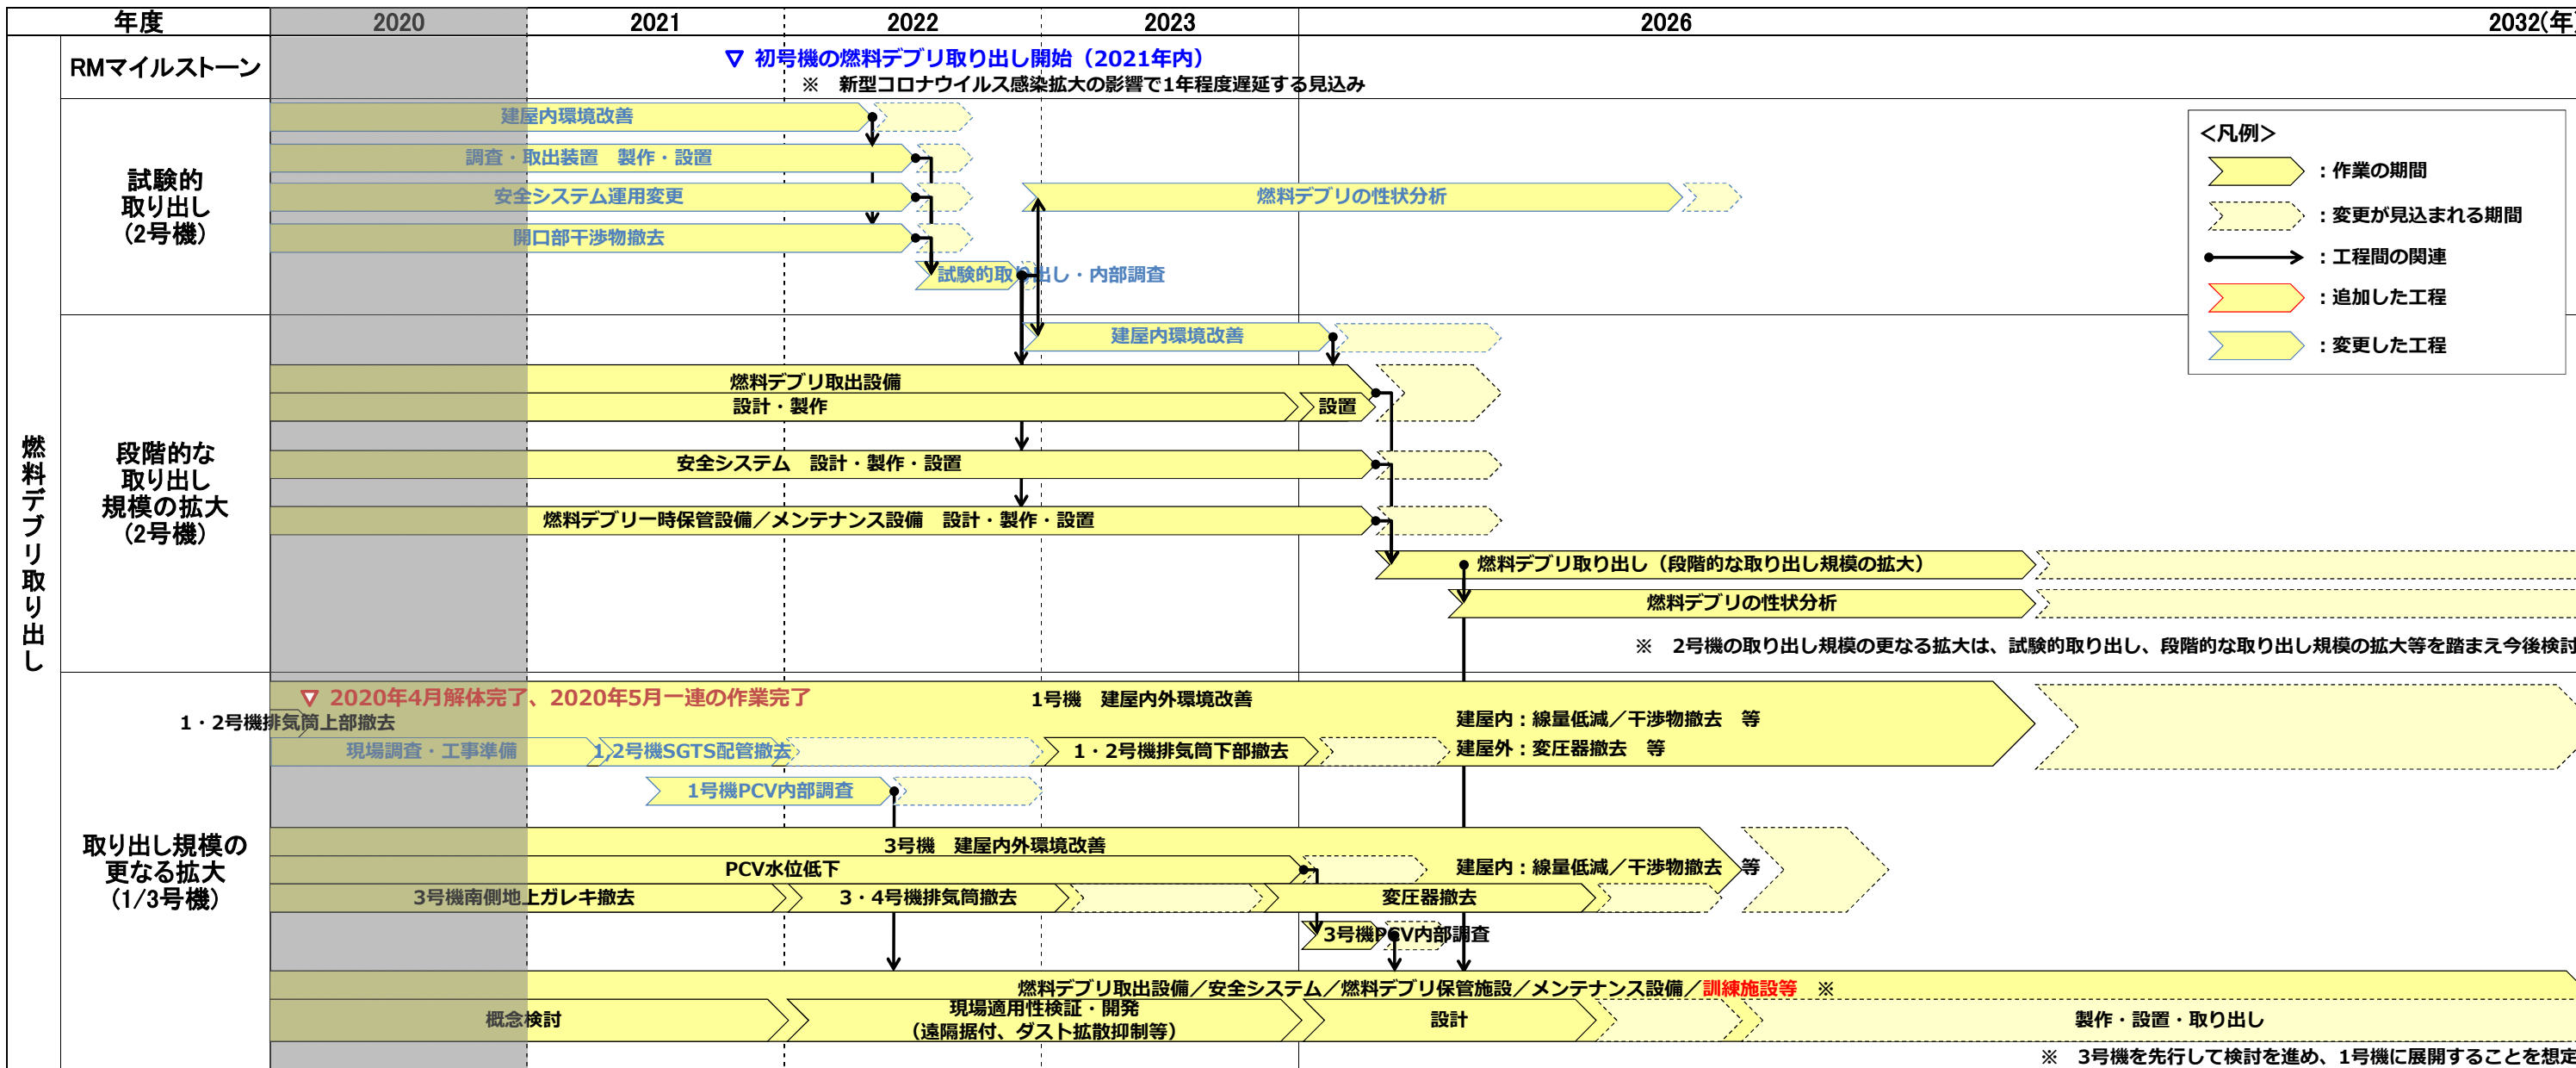

<凡例>

- 作業の期間
- 変更が見込まれる期間
- 工程間の関連
- 追加した工程
- 変更した工程

※ 2号機の取り出し規模の更なる拡大は、試験的取り出し、段階的な取り出し規模の拡大等を踏まえ今後検討

※ 3号機を先行して検討を進め、1号機に展開することを想定

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
