


分類名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	2月		3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月以降			備考							
				15	20	27	6	13	20	27	と	中	下	と	中	下	と	中	下	と	中	下	と	中	下									
●1号機大型カバ の設置完了(2023年度 頃) ●1号機燃料取り出 の開始(2027~ 2028年度) ●2号機燃料取り出 の開始(2024~ 2026年度) ●1~6号機燃料取 り出し完了(2031年 内)	カ バ ー	燃料取り出し用カバ ーの 詳細設計の検討 原子炉建屋上部の ガレキの撤去	<p>(実 績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計 現地調査等 作業ヤード整備・外壁調査 大型カバー仮設構台等設置 【構外】大型カバー換気設備他準備工 <p>(予 定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計 現地調査等 作業ヤード整備・外壁調査 大型カバー仮設構台等設置 R/B壁面アンカー設置 【構外】大型カバー換気設備他準備工 	検討・設計	大型カバー、ガレキ撤去の検討・設計																		(2026年度完了予定)	<p>【主要工程】</p> <ul style="list-style-type: none"> ガレキ撤去：'18/1/22~'20/11/24 (大型カバー設置後に再開予定) ガレキ撤去：'18/9/19~'18/12/20 機器ハッチ養生：'19/1/11~'19/3/6 屋根鉄骨分解：'19/2/5~'19/2/22 SFP周辺ガレキ撤去：'19/3/18~'20/9/18 フェルフラグ調査：'19/7/17~'19/8/26 SFP内干渉物調査：'19/8/2、'19/9/4~'6 9/20、27 フェルフラグ上のH鋼撤去：'19/8/28 FHM下部支障物撤去：'20/3/3~'20/3/14 SFPゲートカバー設置：'20/3/16~'20/3/18 SFP養生設置(準備作業含む)：'20/3/20~'20/6/18 FHM支保設置(準備作業含む)：'20/9/15~'20/10/23 天井クレーン支保設置(準備作業含む)：'20/10/28~'20/11/24 大型カバー設置(準備作業含む)：'20/11/25~'21/6/19 大型カバー仮設構台等設置：'21/8/28~ 外壁調査：'21/10/20~ 大型カバー換気設備他準備工：'21/10/19~ 【規制庁関連】 オペレーティングフロア床ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可 ('19/3/1) 大型カバー 実施計画変更申請 ('21/6/24) 大型カバー換気設備他 実施計画変更申請 ('21/8/23) <p>※○番号は、別紙配置図と対応</p>										
				検討・設計	燃料取り出し用構台の検討・設計																					(2024年度完了予定)								
				現地作業	燃料取り出し用構台の撤去			4.地盤改良			燃料取り出し用構台設置(構外ヤード整備・地組準備作業)			燃料取り出し用構台設置(土工事・基礎工事・鉄骨工事)												(2024年度完了予定)								
				現地作業	<p>(実 績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 燃料取り出し用構台の検討・設計 高層ヤード干渉物撤去 原子炉建屋オヘフ口除染(除染装置試運転・モックアップ含む) 地盤改良試験施工 地盤改良 原子炉建屋オヘフ口遮蔽体設置 原子炉建屋オヘフ口遮蔽体設置準備・モックアップ <p>(予 定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 燃料取り出し用構台の検討・設計 原子炉建屋オヘフ口除染(除染装置試運転・モックアップ含む) 原子炉建屋オヘフ口遮蔽体設置 【構外】遮蔽体設置準備・設置 燃料交換機移動 地盤改良 燃料取扱機操作室撤去 			現地作業	【構外】原子炉建屋オヘフ口遮蔽体設置(その1)(準備・モックアップ)			原子炉建屋オヘフ口遮蔽体設置(その1)(準備・設置)			燃料取扱機移動準備作業			燃料取扱機移動			燃料取扱機操作室撤去							(2022年11月完了予定)						
				現地作業	燃料取り出し設備の検討・設計			燃料取り出し設備の検討・設計																					(2026年度完了予定)					
				現地作業	燃料取り出し設備の検討・設計			燃料取り出し設備の検討・設計																					(2024年度完了予定)					
				現地作業	6号機使用済燃料の搬出			6号機使用済燃料の搬出																					使用済燃料搬出作業 (2024年完了予定)					
				●その他プール燃料 取り出し関連作業	共 用 プ ール	燃料受け入れ 乾式キャスク製作 共用プール空き容量確保(既設保管設備受入) 乾式保管設備(共用プール用)検討・設計・設置工事	<p>(実 績)</p> <ul style="list-style-type: none"> なし <p>(予 定)</p> <ul style="list-style-type: none"> なし 	現地作業	燃料受け入れ																						(2014年10月)			
								調達	乾式キャスク製作・検査			乾式キャスク製作・検査																						(20/9/29)
								現地作業	共用プール空き容量確保(既設保管設備受入)			共用プール1階天井クレーンの走行不能事象の調査・復旧に伴う延期			乾式キャスク搬出作業			乾式キャスク仮保管設備工リア増設																(2027年度完了予定)
検討・設計	乾式保管設備(共用プール用)検討							乾式保管設備(共用プール用)検討																					(2023年4月完了予定)					
検討・設計	乾式保管設備(共用プール用)検討							乾式保管設備(共用プール用)検討																					(2023年4月完了予定)					
高 線 量 機 器 取 り 出 し	制 御 棒 等 高 線 量 機 器 取 り 出 し	<p>(実 績)</p> <ul style="list-style-type: none"> 高線量機器取り出し方法の検討 プール内ガレキ撤去 <p>(予 定)</p> <ul style="list-style-type: none"> 高線量機器取り出し方法の検討 プール内ガレキ撤去 	検討・設計	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作																					(2022年9月完了予定)									
			現地作業	プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去			プール内ガレキ撤去準備・ガレキ撤去																					(2024年度完了予定)						
			検討・設計	高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作			高線量機器取り出し方法の検討、取り出し機器・容器等の設計・製作																					(2024年度完了予定)						

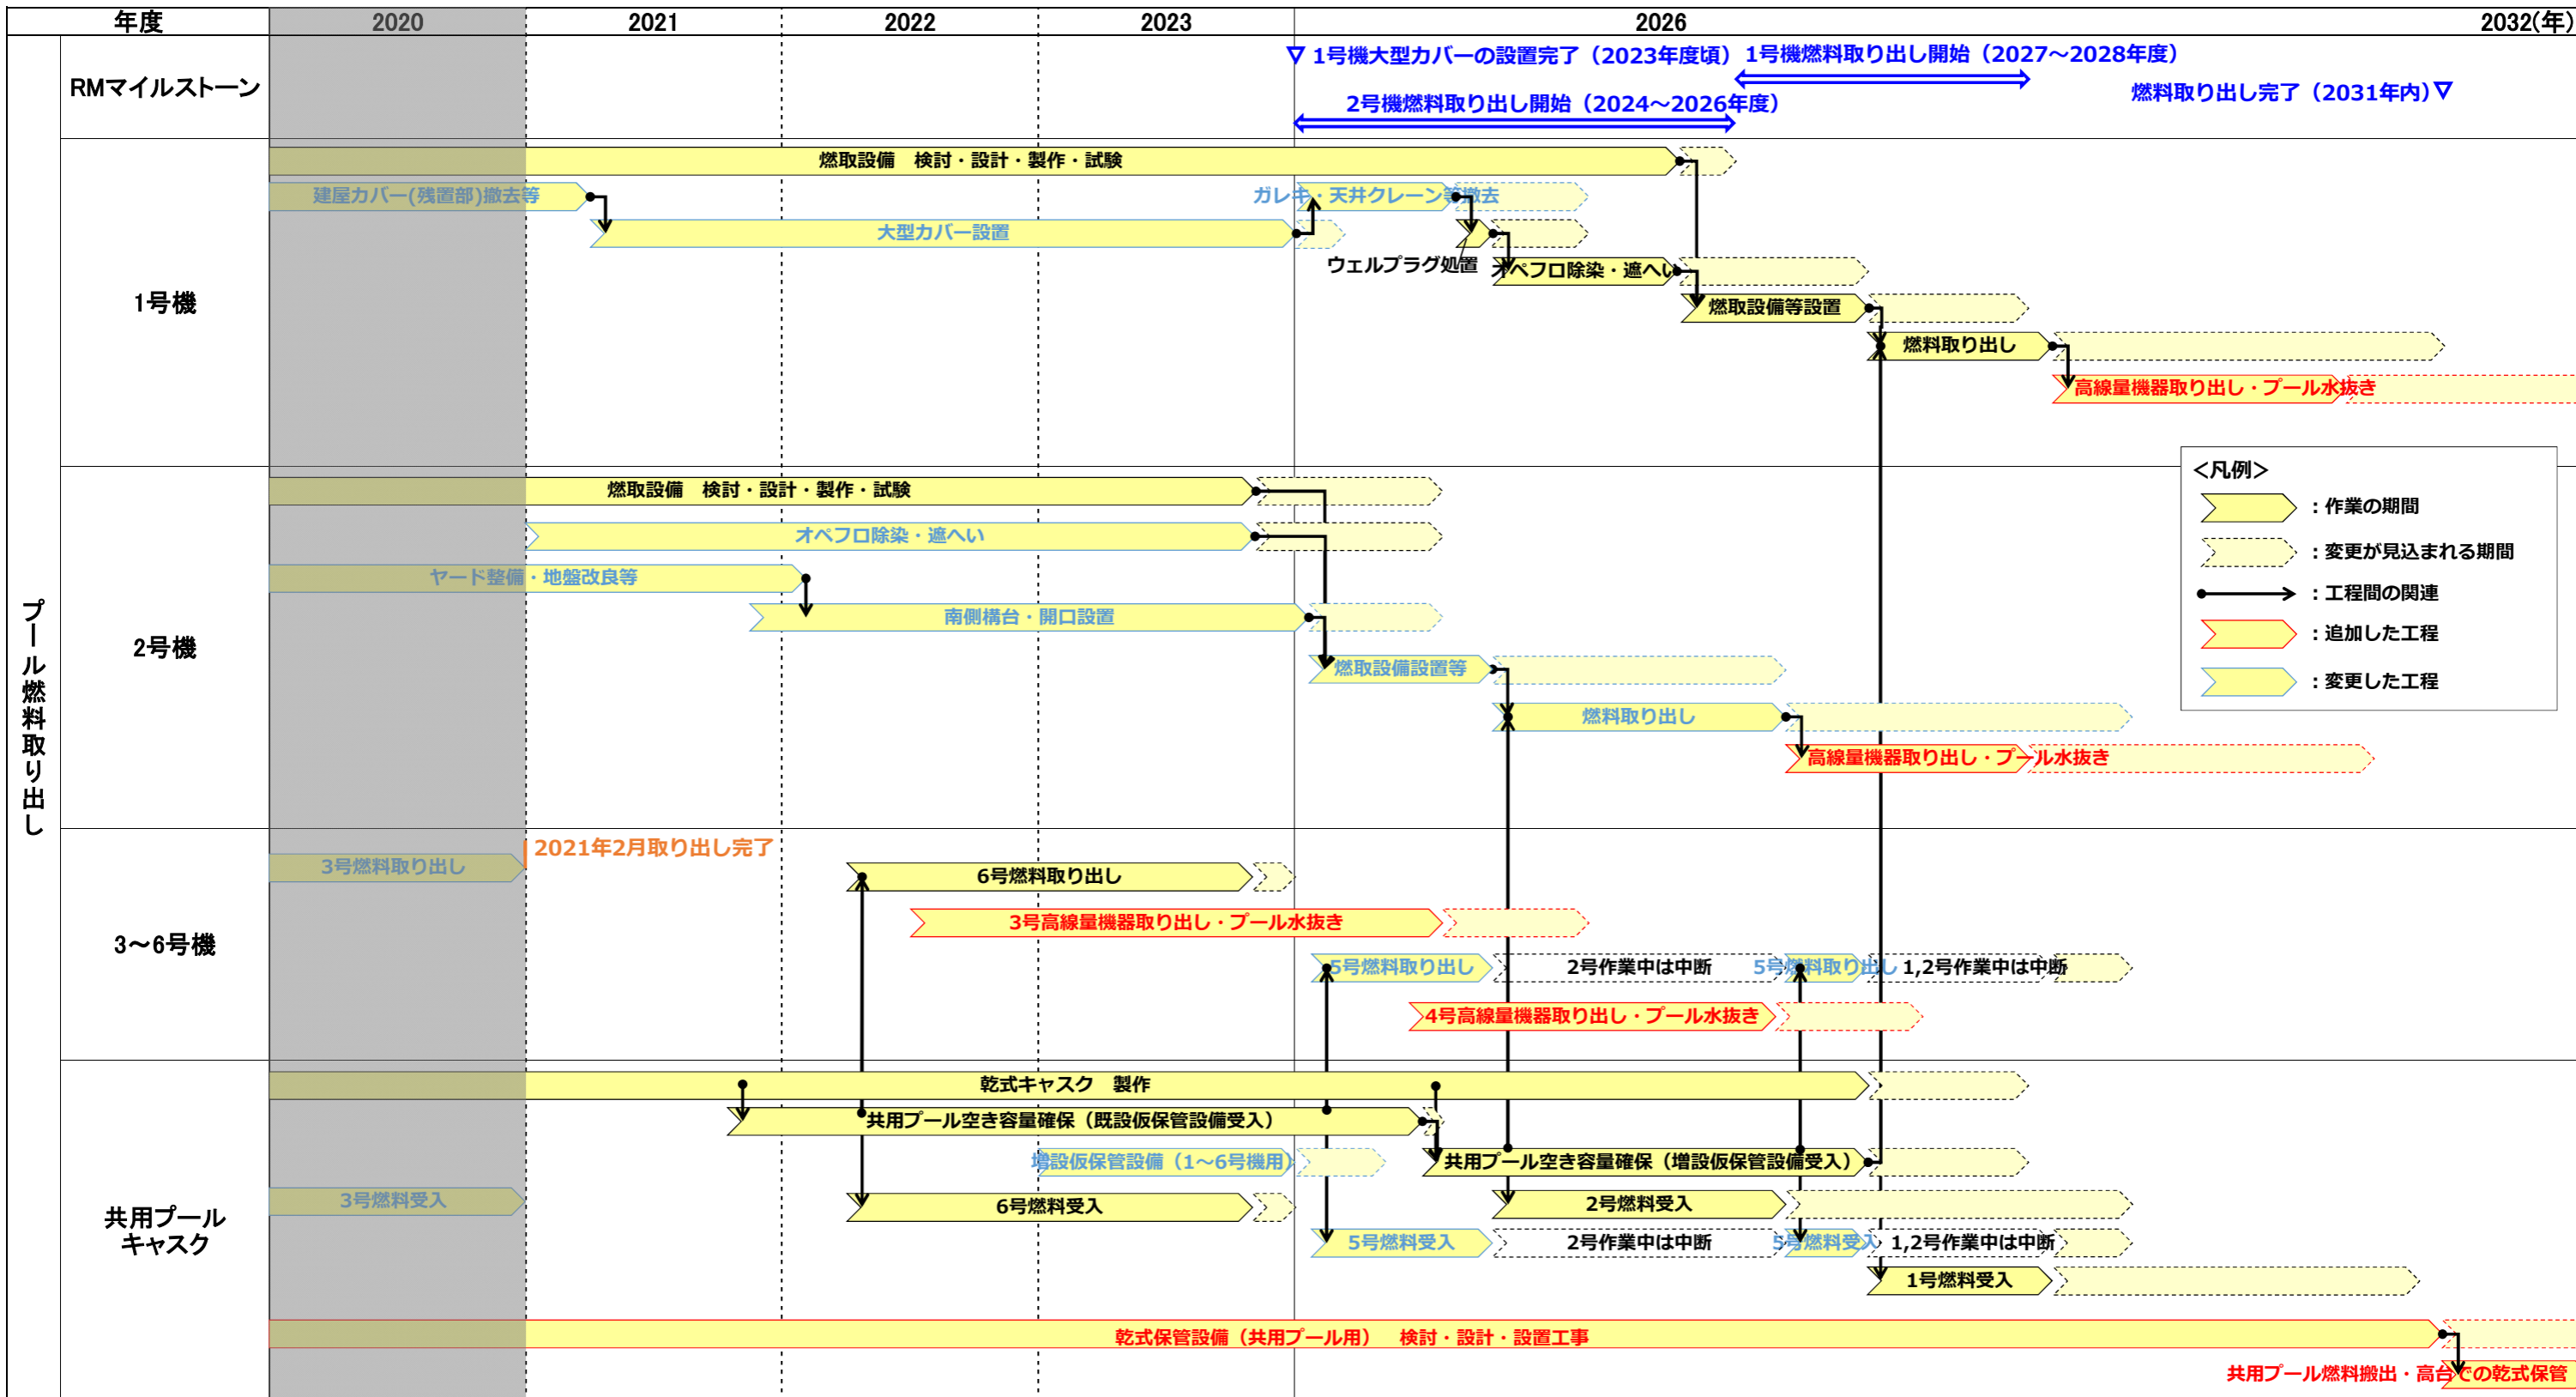

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
