

放射性廃棄物処理・処分 スケジュール


分野名	廃炉中長期実行プラン2023 目標工程	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	8月			9月				10月			11月			12月			1月			2月			3月以降			備考
					27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	
●ガレキ等の屋外一時保管解消（2028年度内）	●ガレキ等の屋外一時保管解消（2028年度内）	保管管理計画	一時保管エリアの変更	(実 績 / 予 定)	設計・設計																									
			雑固体廃棄物焼却設備	(実 績) ・年次点検 (A系) ・電気設備点検 (A系) ・冷却水循環ポンプ交換 (共通)	(予 定) ・処理運転 (A・B系) ・電気設備点検 (A・B系) ・冷却水循環ポンプ交換 (共通)	現場作業	[A系] 年次点検																							<ul style="list-style-type: none"> 2023年1月21日からB系、2月4日からA系について年次点検を実施し完了 2月10日排ガスフィルタB系の点検において腐食による損傷を確認、2月11日にA系についても同様の損傷を確認 排ガス系統各部の調査を行い、損傷部の修理は完了。A系は残りの年次点検を実施し完了 7月13日に冷却水循環ポンプAの地絡が発生、当該ポンプの交換後に運転再開予定 冷却水循環ポンプの手配を進めており、復旧は11月頃になる見通し。今後詳細工程を反映する 上位電源取替工事の工程変更に伴い、A系電源停止時期を変更 冷却水循環ポンプA不具合に伴い、B系電源停止時期を変更（空調全停止のため）
			増設雑固体廃棄物焼却設備	(実 績) ・処理運転 ・廃油ノズル清掃他 ・灰詰まり除去	(予 定) ・炉内清掃他 ・処理運転 ・電源停止	現場作業	処理運転																							<ul style="list-style-type: none"> 2023年8月末から9月頃にかけて廃油ノズルの清掃他を実施 2023年10月に炉内清掃他を実施予定 電源設備点検による停止時期を9月末～10月末から、11月末～12月下旬に変更
			除染装置 (AREVA) スラッジ	(実 績) ・スラッジ対処方法検討 ・建屋内線量低減	(予 定) ・スラッジ対処方法検討 ・建屋内線量低減	設計・設計	スラッジ対処方法検討																							<ul style="list-style-type: none"> ダスト閉じ込め機能の追加に伴い、筐体強度/耐震評価の見直しが必要になったため、詳細工程について調整中
			減容処理設備	(実 績) ・実施計画変更 ・製作	(予 定) ・製作 ・実施計画変更 ・現地工事、風量調整 ・使用前検査 ・サーベイ、管理区域設定 ・運用	設計・設計	実施計画変更																							<ul style="list-style-type: none"> 空調バランス不具合により、原因調査および対策を検討 2024年1月竣工見込み
			固体廃棄物貯蔵庫第10棟	(実 績) ・地盤改良工事 (10-C棟) ・建築工事 (10-A棟) ・建築工事 (10-B棟)	(予 定) ・地盤改良工事 (10-C棟) ・建築工事 (10-A棟) ・建築工事 (10-B棟) ・建築工事 (10-C棟)	現場作業	地盤改良工事 (10-C棟)																							<ul style="list-style-type: none"> 2024年4月：10-A棟竣工 2024年7月：10-B棟竣工 2025年3月：10-C棟竣工 2023年2月10日に実施計画申請の一部修正を実施 2023年2月21日に実施計画変更認可 2023年3月29日に建築工事着工
			固体廃棄物貯蔵庫第11棟	(実 績 / 予 定) ・設計検討		設計・設計	設計検討																							<ul style="list-style-type: none"> 2021年2月13日の地震に関する影響評価を踏まえ、追加の耐震評価を実施予定（耐震ガラスの考え方について検討中）
			大型廃棄物保管庫	(実 績) ・設計検討	(予 定) ・設計検討 ・建屋補強工事 ・クレーン設置工事	設計・設計	設計検討 (建屋補強、吸着塔架台)																							<ul style="list-style-type: none"> 2/13の地震に関する影響評価を踏まえ、2023年度内部工事開始、2024年度吸着塔受入開始、2025年度耐震補強完了を目標とする
			スラリー安定化処理設備	(実 績) ・安定化処理設備の設計方針検討	(予 定) ・適用性、成立性確認 ・安定化処理設備の詳細設計検討 ・建屋現地工事	設計・設計	安定化処理設備の設計検討																							<ul style="list-style-type: none"> 2022年9月12日 第102回監視・評価検討会において示された「審査上の観点」を踏まえ、設計見直しを実施中

分野名	廃炉中長期実行プラン2023 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	8月			9月				10月			11月			12月			1月			2月			3月以降			備考
					27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	1	8	15	22	29	6	13	20	27	4		
●その他廃棄物対策関連作業	3. 固体廃棄物の性状把握	処理・処分計画		(実績)	設計・設計																									
				(予定)	現場作業	計画に基づいたサンプリングの実施																						(採取継続)		
●分析施設	4. 分析・研究施設の設置	処理・処分計画	JAEA分析・研究施設第1棟	(実績)	現場作業																									
			(予定)	現場作業	放射線物質を用いた分析作業(分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む)																						(分析継続)			
			総合分析施設	(実績/予定)	設計・設計																				(2024年8月完了予定)					

・水処理二次廃棄物：ALPS吸着材等を分析中
・これまでの分析結果は以下のウェブページにまとめられている
リスト：https://clads.jaea.go.jp/rd/tech-info.html
検索：https://frandl-db.jaea.go.jp/FRAnDLI/

・2022年6月竣工

廃炉中長期実行プラン2023

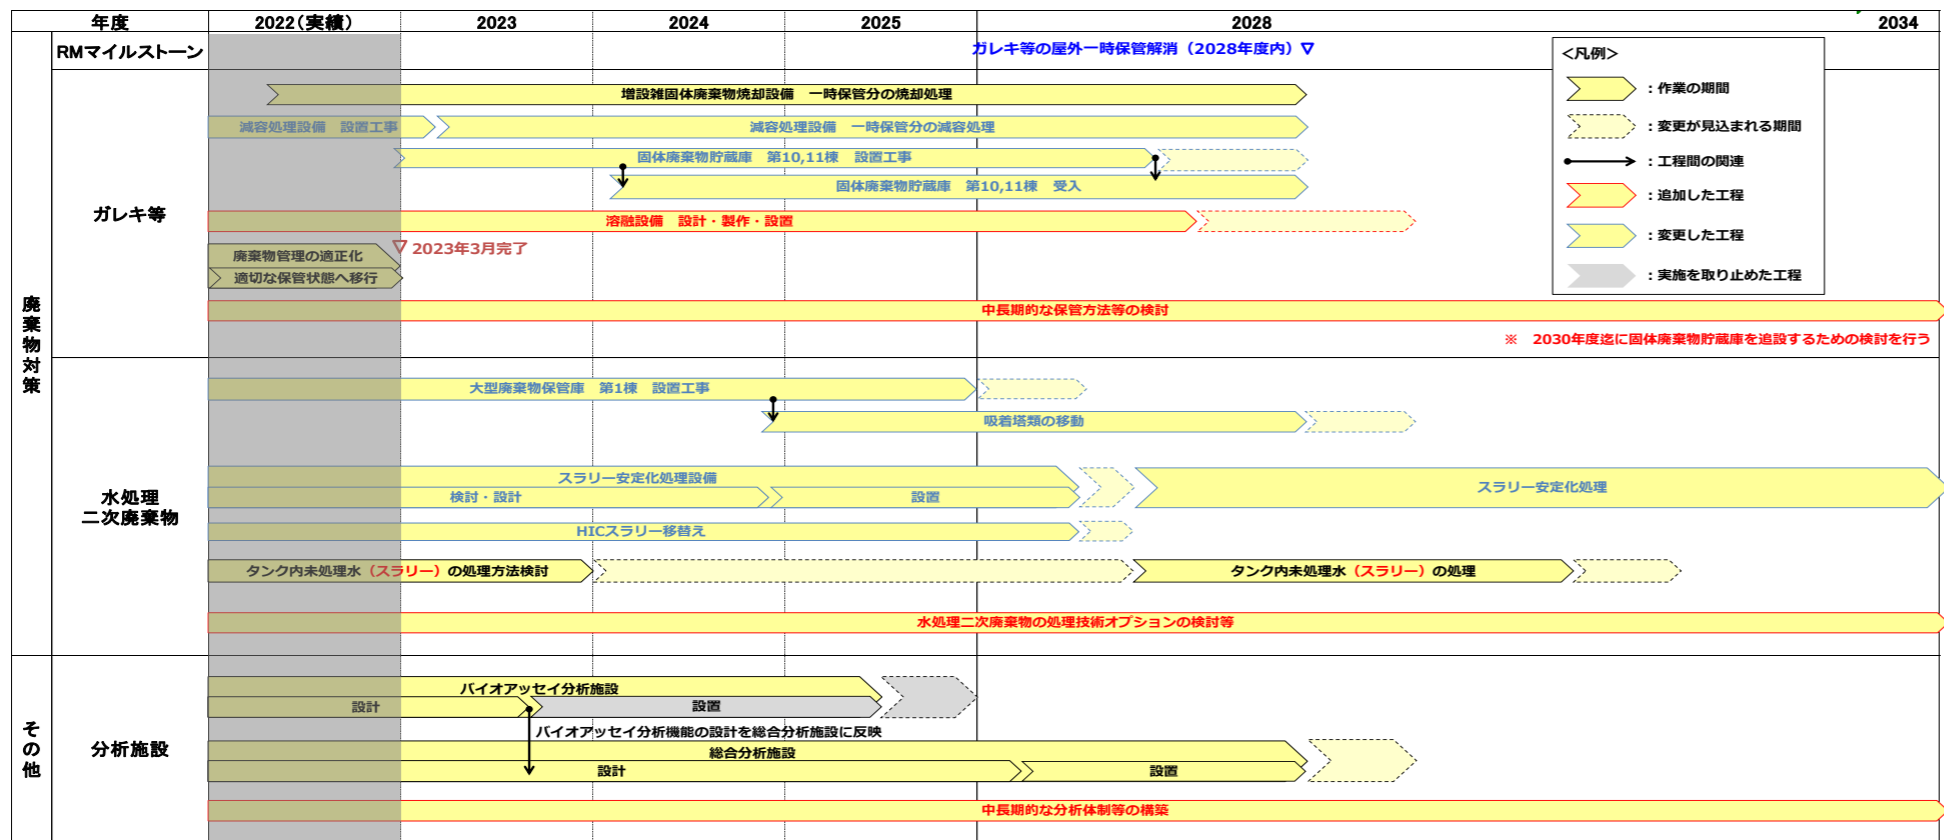

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
