


汚染水対策スケジュール (2/3)

分野	括り	対象設備・作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月以降	備考
				14	21	28	5	12	19	26	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中		
汚染水対策分野	●タンク関連	H4エリアNo. 5タンクからの漏えい対策	(実績・予定) ・汚染の拡散状況把握	現場作業	モニタリング																			(継続実施)		
		タンク解体	(予定) ・Eエリアフランジタンク解体工事 : 49基解体予定 (2025年12月頃) ・Eエリアフランジタンク (D1) 内の残水回収 (スラッジ含む) (実績) 解体基数 47基/49基	現場作業	Eエリアフランジタンク解体工事																			(2025年度タンク解体完了予定*) *D1, D2タンク以外は解体完了済み	2018年9月10日 Eエリアにおける中低濃度タンクの撤去等について (実施計画変更認可) 2024年7月: D2タンク解体完了予定 2025年12月頃: Eエリアフランジタンク解体完了予定	
			(実績) 解体基数 47基/49基	現場作業	Eエリアフランジタンク (D1・D2) 内の残水回収																			(2024年12月回収完了予定)	D1タンク残水回収によりタンク底部でスラッジが確認されたことからスラッジ回収完了時期を24年4月から24年12月に見直し	
	●自然災害対策	津波対策	○サブドレン集水設備高台機能移転 (実績・予定) ろ過水タンク西側整備工事実施 (完了) 地盤改良 (完了) 集水設備設置 (10基)	現場作業	ろ過水タンク西側整備 (ろ過水配管リルート工事完了), 地盤改良工事 (地盤改良完了), 集水設備設置 (10基) 5月~着手																	(2024年度工事完了予定)	集水設備設置 10基 (5月~着手) 2024年4月~タンク設置作業再開 工事中 SD-7, SD-10, SD-8, SD-9, SD-4, SD-1, SD-5 鋼板組立→溶接済み、天蓋設置済み			
																								2023年10月20日 サブドレン集水設備及び地下ドレン設備の津波対策に伴うTP.335m高への移設について (実施計画変更申請)		

廃炉中長期実行プラン2024

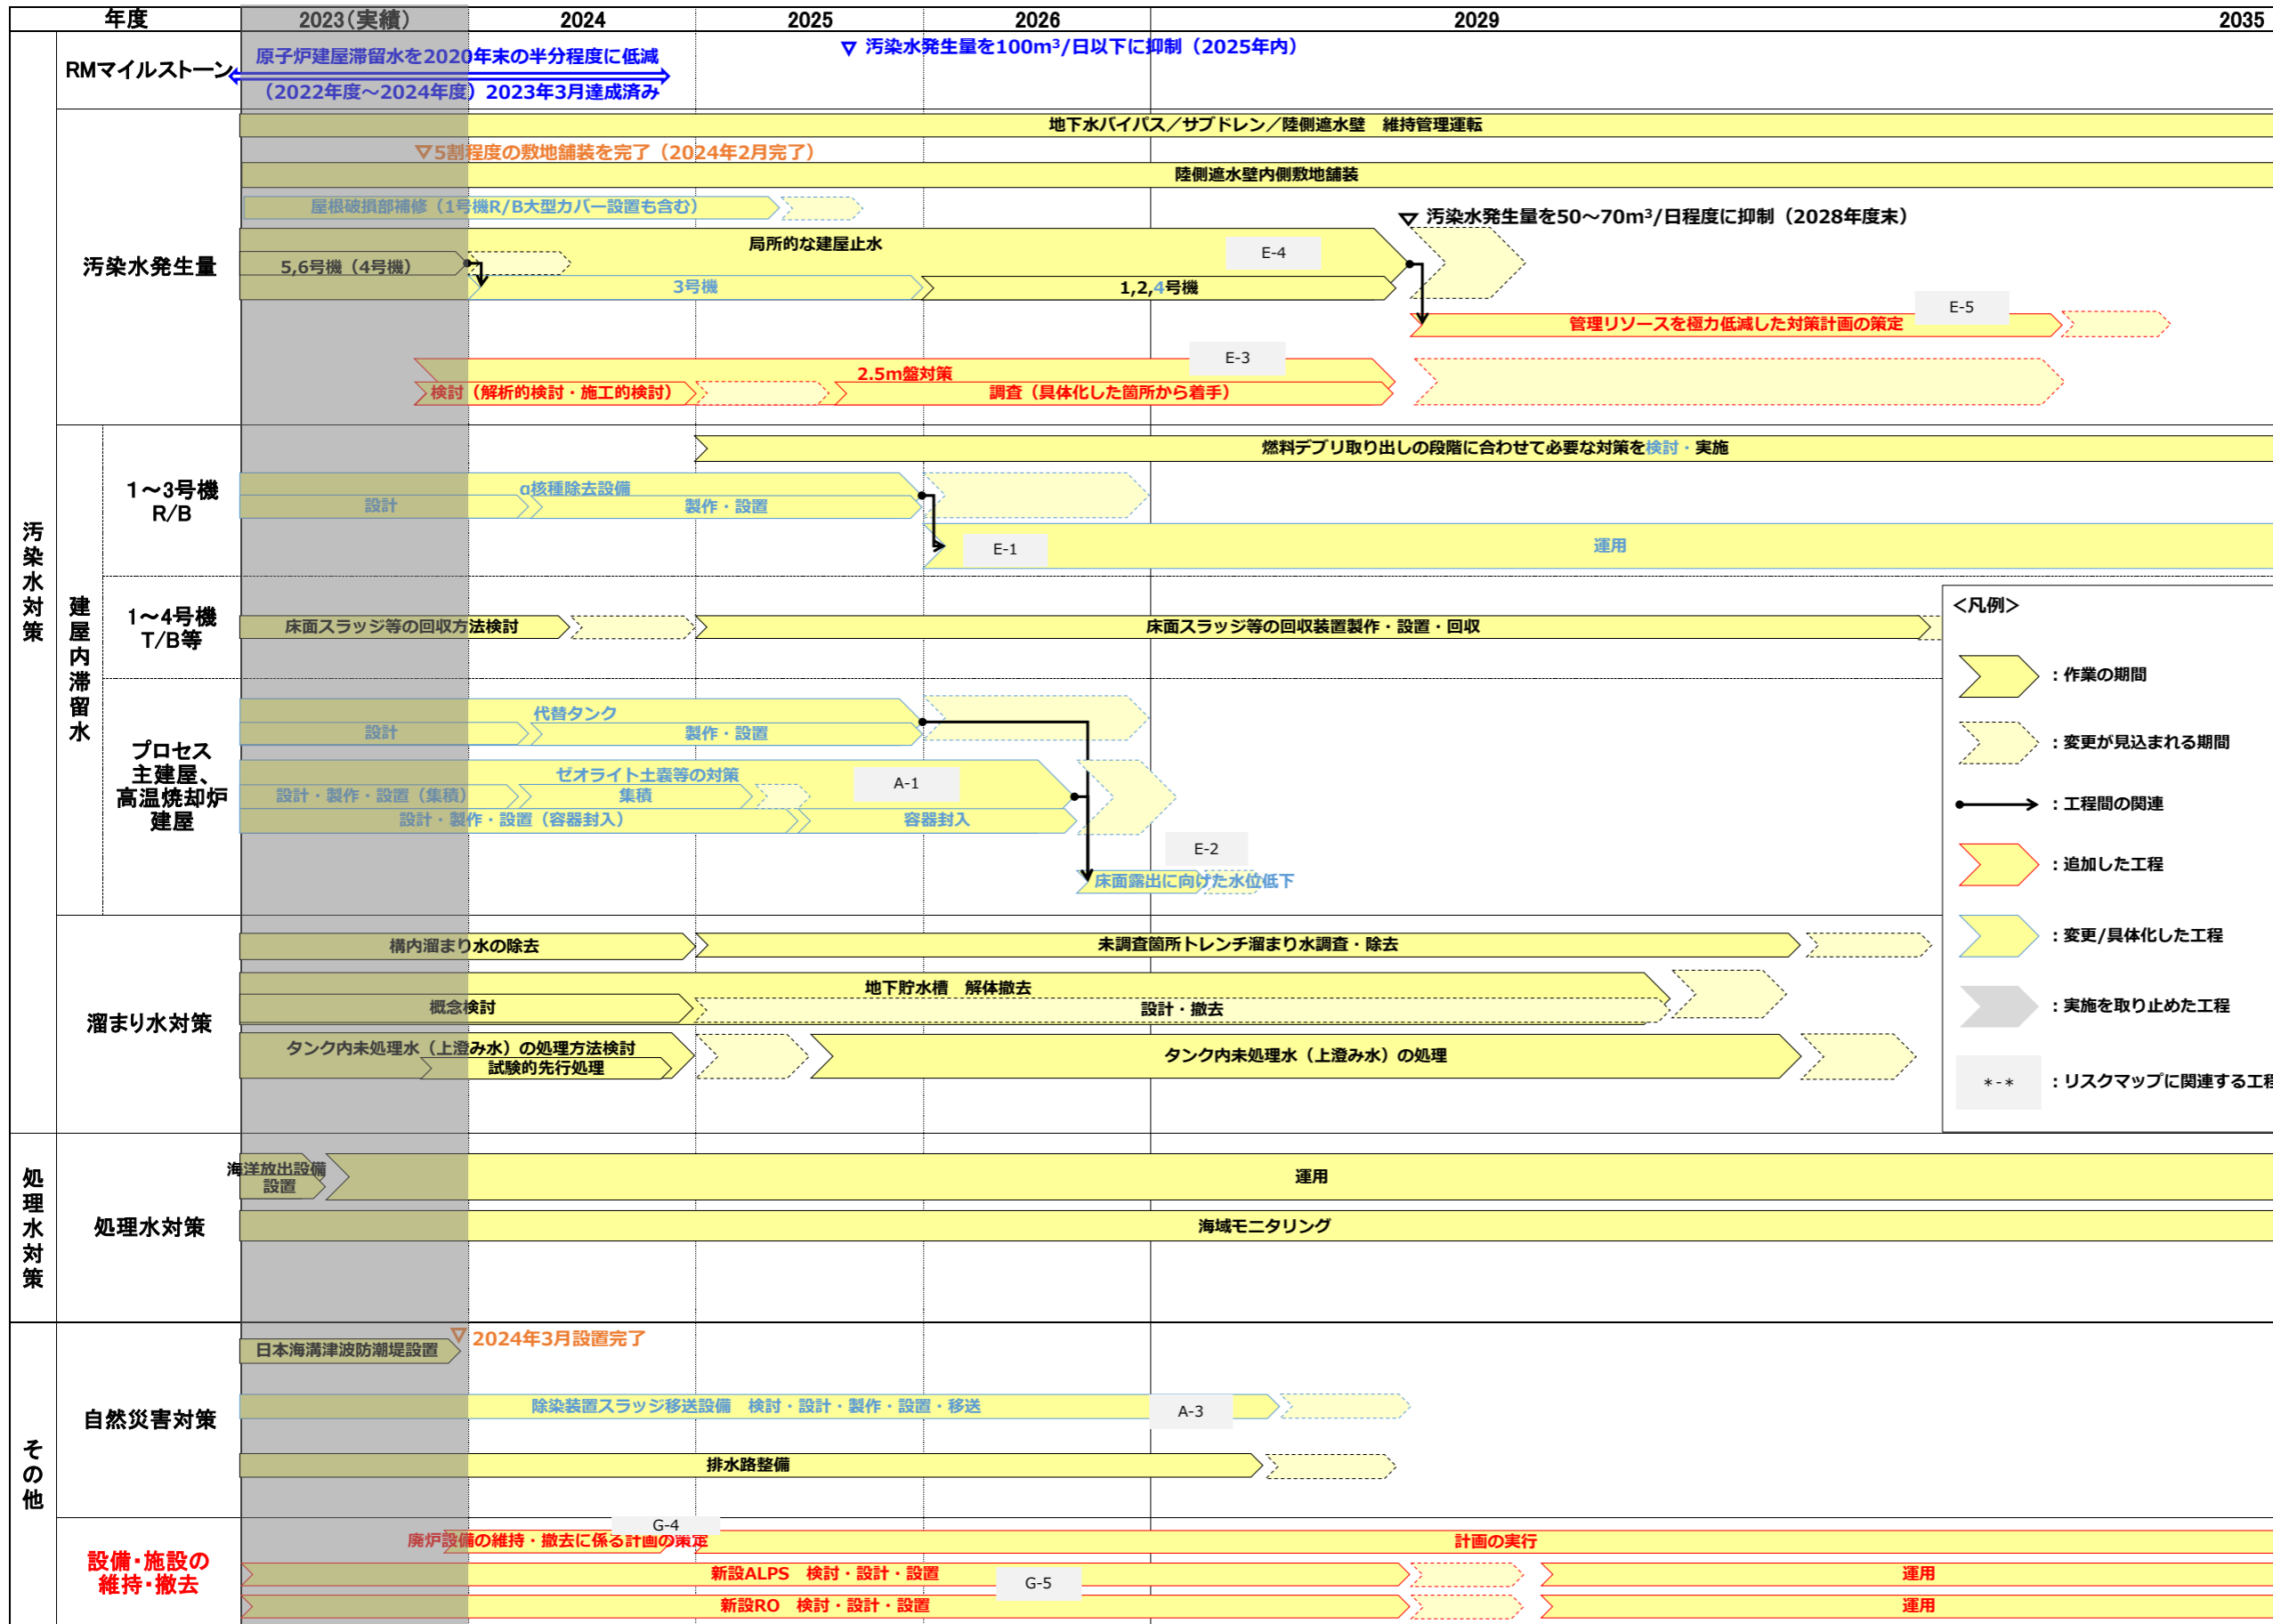

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
