


使用済燃料プール対策 スケジュール

分野名	内容	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	7月		8月				9月		10月	11月	12月	1月	2月 以降	備考		
				21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12		19	26
●1号機大型カバ ●1号機燃料取り出し ●2号機燃料取り出し ●1~6号機燃料取り出し完了	燃料取り出し用カバ の 詳細設計の検討 原子炉建屋上部の ガレキの撤去 燃料取り出し用カバ の 設置工事	1号機 (実 績) ・大型カバ、ガレキ撤去の検討・設計 ・現地調査等 ・作業ヤード整備・外壁調査 ・R/B壁面アンカー等設置 ・本体鉄骨(下部架構)設置 ・【構外】大型カバ換気設備他準備工事  (予 定) ・大型カバ、ガレキ撤去の検討・設計 ・現地調査等 ・作業ヤード整備・外壁調査 ・R/B壁面アンカー等設置 ・本体鉄骨(下部架構)設置 ・R/B外周鉄骨撤去 ・【構外】大型カバ換気設備他準備工事 ・【構内】大型カバ換気設備他設置工事	検討・設計	大型カバ、ガレキ撤去の検討・設計 →(2025年度完了予定)															
			現場作業	①現地調査等(13/7/25~) →(2025年度完了予定) ②作業ヤード整備、構外ヤード地組、外壁調査、R/B外周鉄骨撤去等 →(2025年度完了予定) ③R/B壁面アンカー設置、ベースプレート設置 →(2025年度完了予定) ④本体鉄骨建方等 →(2025年度完了予定) 【構外】大型カバ換気設備他準備工事 →(2025年度完了予定) 【構内】大型カバ換気設備他設置工事 →(2025年度完了予定)															
			現場作業	【構外】大型カバ換気設備他設置工事 →(2025年度完了予定) 【構内】大型カバ換気設備他設置工事 →(2025年度完了予定)															
			現場作業	【構内】大型カバ換気設備他設置工事 →(2025年度完了予定) 【規格庁関連】 ・オペレーティングフロア床下ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可(19/3/1) ・大型カバ換気設備他 実施計画変更認可(23/3/23) ・大型カバ換気設備他 実施計画変更認可(22/10/27) ・燃料取扱設備他 実施計画変更申請(24/3/26) ※○番号は、別紙配置図と対応															
●1号機燃料取り出し ●2号機燃料取り出し ●1~6号機燃料取り出し完了	燃料取り出し用カバ の 詳細設計の検討 原子炉建屋上部の ガレキの撤去 燃料取り出し用カバ の 設置工事	2号機 (実 績) ・【構外】ランウェイガダ設置 ・【鉄骨地組】 ・R/B南側外壁開口設置 (準備作業含む)  (予 定) ・【構外】ランウェイガダ設置 ・【鉄骨地組】 ・R/B南側外壁開口設置 (準備作業含む) ・ランウェイガダ設置	現場作業	【構外】ランウェイガダ設置(鉄骨地組) →(2025年度完了予定) ④R/B南側外壁開口設置(準備作業含む) →(2025年度完了予定) ④ランウェイガダ設置 →(2025年度完了予定) 最新工程に見直し (2025年3月完了予定)															
			現場作業	【規格庁関連】 ・オペレーティングフロア床下ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可(17/12/21) ・燃料取り出し用構台・付帯設備 実施計画変更認可(22/4/22) ・燃料取扱設備 実施計画変更認可(22/12/23) ・南側外壁開口設置 実施計画変更認可(24/1/15) ※○番号は、別紙配置図と対応															
			現場作業	【規格庁関連】 ・オペレーティングフロア床下ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可(17/12/21) ・燃料取り出し用構台・付帯設備 実施計画変更認可(22/4/22) ・燃料取扱設備 実施計画変更認可(22/12/23) ・南側外壁開口設置 実施計画変更認可(24/1/15) ※○番号は、別紙配置図と対応															
			現場作業	【規格庁関連】 ・オペレーティングフロア床下ガレキの一部撤去等 実施計画変更認可(17/12/21) ・燃料取り出し用構台・付帯設備 実施計画変更認可(22/4/22) ・燃料取扱設備 実施計画変更認可(22/12/23) ・南側外壁開口設置 実施計画変更認可(24/1/15) ※○番号は、別紙配置図と対応															
●その他プール燃料 取り出し関連作業	燃料受け入れ 乾式キャスク製作 共用プール 共用プール空き容量確保 (仮設仮保管設備受入) 乾式保管設備(共用プール 用) 検討・設計・設置工事 制御棒等高線量機器 取り出し	(実 績) ・使用済燃料受け入れ (予 定) ・使用済燃料受け入れ  (実 績) ・乾式キャスク製作・検査 (予 定) ・乾式キャスク製作・検査  (実 績) ・乾式キャスク搬出作業 ・乾式キャスク仮保管設備エリア増設 (予 定) ・乾式キャスク搬出作業 ・乾式キャスク仮保管設備エリア増設  (実 績) ・乾式保管設備(共用プール用) 検討 (予 定) ・乾式保管設備(共用プール用) 検討  (実 績) ・高線量機器取り出し方法の検討 ・フル内ガレキ撤去 (予 定) ・高線量機器取り出し方法の検討 ・フル内ガレキ撤去 ・高線量機器取り出し  (実 績) ・高線量機器取り出し方法の検討 (予 定) ・高線量機器取り出し方法の検討 ・高線量機器取り出し	現場作業	使用済燃料搬出作業 →(2025完了予定) 使用済燃料受け入れ作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク製作・検査 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク搬出作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク仮保管設備エリア増設工事 →(2025年度完了予定)															
			現場作業	使用済燃料搬出作業 →(2025完了予定) 使用済燃料受け入れ作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク製作・検査 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク搬出作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク仮保管設備エリア増設工事 →(2025年度完了予定)															
			現場作業	使用済燃料搬出作業 →(2025完了予定) 使用済燃料受け入れ作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク製作・検査 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク搬出作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク仮保管設備エリア増設工事 →(2025年度完了予定)															
			現場作業	使用済燃料搬出作業 →(2025完了予定) 使用済燃料受け入れ作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク製作・検査 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク搬出作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク仮保管設備エリア増設工事 →(2025年度完了予定)															
●その他プール燃料 取り出し関連作業	燃料受け入れ 乾式キャスク製作 共用プール 共用プール空き容量確保 (仮設仮保管設備受入) 乾式保管設備(共用プール 用) 検討・設計・設置工事 制御棒等高線量機器 取り出し	(実 績) ・使用済燃料受け入れ (予 定) ・使用済燃料受け入れ  (実 績) ・乾式キャスク製作・検査 (予 定) ・乾式キャスク製作・検査  (実 績) ・乾式キャスク搬出作業 ・乾式キャスク仮保管設備エリア増設 (予 定) ・乾式キャスク搬出作業 ・乾式キャスク仮保管設備エリア増設  (実 績) ・乾式保管設備(共用プール用) 検討 (予 定) ・乾式保管設備(共用プール用) 検討  (実 績) ・高線量機器取り出し方法の検討 ・フル内ガレキ撤去 (予 定) ・高線量機器取り出し方法の検討 ・フル内ガレキ撤去 ・高線量機器取り出し  (実 績) ・高線量機器取り出し方法の検討 (予 定) ・高線量機器取り出し方法の検討 ・高線量機器取り出し	現場作業	使用済燃料搬出作業 →(2025完了予定) 使用済燃料受け入れ作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク製作・検査 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク搬出作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク仮保管設備エリア増設工事 →(2025年度完了予定)															
			現場作業	使用済燃料搬出作業 →(2025完了予定) 使用済燃料受け入れ作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク製作・検査 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク搬出作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク仮保管設備エリア増設工事 →(2025年度完了予定)															
			現場作業	使用済燃料搬出作業 →(2025完了予定) 使用済燃料受け入れ作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク製作・検査 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク搬出作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク仮保管設備エリア増設工事 →(2025年度完了予定)															
			現場作業	使用済燃料搬出作業 →(2025完了予定) 使用済燃料受け入れ作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク製作・検査 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク搬出作業 →(2025年度完了予定) 乾式キャスク仮保管設備エリア増設工事 →(2025年度完了予定)															

廃炉中長期実行プラン2024

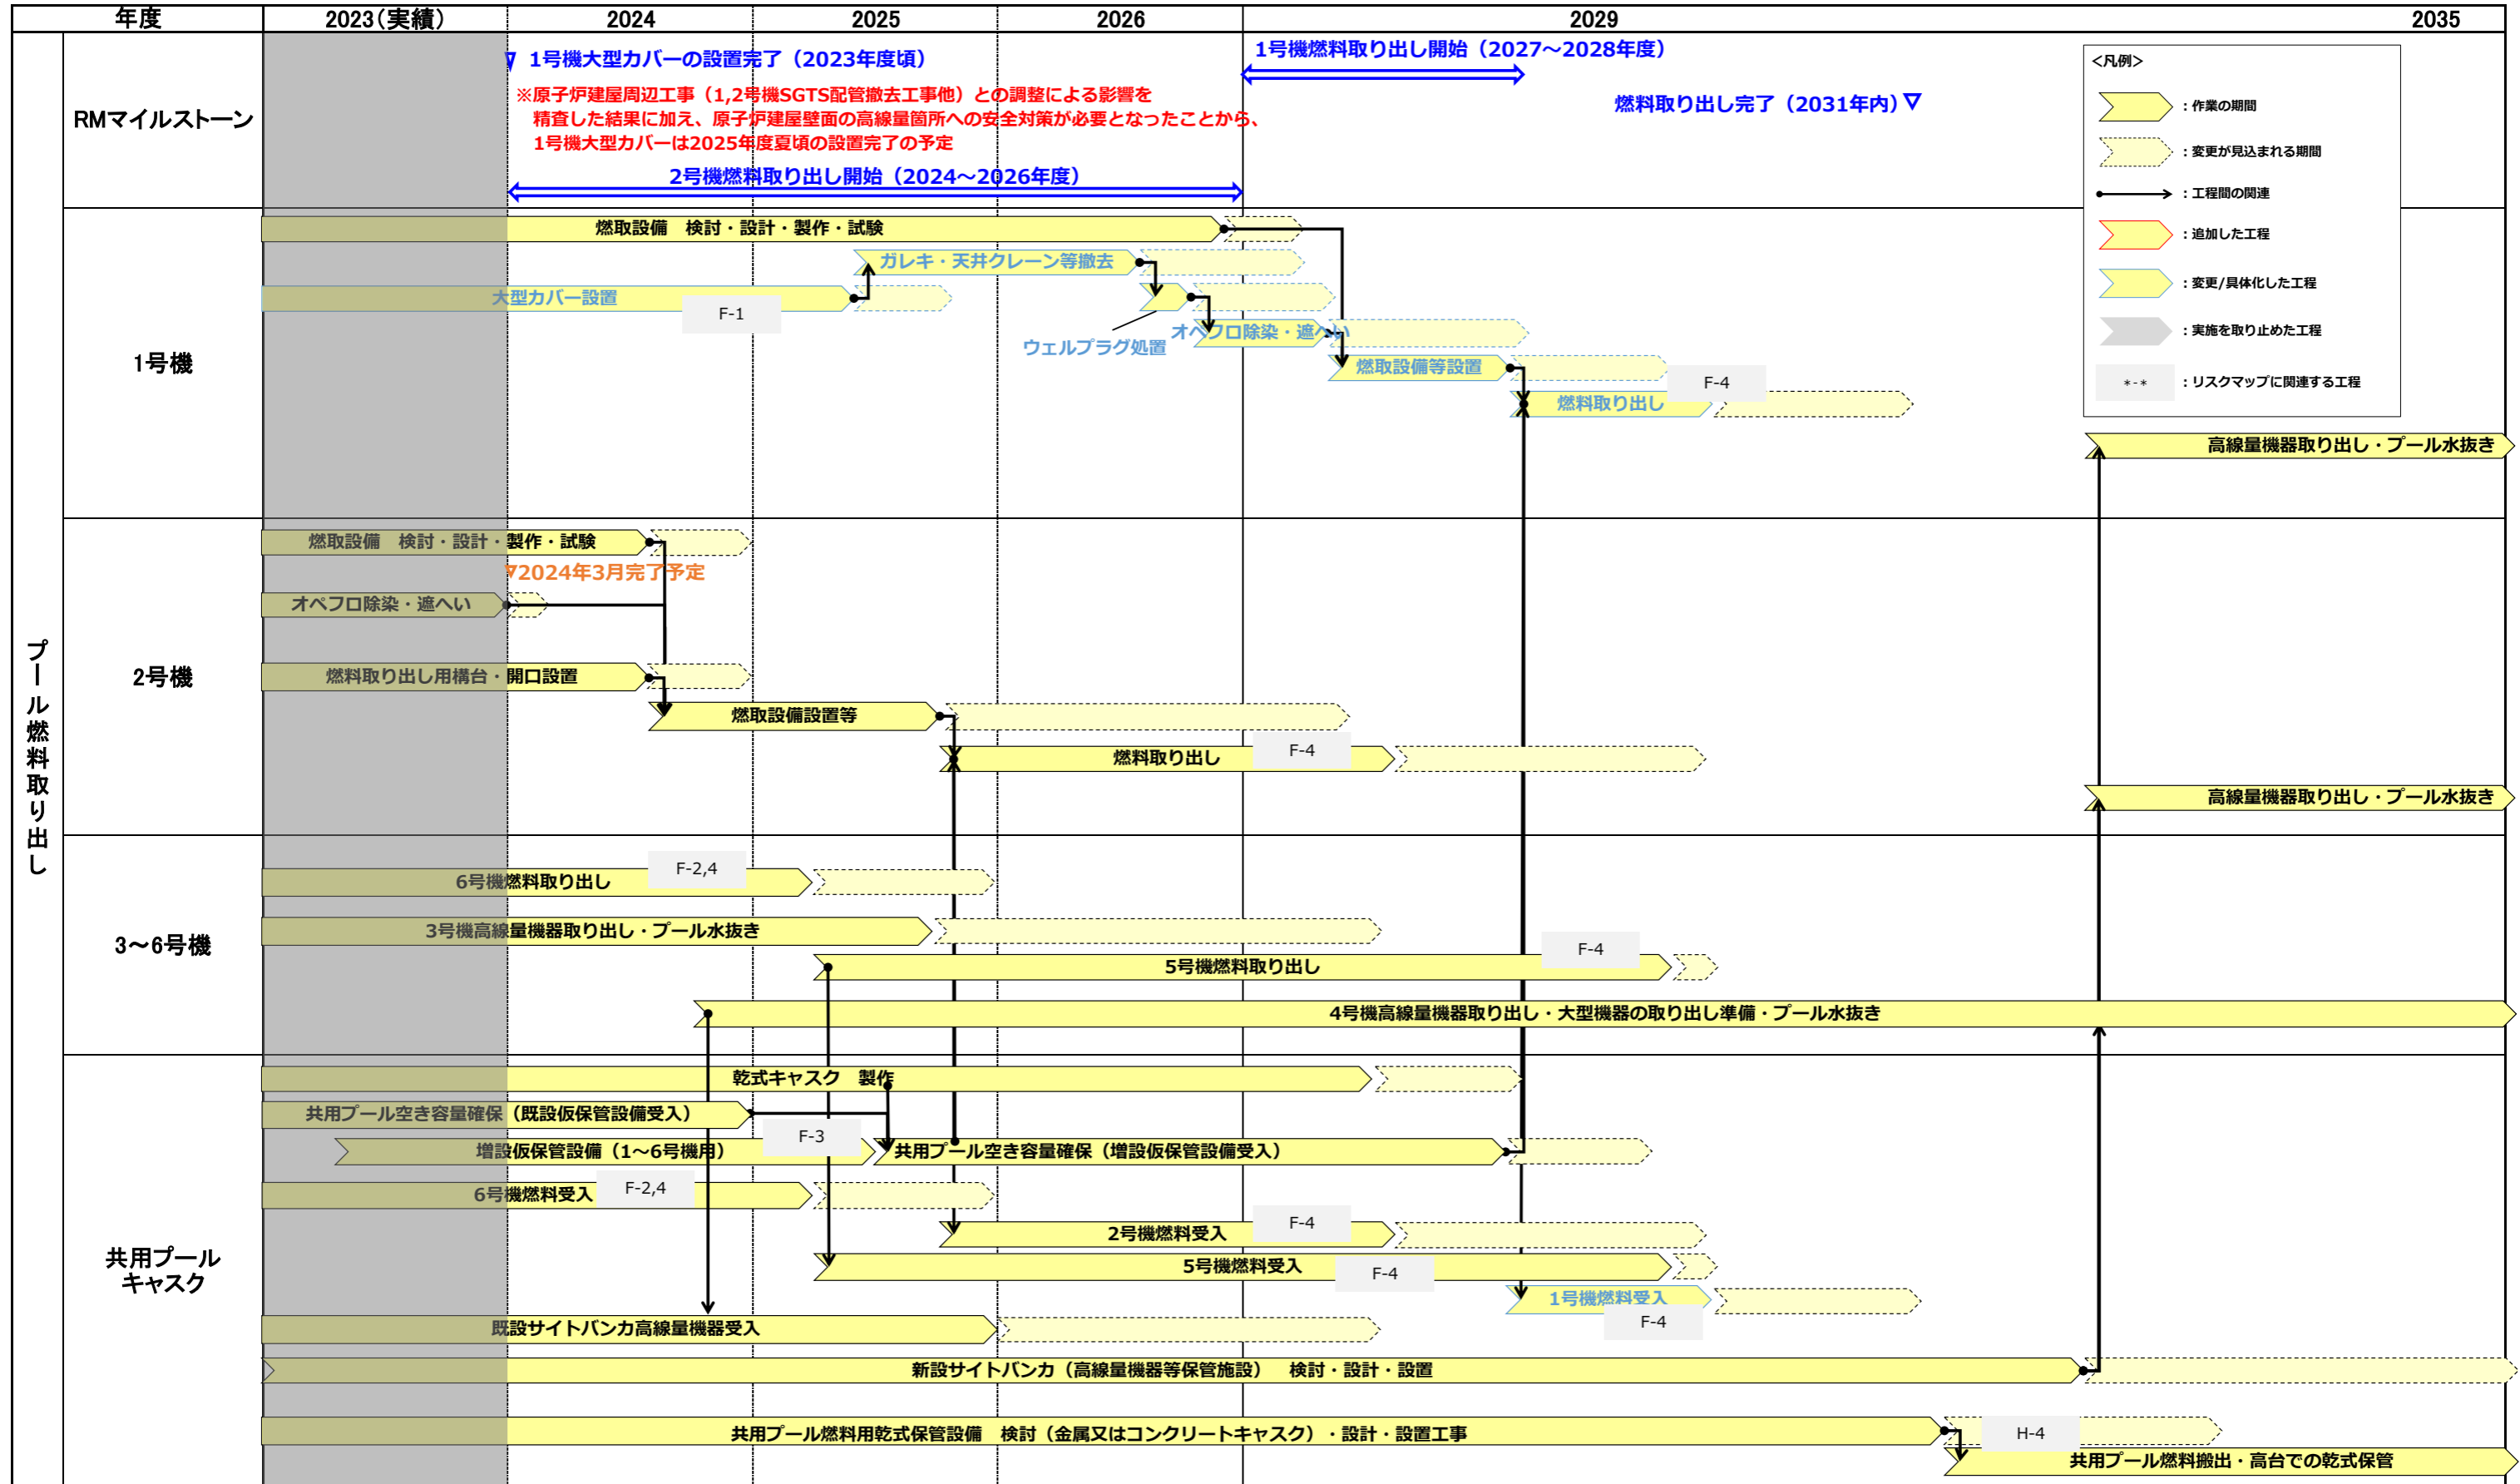

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
