


固体廃棄物の保管管理、処理・処分計画

分野名	廃炉中長期実行プラン2024 目標工程	括り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後6ヶ月の予定	8月		9月					10月			11月			12月			1月			2月			3月以降			備 考
					20	1	8	15	22	29	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
固体廃棄物の保管管理	●放射能濃度の評価と管理	処理・処分計画	3. 固体廃棄物の性状把握	(実 績) ・計画に基づいたサンプリングの実施 ・汚染水分析・水処理二次廃棄物分析 ・瓦礫類分析	検討・設計																									
				(予 定) ・計画に基づいたサンプリングの実施 ・汚染水分析・水処理二次廃棄物分析 ・瓦礫類分析		計画に基づいたサンプリングの実施																								(採取継続)
				現場作業		汚染水分析・水処理二次廃棄物分析																								(分析継続)
						瓦礫類分析																								
処理・処分計画	●分析施設	処理・処分計画	4. 分析・研究施設の設置	JAEA分析・研究施設第1棟	現場作業																								・水処理二次廃棄物：ALPS吸着材等を分析中 ・これまでの分析結果は以下のウェブページにまとめられている リスト：https://clads.jaea.go.jp/rd/tech-info.html 検索：https://frandl-db.jaea.go.jp/FRAnDLI/	
						放射性物質を用いた分析作業(分析法の妥当性確認/研究開発による分析を含む)																								(分析継続)
			総合分析施設	(実 績/予 定) ・設計検討（基本設計）	検討・設計	設計検討（基本設計）																								(2025年5月完了予定)

廃炉中長期実行プラン2024

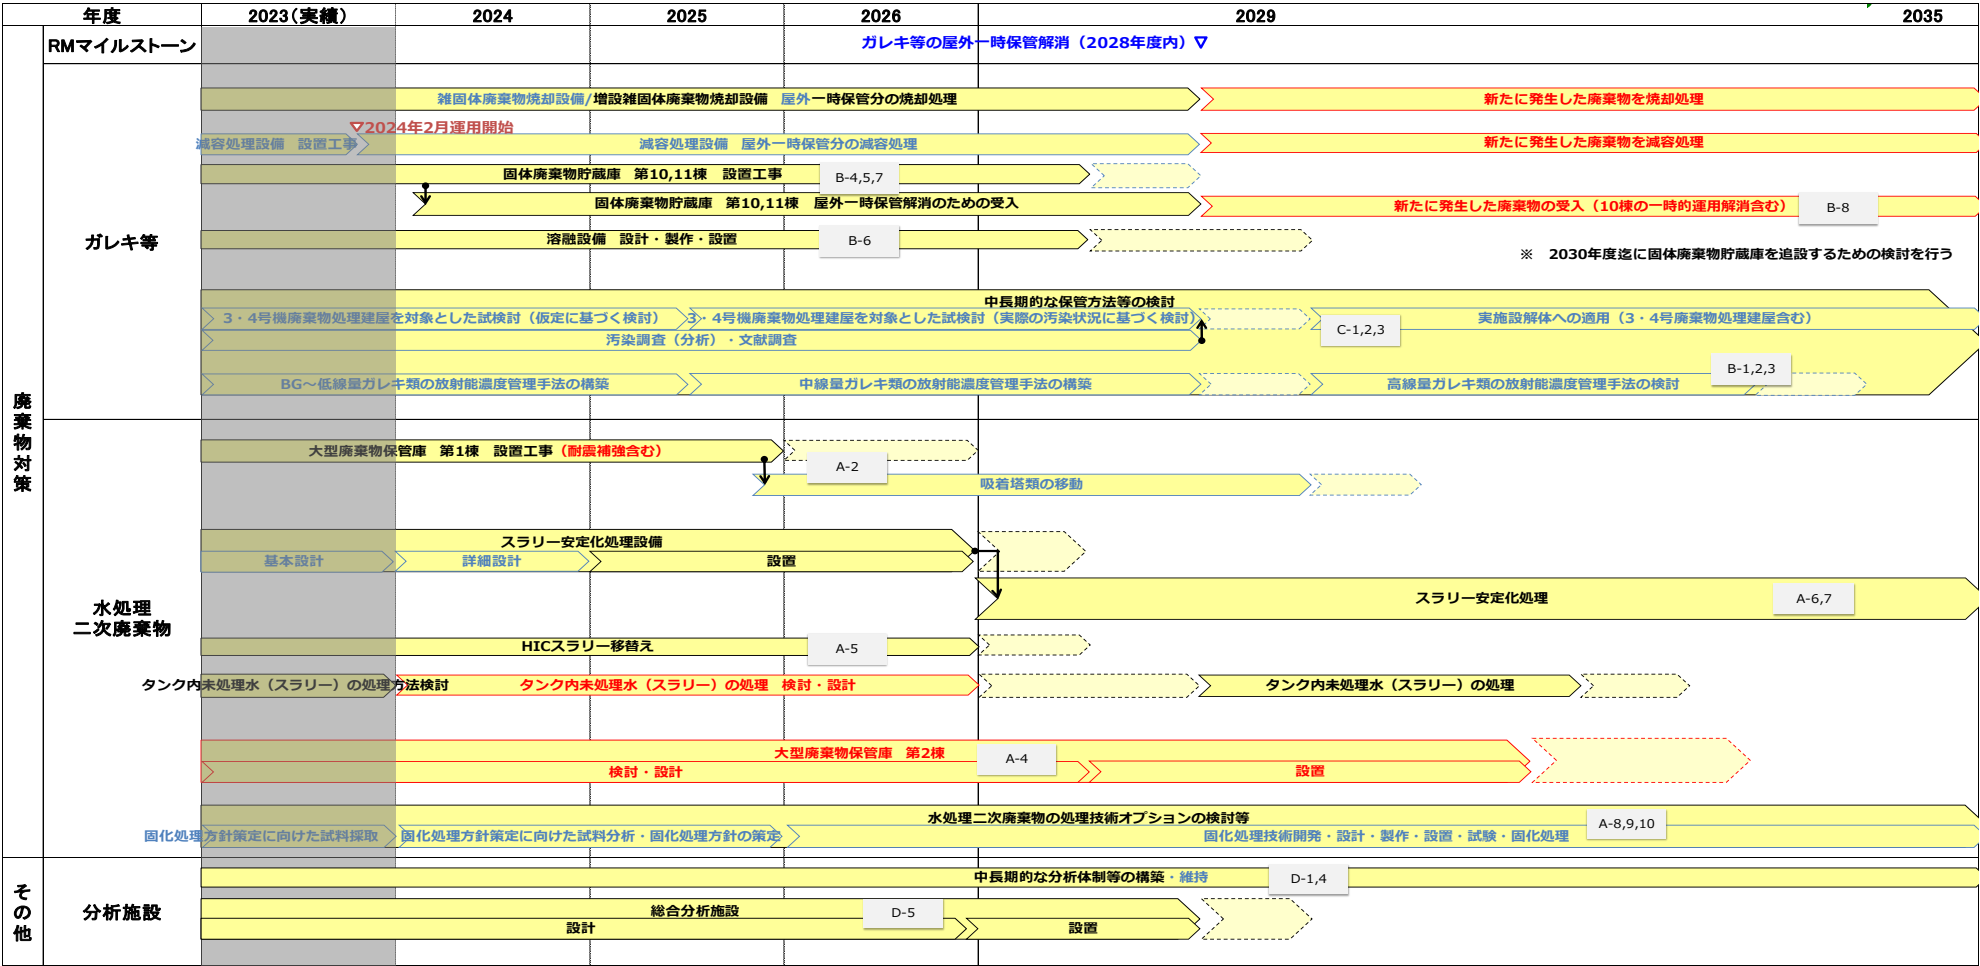

<凡例>

- : 作業の期間
- : 変更が見込まれる期間
- : 工程間の関連
- : 追加した工程
- : 変更/具体化した工程
- : 実施を取り止めた工程
- : リスクマップに関連する工程

注：今後の検討に応じて、記載内容には変更があり得る
